

# 宮古箱石道路通信 No.58



今年も  
よろしく  
お願いします。



発行：宮古箱石道路安全協議会  
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP宮古箱石)  
編集・監修：国土交通省三陸国道事務所

## 空から見た 宮古箱石道路


宮古箱石道路（宮古～箱石）  
（L＝約33km）は全線2020  
年開通に向け急ピッチで工事が  
進められています。平成25年  
11月30日に宮古箱石道路の起  
工式が行われ、今年で5年経過し  
ました。

今回は「空から見た」工事の  
進捗状況「宮古西道路（L＝4  
km）」について紹介します。



### 工事の進捗状況

## 【宮古西道路】（L＝4km）

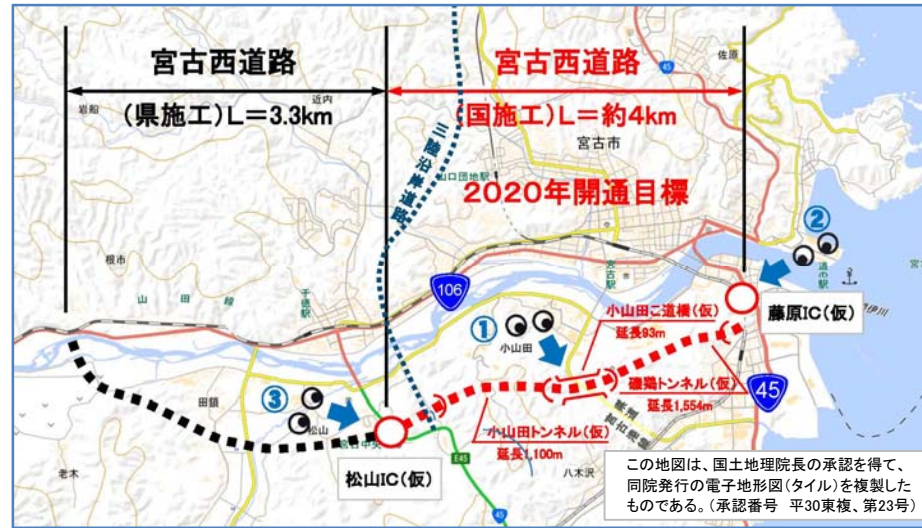

## 1 宮古市小山田地区

小山田地区では、県道宮古港線と交差する（仮）小山田こ道橋の工事が進められています。工場で製作された橋桁（セグメント）をトレーラーで運搬し、現場で組立て架設し、現在は床版を打設しています。





## 2 宮古市藤原地区

宮古西道路は国道45号に接続し、盛岡方面に向かう入り口になります。左上の写真は（仮）磯鶏トンネル付近の状況で、藤原側と小山田側の両方から掘削を行っており、12月末現在延長1,554mのうち、藤原側が約670m、小山田側が約414mのトンネル掘削が終了しています。右上の写真は国道45号に接続する箇所、主に土砂の掘削作業をしています。



## 3 宮古市松山地区（仮 松山IC）

松山地区では、県施工区間の宮古西道路との、接続部分の工事を進めています。

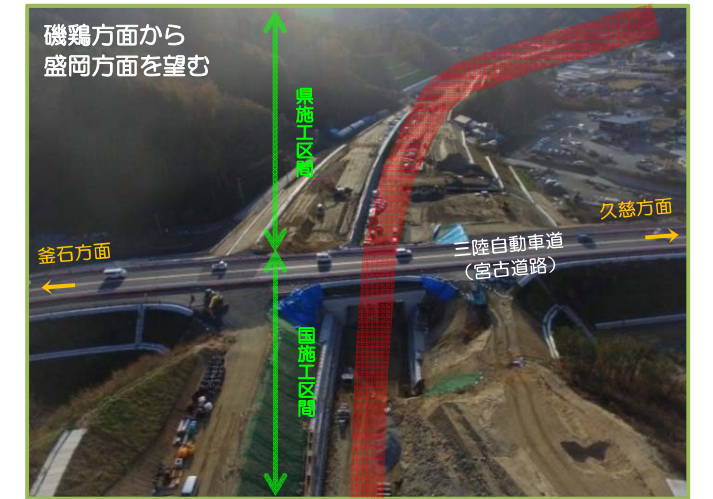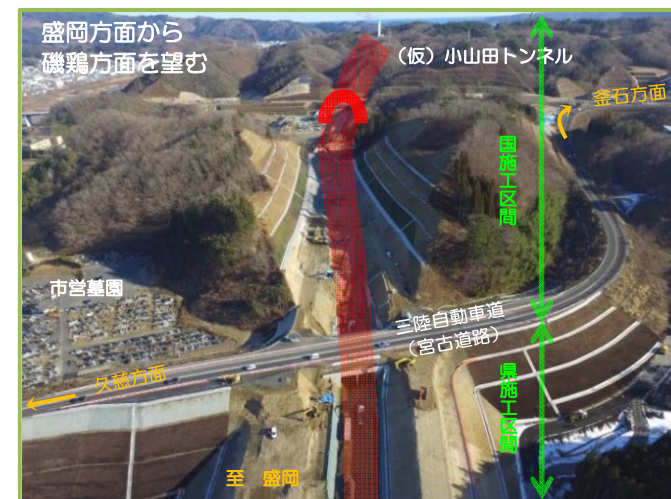




平成30年度 宮古箱石道路 工事一覧

No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL	No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL
①	国道106号 磯鶏地区道路工事	H28.4.1~H31.9.27	大成建設(株)	77-5162	⑫	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3~H31.3.29	大豊・佐田JV	79-1855
②	国道106号 小山田地区道路工事	H29.4.1~H31.8.15	飛鳥建設(株)	77-5322	⑬	腹帯上川井地区道路改良工事	H29.7.19~H31.3.25	大豊建設(株)	72-2001
③	小山田こ道橋上部工事	H30.1.23~H31.2.14	榊富士ピー・エス	65-6570	⑭	国道106号 腹帯橋上部工事	H30.9.20~H32.3.19	宮地エンジニアリング(株)	-
④	松山地区道路改良工事	H30.3.1~H30.12.21	榊テラ	65-9810	⑮	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16~H31.3.29	大成建設(株)	77-5653
⑤	国道106号 茂市トンネル工事	H28.11.26~H31.3.15	前田建設工業(株)	79-1685	⑯	国道106号 川井地区トンネル工事	H29.11.15~H32.5.29	西松建設(株)	77-3777
⑥	茂市地区道路改良工事	H30.7.19~H31.9.30	榊新井組	-	⑰	川井腹帯地区道路改良工事	H29.4.3~H31.3.28	大豊建設(株)	77-3750
⑦	茂市腹帯地区道路改良工事	H29.7.20~H31.3.27	榊森本組	65-6316	⑱	上川井地区道路改良工事	H30.3.30~H31.3.11	岩田地崎建設(株)	65-8712
⑧	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19~H31.3.29	戸田・岩田地崎JV	65-7007	⑲	国道106号 片巣地区道路工事	H29.12.14~H31.10.24	榊奥村組	65-8361
⑨	茂市橋上部工事	H30.9.7~H31.9.25	日本ファブテック(株)	-	⑳	上片巣橋上部工事	H30.1.30~H31.1.31	日本ファブテック(株)	65-9466
⑩	上茂市橋上部工事	H30.3.30~H31.7.9	日本ファブテック(株)	-	㉑	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17~H31.2.28	榊安藤・間	85-1525
⑪	下腹帯橋上部工事	H30.9.4~H31.7.5	榊角藤	-	㉒	国道106号 新箱石大橋上部工事	H30.4.1~H32.2.3	高田機工(株)	-

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況

平成30年12月15日現在

⑫施工：(株)安藤・間




(仮)新箱石大橋P1橋脚の締切鋼材の撤去を行っています。

⑬施工：岩田地崎建設(株)



川井地区で工事用道路の仮橋の施工を行っています。

⑭施工：西松建設(株)



(仮)川井第1トンネルの掘削を行っています。全長1,782mのうち313mまで進んでいます。

⑮施工：大豊建設(株)



(仮)腹帯橋P1橋脚の柱部の施工を行っています。

⑯施工：戸田・岩田地崎JV




(仮)下腹帯橋A1橋台は、施工が完了し埋戻しを行っており、A2橋台では深礎杭の施工を行っています。

⑰施工：前田建設工業(株)




(仮)茂市トンネルの掘削を行っています。全長1,885mのうち700mまで進んでいます。

⑱施工：(株)富士ピー・エス



(仮)小山田こ道橋上部工では、床版工のコンクリート打設を行っています。


⑲施工：大成建設(株)



(仮)磯鶏トンネル(磯鶏側)の掘削を行っています。全長1,554m(845mを大成建設で施工)のうち666mまで進んでいます。

宮古箱石道路(宮古市藤原～宮古市箱石) 延長 約33km

⑳施工：日本ファブテック(株)



(仮)上片巣橋の上部工架設が完了し、バントの解体作業を行っています。

㉑施工：(株)奥村組



(仮)片巣トンネルの掘削を行っています。全長559mのうち150mまで進んでいます。

㉒施工：大豊建設(株)




(仮)上川井橋A1橋台、A2橋台が完成し、市道付替道路の盛土を行っています。

㉓施工：大成建設(株)



(仮)下川井トンネルの掘削を行っています。全長2,050mのうち1,953mまで進んでいます。

㉔施工：大豊・佐田JV




(仮)腹帯第3トンネルでは、覆工コンクリートの打設を行っています。

㉕施工：(株)森本組




(仮)茂市橋P3橋脚では、柱部の施工を行っており、P2橋脚は完成し、P1橋脚では締切内の掘削を行っています。

㉖施工：(株)テラ



松山地区では、「宮古道路」の仮設道路撤去が完了し、舗装工と、法面の排水工を施工しています。

㉗施工：飛鳥建設(株)



(仮)磯鶏トンネル(小山田側)の掘削を行っています。全長1,554m(709mを飛鳥建設で施工)のうち414mまで進んでいます。
