

宮古箱石道路通信 No.59



発行：宮古箱石道路安全協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP宮古箱石)
編集・監修：国土交通省三陸国道事務所

空から見た 宮古箱石道路

工事の進捗状況

【墓目～腹帯地区】 (L=7km)

宮古箱石道路(宮古～箱石) (L=約33km)は全線2020年度開通に向け急ピッチで工事が進められています。今回は「空から見た」工事の進捗状況「墓目～腹帯地区(L=7km)」について紹介します。



1 宮古市墓目地区

墓目～腹帯地区は延長7Kmの道路で墓目地区は盛岡方向へ向かうときの入り口になります。現在(仮)下茂市橋と(仮)茂市トンネルの工事が進められています。(仮)下茂市橋は下部工工事が進められており、橋脚1基が完成しています。(仮)茂市トンネルは1月末現在延長1,885mのうち840mの掘削が完了しています。



ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石工区 事業管理班
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 三陸国道事務所 東庁舎103号 (TEL) 0193-77-4733

三陸国道事務所 ホームページは
三陸国道 で検索出来ます。

2 宮古市茂市地区

茂市地区は宮古方面と盛岡方面に向かうための出入り口になり、左側の写真は茂市接続箇所になります。下の左側の写真は(仮)茂市橋の下部工工事が進められており、橋台1基と橋脚2基が完成しています。下の右側の写真は(仮)上茂市橋の下部工工事が進められており、橋台1基と橋脚2基が完成しています。また、既設の高徳橋の下流で(仮)上茂市橋の工事が進み、その先で(仮)腹帯第1トンネルの掘削が進められ、1月末現在延長1,774mのうち1,600mの掘削が完了しています。



3 宮古市腹帯地区

腹帯地区では、改良工事、(仮)腹帯橋の下部工、(仮)腹帯第3トンネルの工事を進めています。左側の写真は盛岡方面から宮古方面を見ています。右側は宮古方面から盛岡方面を見ており(仮)腹帯橋の橋台2基と橋脚2基が完成しています。



FM826 MIYAKO HARBOR RADIO82.6 みやこハーバーラジオ 「復興のつら音」

2/26, 3/12 11:30~ (予定)
2/27, 3/13 16:30~ (再放送予定)
出演：宮古箱石道路安全協議会

宮古箱石道路の事業進捗状況
他イベント情報など



平成30年度 宮古箱石道路 工事一覧

No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL	No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL
①	国道106号 磯鶏地区道路工事	H28.4.1~H31.9.27	大成建設(株)	77-5162	⑫	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3~H31.3.29	大豊・佐田JV	79-1855
②	国道106号 小山田地区道路工事	H29.4.1~H31.8.15	飛鳥建設(株)	77-5322	⑬	腹帯上川井地区道路改良工事	H29.7.19~H31.3.25	大豊建設(株)	72-2001
③	小山田こ道橋上部工事	H30.1.23~H31.3.20	榊富士ピー・エス	65-6570	⑭	国道106号 腹帯橋上部工事	H30.9.20~H32.3.19	宮地エンジニアリング(株)	-
④	国道106号 磯鶏地区舗装工事	H30.12.4~H32.2.28	鹿島道路(株)	-	⑮	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16~H31.3.29	大成建設(株)	77-5653
⑤	国道106号 茂市トンネル工事	H28.11.26~H31.3.15	前田建設工業(株)	79-1685	⑯	国道106号 川井地区トンネル工事	H29.11.15~H32.5.29	西松建設(株)	77-3777
⑥	茂市地区道路改良工事	H30.7.19~H31.12.20	榊新井組	-	⑰	川井腹帯地区道路改良工事	H29.4.3~H31.3.28	大豊建設(株)	77-3750
⑦	茂市腹帯地区道路改良工事	H29.7.20~H31.3.27	榊森本組	65-6316	⑱	上川井地区道路改良工事	H30.3.30~H31.6.17	岩田地崎建設(株)	65-8712
⑧	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19~H31.3.29	戸田・岩田地崎JV	65-7007	⑲	国道106号 片巣地区道路工事	H29.12.14~H31.10.24	榊奥村組	65-8361
⑨	茂市橋上部工事	H30.9.7~H31.9.25	日本ファブテック(株)	-	⑳	上片巣橋上部工事	H30.1.30~H31.1.31	日本ファブテック(株)	65-9466
⑩	上茂市橋上部工事	H30.3.30~H31.7.9	日本ファブテック(株)	-	㉑	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17~H31.2.28	榊安藤・間	85-1525
⑪	下腹帯橋上部工事	H30.9.4~H31.7.5	榊角藤	-	㉒	国道106号 新箱石大橋上部工事	H30.4.1~H32.2.3	高田機工(株)	-

宮古箱石道路（宮古～箱石）工事状況

平成31年1月15日現在

⑫施工：(株)安藤・間



(仮)新箱石大橋P1橋脚は、締切鋼矢板の撤去が完了し、現在は新箱石トンネルの仕上げを行っています。

⑱施工：岩田地崎建設(株)



川井地区で工事用道路の仮橋の施工を行っています。

⑯施工：西松建設(株)



(仮)川井第2トンネルの掘削を行っています。全長1,782mのうち542mまで進んでいます。

⑬施工：大豊建設(株)



(仮)腹帯橋P1橋脚の柱部の施工を行っています。

⑧施工：戸田・岩田地崎JV



(仮)下腹帯橋A1橋台は、躯体の施工が完了し、埋戻しを行っています。A2橋台では均しコンクリートの施工を行っています。

⑤施工：前田建設工業(株)



(仮)茂市トンネルの掘削を行っています。全長1,885mのうち812mまで進んでいます。

③施工：(株)富士ピー・エス




(仮)小山田こ道橋上部工では、床版工を行っています。

①施工：大成建設(株)



(仮)磯鶏トンネル(磯鶏側)の掘削を行っています。全長1,554m(845mを大成建設で施工)のうち732mまで進んでいます。

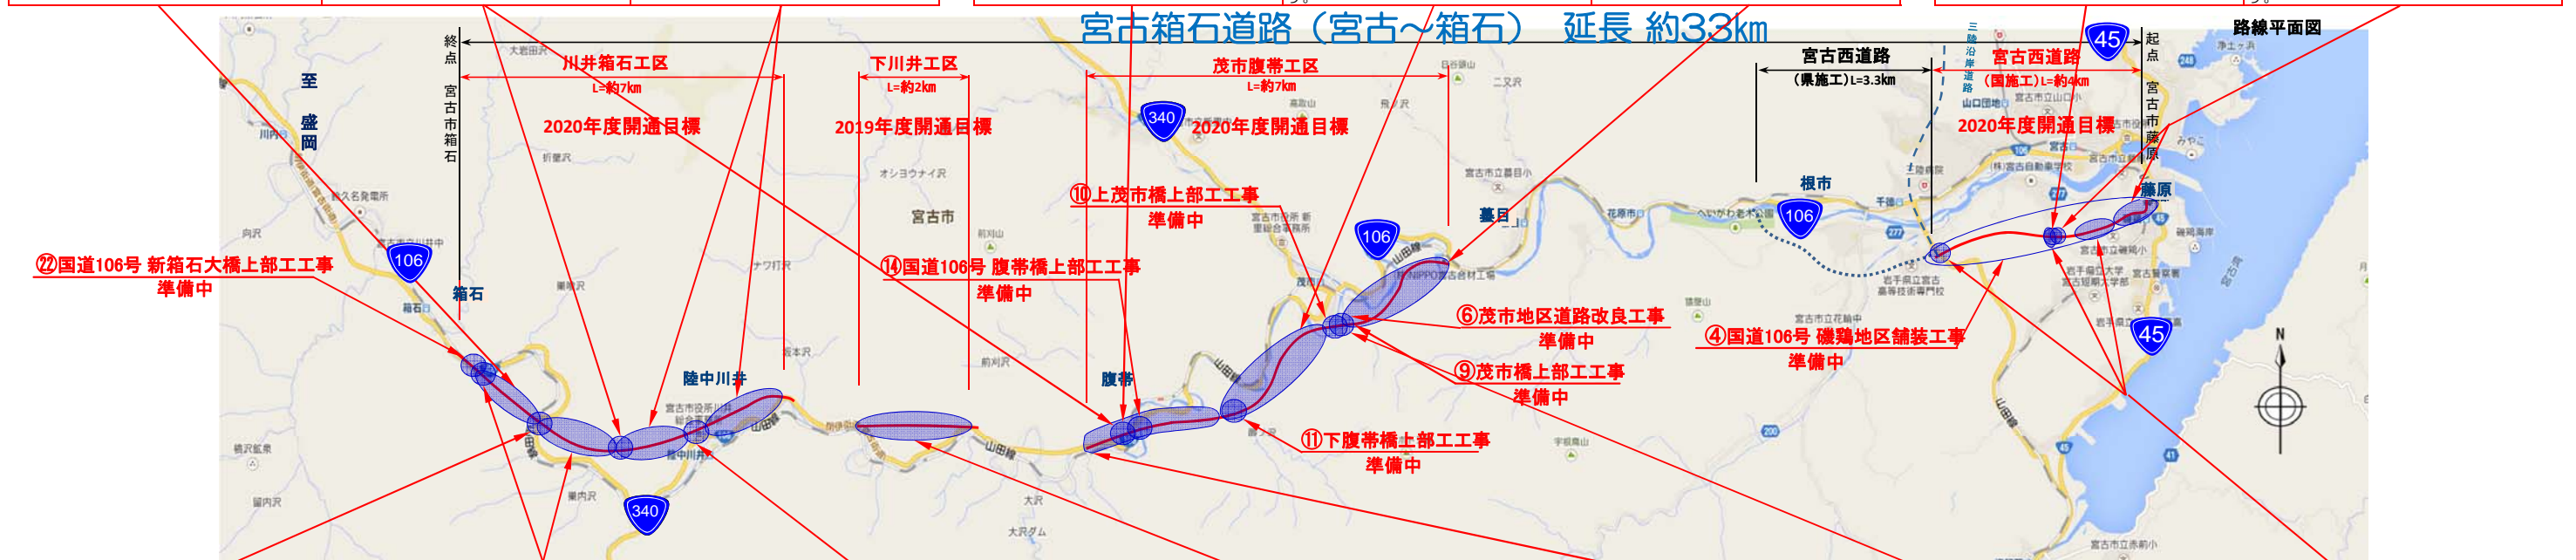

⑳施工：日本ファブテック(株)



(仮)上片巣橋の上部工架設が完了し、桁部の塗装工を行っています。

⑲施工：(株)奥村組



(仮)片巣トンネルの掘削を行っています。全長559mのうち192mまで進んでいます。

⑰施工：大豊建設(株)



(仮)上川井橋A1橋台、A2橋台が完成し、橋台の埋戻しを行っています。

⑮施工：大成建設(株)



(仮)下川井トンネルの掘削を行っています。全長2,050mのうち1,990mまで進んでいます。

⑫施工：大豊・佐田JV



(仮)腹帯第3トンネルでは坑門工の鉄筋組立を行っています。

⑦施工：(株)森本組



(仮)茂市橋P3橋脚は、躯体の施工を行っています。P2橋脚は完成、P1橋脚では締切鋼矢板の掘削を行っています。

②施工：飛鳥建設(株)



(仮)磯鶏トンネル(小山田側)の掘削を行っています。全長1,554m(709mを飛鳥建設で施工)のうち486mまで進んでいます。
