

平成25年11月14日
秋田河川国道事務所
岩手河川国道事務所

仙岩トンネル天井板撤去工事の進捗状況
～ 天井板全13,006枚中852枚撤去しました。 ～

国道46号仙岩道路の「仙岩トンネル(L=2,544m)」の天井板撤去工事を11月11日(月)より12月10日(火)まで、夜9時から翌朝6時までの夜間全面通行止めにより鋭意工事を進めているところであります。

11月13日(水)夜9時から11月14日(木)朝6時まで実施した作業の進捗状況をお知らせいたします。

○工事日時:平成25年11月13日(水)21:00～11月14日(木)6:00

○進捗状況:天井板全13,006枚中852枚撤去(累計撤去枚数:2,058枚)

○その他:秋田、岩手両河川国道事務所のホームページにおいても工事の進捗状況を掲載しております。

【記者発表先】 秋田県政記者会、岩手県政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

TEL:018-823-4167

副所長(道路担当) 今野 敬二

道路管理第二課長 齋藤 正志

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所

TEL:019-624-3131

副所長(道路担当) 亀井 督悦

道路管理第一課長 三浦 邦彦

天井板撤去状況

昨日までの作業状況

全13,006枚中1,206枚撤去

本日の作業状況

852枚撤去 (累計2,058枚)

残り作業量

10,948枚

吊り金具撤去状況

昨日までの作業状況

全2,500本中104本撤去

本日の作業状況


184本撤去 (累計288本)

残り作業量

2,212本

: 昨日迄の施工済箇所
 : 本日施工箇所

①班: 0m~859m
 ②班: 859m~1,718m
 ③班: 1,718m~2,577m

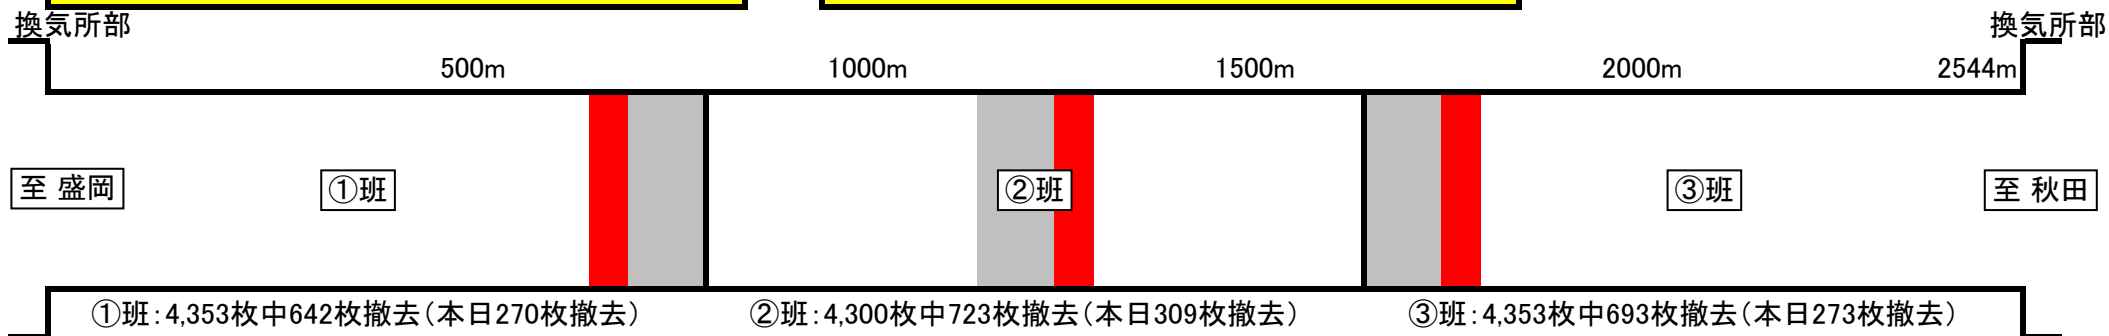

■吊り金具撤去等を除いた天井板撤去の進捗率 = 15.8% (2,058枚 / 13,006枚)

作業状況写真



天井板撤去状況



吊り金具撤去状況



天井板撤去後の状況

※トンネル覆工コンクリート補修等の作業は、天井板撤去後に実施する予定です。
