




発行：釜石山田道路安全協議会
 代表：熊谷組・利エンル白石特定建設工事共同企業体
 編集・監修：国土交通省 東北地方整備局
 南三陸国道事務所 釜石監督官室
 発行日：平成24年 9月 1日

工事の進捗状況をお知らせします

水海高架橋下部工第2工事 (株)小澤組

工事概要 本工事は両石地区の県道水海大渡線、水海川、JR山田線を跨ぐ水海高架橋（L=184m）の橋台と橋脚をつくる工事です。

工事場所：岩手県釜石市両石町第4地割 地内
 工期：平成23年10月6日～平成24年10月31日（予定）
 工事内容：橋台工1基（A1）、橋脚工1基（P1）

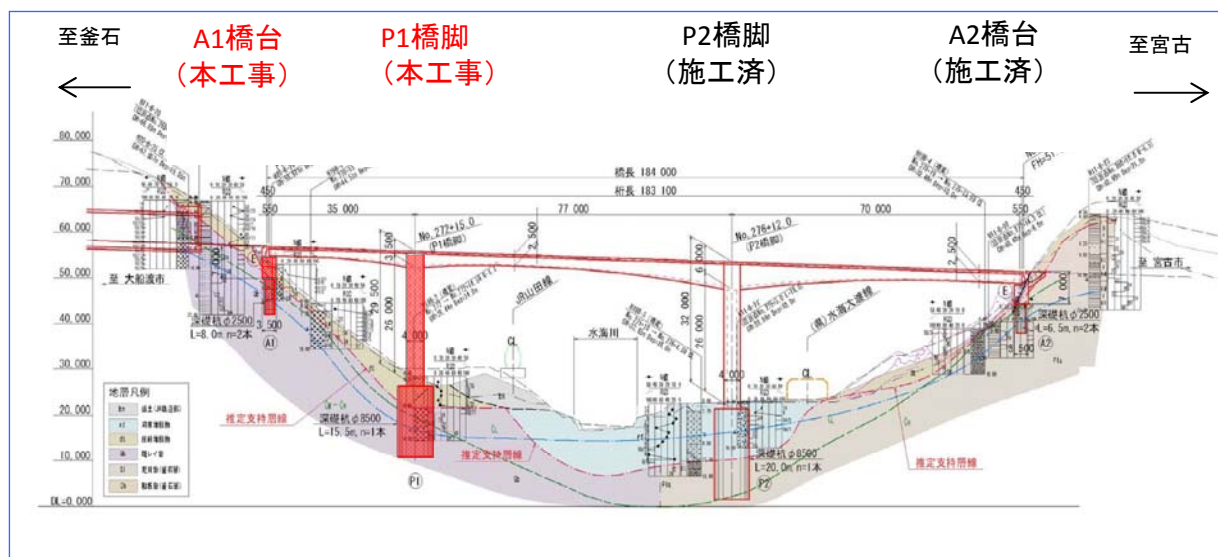

A1橋台足場組立完了



P1橋脚1ロット目打設完了

現場担当より




(現場代理人: 菊池英和)

8月初旬にA1橋台、P1橋脚の深礎施工を完了し、引き続き橋台及び橋脚の躯体の施工を行っています。A1橋台については、足場の組立が終わり、鉄筋の組立作業を行っています。P1橋脚については、6ロットに分けて施工を行う内の1ロットの施工を完了しています。今後、橋台及び橋脚作業に伴い、鉄筋組立から型枠組立作業が主な作業となり、生コン車両、資材運搬車両の通行が多くなります。近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、作業所一同、完成に向け安全第一で作業しますので、引き続き皆様のご協力をお願いします。

両石地区道路改良工事 (株)小澤組

工事概要 本工事は、本線盛土と市道の交差箇所の函渠（ボックスカルバート）をつくる工事です。

工事場所：岩手県釜石市両石町第4地割 地内
 工期：平成23年3月8日～平成25年2月28日（予定）
 工事内容：函渠工7ブロック

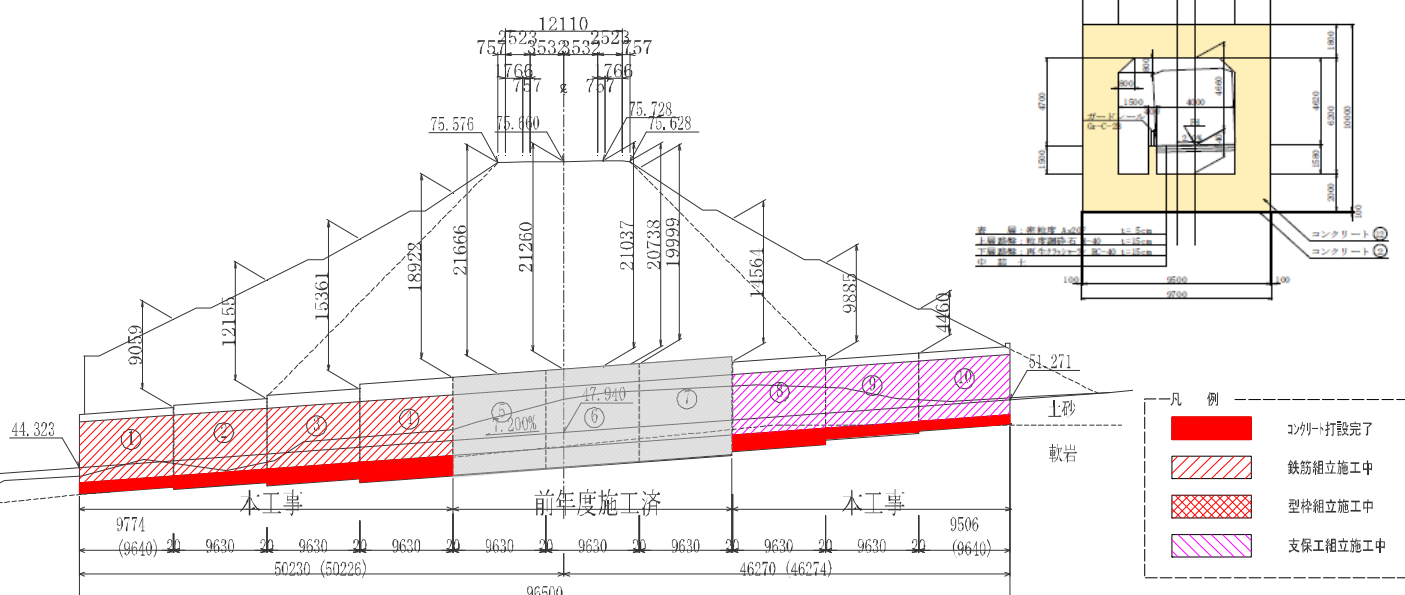

函渠工の施工状況



鉄筋組立状況

現場担当より



(現場代理人: 田中慶治)

今年3月の工事着手から現在まで安全第一で作業を行っています。カルバート工は、底版のコンクリート打設が完了し全体の4割程度まで終了しており、現在は側壁・頂版部の型枠支保工・鉄筋・型枠組立作業を行っている最中です。引き続き、近隣住民の皆様にはコンクリート打設作業に伴い、ミキサー車の走行の際はご迷惑をお掛けしますが、交通法規遵守とともに歩行者に配慮した運転を心掛けるよう指導し、作業を進めて参りますので、ご協力の程よろしくをお願いします。
