


# 鷹巣大館道路 工事進捗状況

令和元年6月11日現在

鷹巣大館道路摺付区間(L=1.7km)

鷹巣大館道路供用区間

大館能代空港IC

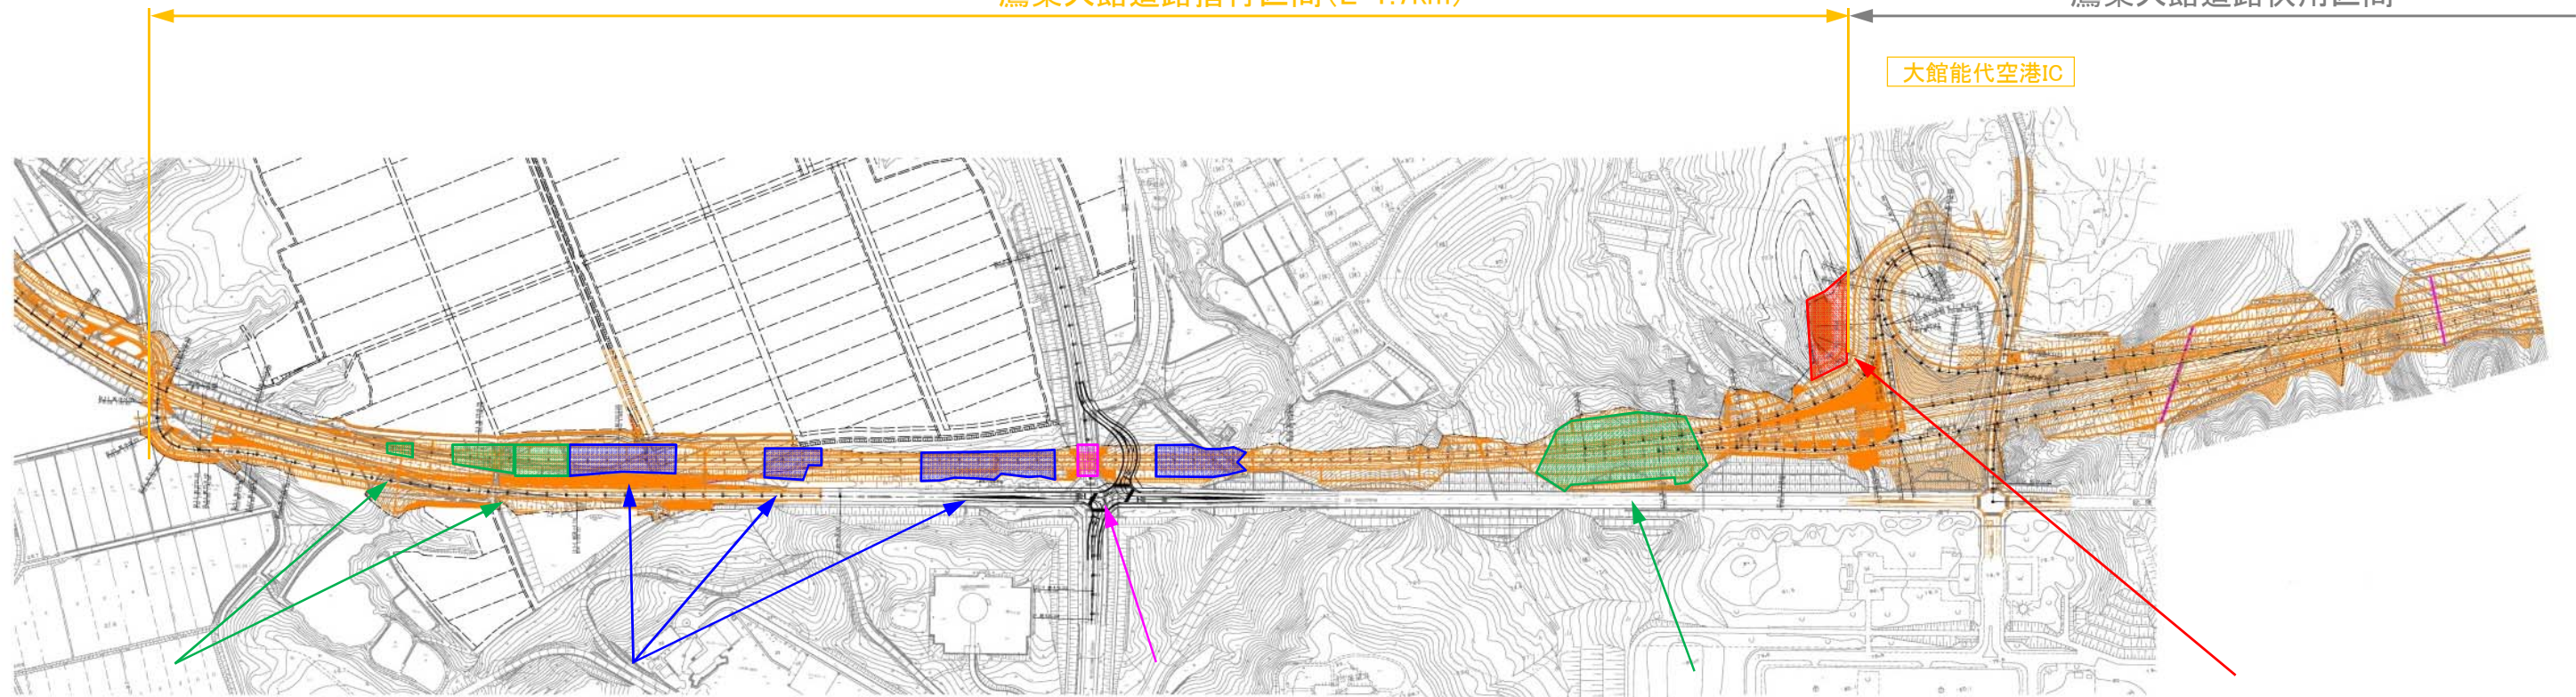

【本線盛土・ボックスカルバート区間】

【本線切土盛土区間】

【本線ボックスカルバート区間】

【本線切土区間】

【本線ランプ切土区間】

—準備工—

7月上旬～仮設土留工開始予定



—準備工—

7月上旬～切土・盛土開始予定



—ボックス床堀作業中—

6月下旬～ボックス本体開始予定



—準備工—

8月中旬～切土開始予定



—準備工—

8月中旬～切土開始予定

