


鷹巣大館道路 工事進捗状況

令和元年7月16日現在

鷹巣大館道路摺付区間(L=1.7km)

鷹巣大館道路供用区間

大館能代空港IC

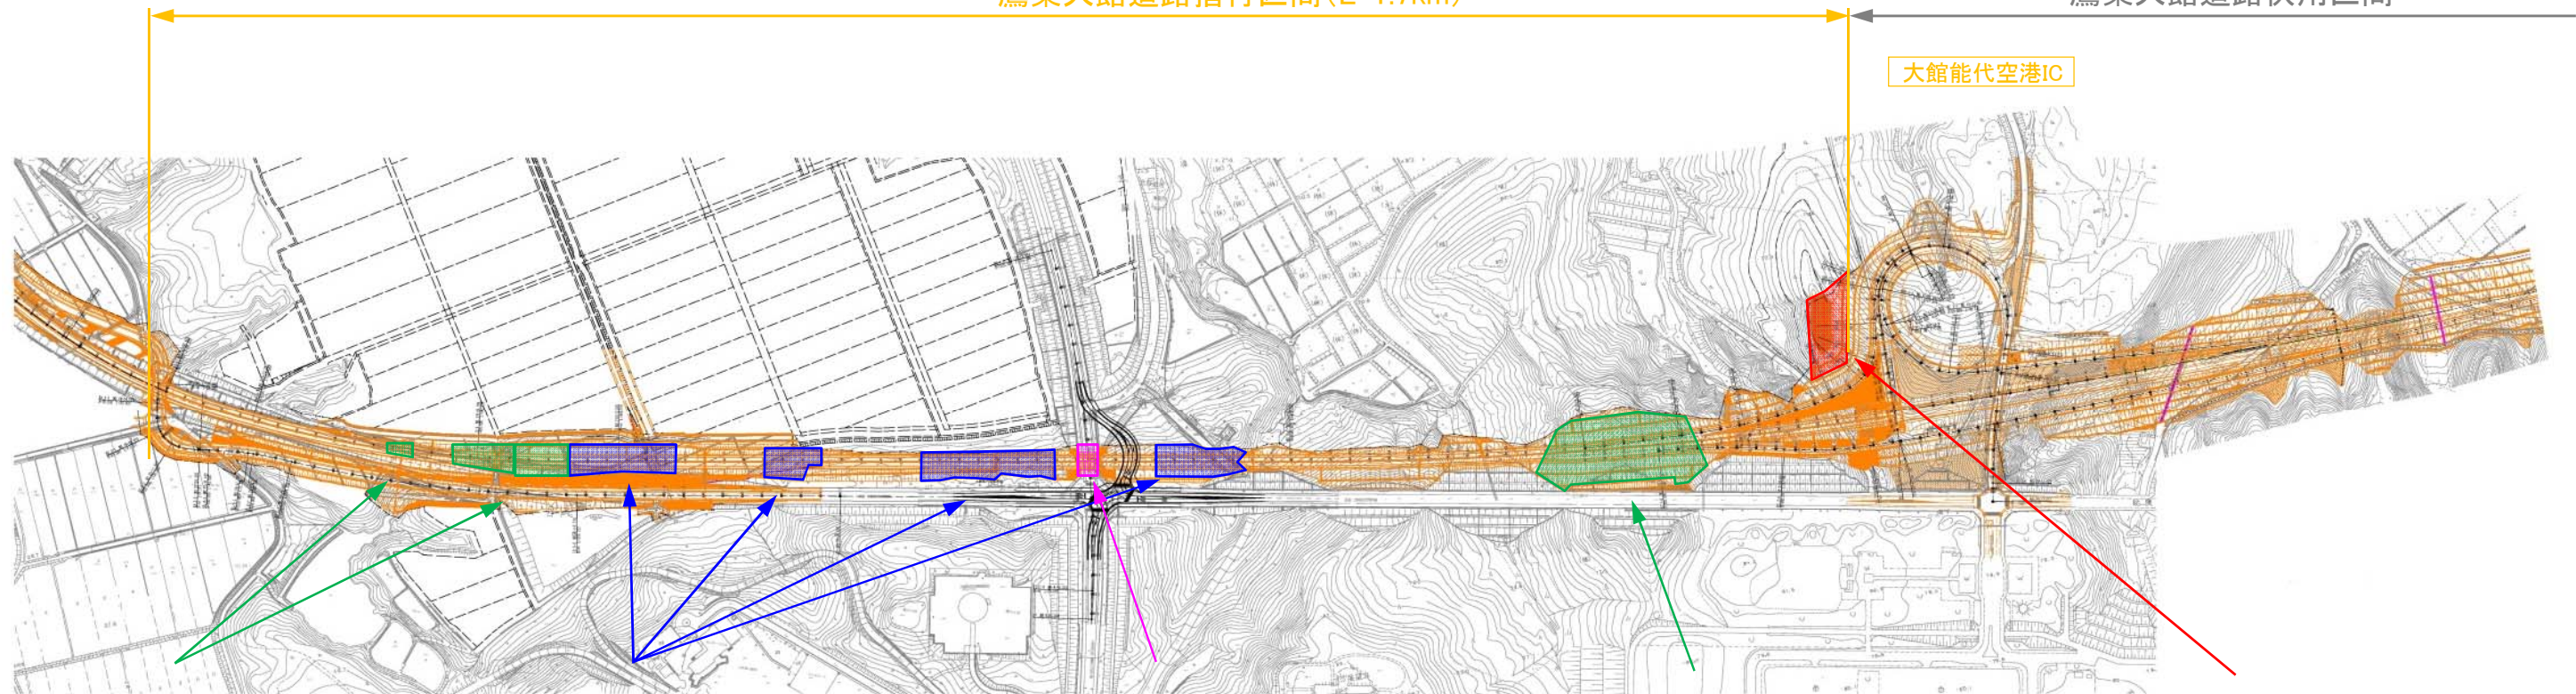

【本線盛土・ボックスカルバート区間】

—仮設工・盛土工—
7月上旬～仮設土留開始
8月中旬～盛土開始予定



【本線切土盛土区間】

—切土・盛土工—
7月下旬～切土開始予定



【本線ボックスカルバート区間】

—ボックス本体施工中—
7月下旬～ボックス底版施工予定



【本線切土区間】

—準備工—
8月中旬～切土開始予定



【本線ランプ切土区間】

—準備工—
8月中旬～切土開始予定

