


鷹巣大館道路 工事進捗状況

令和 2年 4月 17日現在

鷹巣大館道路摺付区間 (L=1.7km)

鷹巣大館道路供用区間

大館能代空港IC

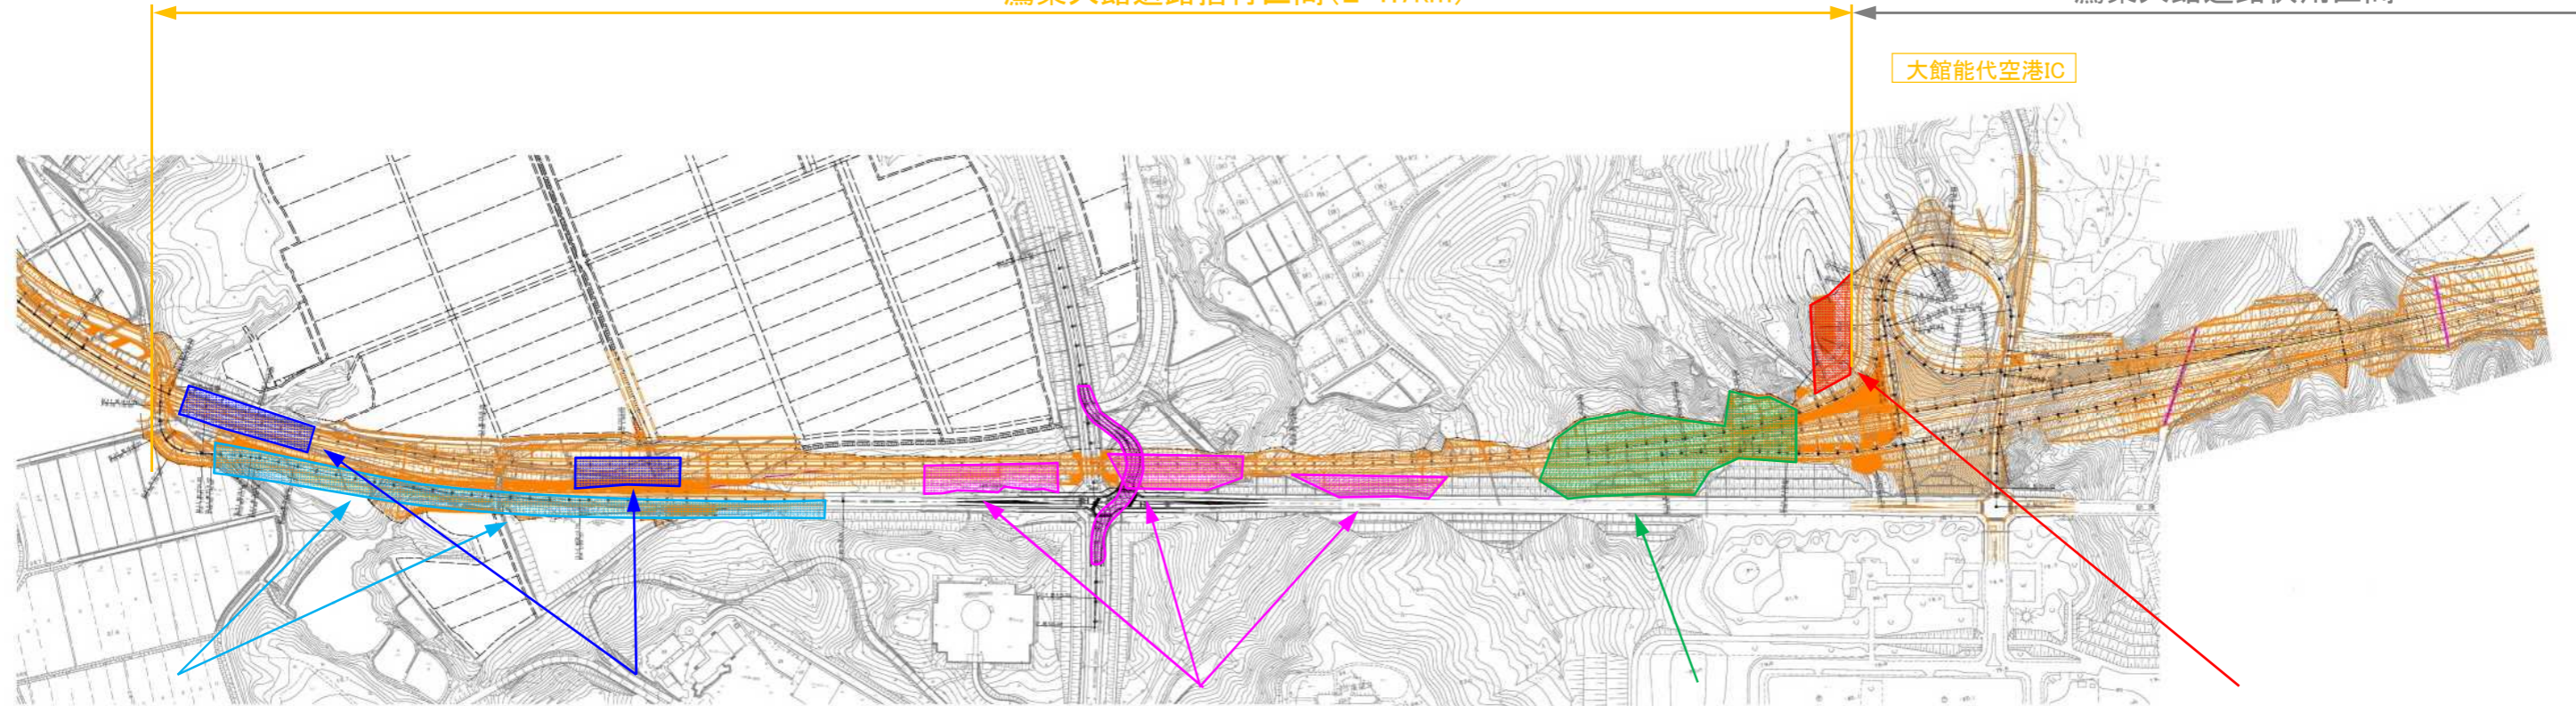

【県道付替区間】

【本線土工・構造物区間】

【本線切土区間】

【本線切土・盛土区間】

【本線ランプ切土区間】

一切土工
4月下旬開通予定

一本線土工・ボックスカルバート工
4月下旬外部足場解体予定

一切土工
5月中旬～切土施工予定

一切土工・盛土工
3月切土・盛土施工完

一切土工
2月中旬～切土施工中

