

# 宮古箱石道路通信 No.60



発行：宮古箱石道路安全協議会  
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP宮古箱石)  
編集・監修：国土交通省三陸国道事務所

## 宮古西道路で見学会を開催

1月29日(火) 宮古商工会議所 11名

1月29日(火) 宮古商工会議所(11名)の皆様が、宮古西道路の現場を見学しました。現在、掘削中の(仮)磯鶏トンネル(磯鶏側：大成建設(株)、小山田側：飛島建設(株))、上部工施工中の(仮)小山田こ道橋((株)富士ピー・エス)の現場を見ていただき、工事の進捗を確認していただきました。



(仮)磯鶏トンネル坑内を見学



(仮)磯鶏トンネル (仮)小山田こ道橋

## 工事現場紹介 国道106号磯鶏地区舗装工事



宮古箱石道路の最東端、『国道106号磯鶏地区舗装工事』を担当します、鹿島道路株式会社です。本工事は、宮古市藤原から松山まで工事延長L=3.88kmの舗装工事を行うものです。

また本工事では、舗装だけではなく排水構造物やガードレールの設置なども行います。

工事期間は平成32年2月28日までを予定しておりますが、地域の皆様へご迷惑とならないよう工事を進めてまいりたいと思っておりますので、工事へのご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

地域の皆様にご利用いただけるよう現場事務所の脇に、ログ東屋と自動販売機を設置しましたので、ご自由にお使いください。



岩淵 監理技術者



磯鶏地区舗装工事 施工箇所

現場事務所

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。  
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石区 事業管理班  
〒027-0029 宮古市藤原の川4番1号 三陸国道事務所 東庁舎103号 (TEL) 0193-77-4733

三陸国道事務所 ホームページは  
三陸国道 で検索出来ます。

## 工事完了報告

### ～ 上片巣橋上部工工事 ～

日本ファブテック(株) 工期：H30.1.30～H31.1.31



川井地区で平成30年9月から着手しました「上片巣橋上部工工事」は、平成31年1月31日をもって工事が完了致しました。昨年11月末に行いました国道106号を通行止めでの道路上橋桁架設では、国道106号の利用を予定されていた方にはご迷惑をおかけしましたが、迂回等のご協力により無事予定通り完了することが出来ました。この場をお借りしてお礼申し上げます。現場施工の方は、冬期の現場塗装作業があり、積雪によって中断しなければならないかと懸念しておりましたが、幸いにも天候に恵まれ、無事故・無災害で完了することが出来ました。

日本ファブテック(株)としましては、岩手県内において2現場が稼働中、3現場が工場製作中と、引き続き施工を行ってまいりますので、皆様のご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。



齊藤 監理技術者



工事完了した上片巣橋

## 工事完了報告

### ～ 松山地区道路改良工事 ～

(株)テラ 工期 H30.3.1～H31.1.31



今回の工事は、(仮)松山IC付近の切り回し道路の撤去とICとなる道路の拡幅、舗装工事でした。

工事の前半は、土砂の掘削と運搬が中心で、現場からダンプで土砂を運搬しました。ダンプの走行の際は、地域の皆さんが通行しにくい事もあったかと思えます。ダンプに走行をゆずっていたく事も何度かありました。

また、本工事は、夜間の自動車専用道路の通行止めも必要な工事でした。

そのような中、地域の皆様にご理解とご協力をいただき、工事を順調に進められ、無事故で完成出来ましたことに感謝いたします。

本当にありがとうございました。



菊池 現場代理人



菊池 監理技術者



工事完了した(仮)松山IC

## 宮古箱石道路安全協議会 会長が交代しました!

国道106号 茂市地区道路工事を施工している戸田・岩田地崎JVの尾花です。今年1月より宮古箱石道路安全協議会の会長職を拝命致しました。

宮古箱石道路は、震災復興のリーディングプロジェクトとして1日も早い完成が望まれており、当協議会への期待も年々大きくなっています。今年1年間、微力ながら協議会活動の活性化を図って参りますのでよろしくお願い致します。

※「宮古箱石道路安全協議会」は、宮古箱石道路管内で工事を請け負っている企業で構成されています。



尾花会長

FM826 MIYAKO HARBOR RADIO82.6 みやこハーバーラジオ 「復興のつら音」

3/26, 4/9 11:30～ (予定)  
3/27, 4/10 16:30～ (再放送予定)  
出演：宮古箱石道路安全協議会

宮古箱石道路の事業進捗状況 他イベント情報など




平成30年度 宮古箱石道路 工事一覧表

No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL	No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL
①	国道106号 磯鶏地区道路工事	H28.4.1~H31.9.27	大成建設(株)	77-5162	⑫	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3~H31.3.29	大豊・佐田JV	79-1855
②	国道106号 小山田地区道路工事	H29.4.1~H31.8.15	飛鳥建設(株)	77-5322	⑬	腹帯上川井地区道路改良工事	H29.7.19~H31.3.25	大豊建設(株)	72-2001
③	小山田こ道橋上部工事	H30.1.23~H31.3.20	(株)富士ピー・エス	65-6570	⑭	国道106号 腹帯橋上部工事	H30.9.20~H32.3.19	宮地エンジニアリング(株)	-
④	国道106号 磯鶏地区舗装工事	H30.12.4~H32.2.28	鹿島道路(株)	-	⑮	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16~H31.3.29	大成建設(株)	77-5653
⑤	国道106号 茂市トンネル工事	H28.11.26~H31.3.15	前田建設工業(株)	79-1685	⑯	国道106号 川井地区トンネル工事	H29.11.15~H32.5.29	西松建設(株)	77-3777
⑥	茂市地区道路改良工事	H30.7.19~H31.12.20	(株)新井組	65-6655	⑰	川井腹帯地区道路改良工事	H29.4.3~H31.3.28	大豊建設(株)	77-3750
⑦	茂市腹帯地区道路改良工事	H29.7.20~H31.3.27	(株)森本組	65-6316	⑱	上川井地区道路改良工事	H30.3.30~H31.6.17	岩田地崎建設(株)	65-8712
⑧	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19~H31.3.29	戸田・岩田地崎JV	65-7007	⑲	国道106号 片巣地区道路工事	H29.12.14~H31.10.24	(株)奥村組	65-8361
⑨	茂市橋上部工事	H30.9.7~H31.9.25	日本ファブテック(株)	-	⑳	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17~H31.2.28	(株)安藤・間	85-1525
⑩	上茂市橋上部工事	H30.3.30~H31.7.9	日本ファブテック(株)	-	㉑	国道106号 新箱石大橋上部工事	H30.4.1~H32.2.3	高田機工(株)	-
⑪	下腹帯橋上部工事	H30.9.4~H31.7.5	(株)角藤	-					

宮古箱石道路（宮古～箱石）工事状況

平成31年2月15日現在

<p>⑰施工：大豊建設(株)</p>  <p>(仮) 上川井橋下部工</p> <p>(仮) 上川井橋A1橋台、A2橋台が完成し、橋台の埋戻しを行っています。</p>	<p>⑮施工：西松建設(株)</p>  <p>(仮) 川井第1トンネル(宮古側)</p> <p>(仮) 川井第1トンネルの掘削を行っています。全長1,764mのうち503mまで進んでいます。</p>	<p>⑬施工：大豊建設(株)</p>  <p>(仮) 腹帯橋P1橋脚</p> <p>(仮) 腹帯橋P1橋脚では柱部の施工を行っています。</p>	<p>⑧施工：戸田・岩田地崎JV</p>  <p>(仮) 下腹帯橋下部工</p> <p>(仮) 下腹帯橋のA1は完成し、A2橋台躯体を施工しています。</p>	<p>⑥施工：(株)新井組</p>  <p>腹帯地区</p> <p>腹帯地区では、函渠を施工するための掘削作業を行っています。</p>	<p>⑤施工：前田建設工業(株)</p>  <p>(仮) 茂市トンネル(宮古側)</p> <p>(仮) 茂市トンネルの掘削を行っています。全長1,885mのうち900mまで進んでいます。</p>	<p>③施工：(株)富士ピー・エス</p>  <p>(仮) 小山田こ道橋上部工</p> <p>(仮) 小山田こ道橋上部工では、床版工の施工が完了し、壁高欄の施工を行っています。</p>	<p>①施工：大成建設(株)</p>  <p>(仮) 磯鶏トンネル(磯鶏側)</p> <p>(仮) 磯鶏トンネル(磯鶏側)の掘削を行っています。全長1,554m(845mを大成建設で施工)のうち763mまで進んでいます。</p>
---	--	--	--	--	--	---	---

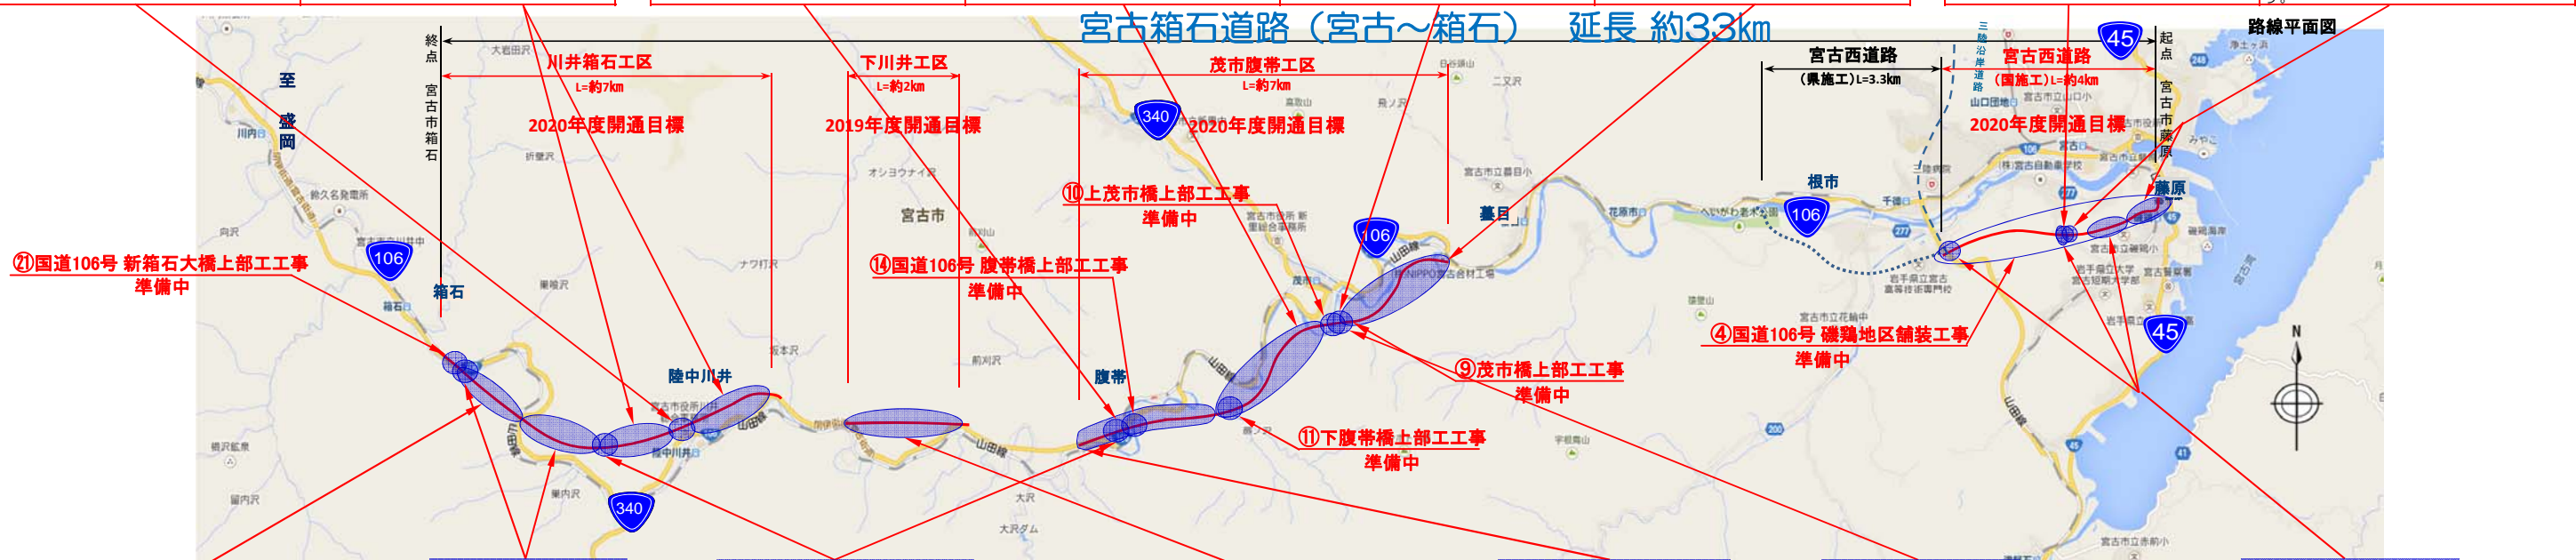

<p>⑳施工：(株)安藤・間</p>  <p>(仮) 新箱石大橋P1橋脚</p> <p>(仮) 新箱石大橋P1橋脚は、躯体の施工が完了しました。現在、覆工コンクリートの仕上げ作業を行っています。</p>	<p>⑱施工：(株)奥村組</p>  <p>(仮) 片巣トンネル(宮古側)</p> <p>(仮) 片巣トンネルの掘削を行っています。全長559mのうち306mまで進んでいます。</p>	<p>⑱施工：岩田地崎建設(株)</p>  <p>川井地区</p> <p>川井地区で工事用道路の仮橋の施工を行っています。</p>	<p>⑮施工：大成建設(株)</p>  <p>(仮) 下川井トンネル(宮古側)</p> <p>(仮) 下川井トンネルの掘削を行っています。全長2,050mのうち2,042mまで進んでいます。</p>	<p>⑫施工：大豊・佐田JV</p>  <p>(仮) 腹帯第3トンネル(盛岡側)</p> <p>(仮) 腹帯第3トンネルでは坑門工のコンクリート打設が完了し、型枠の解体を行っています。</p>	<p>⑦施工：(株)森本組</p>  <p>(仮) 茂市橋下部工</p> <p>(仮) 茂市橋では、P2,P3橋脚の躯体の施工が完了し、現在施工ヤードの撤去を行っています。</p>	<p>②施工：飛鳥建設(株)</p>  <p>(仮) 磯鶏トンネル(小山田側)</p> <p>(仮) 磯鶏トンネル(小山田側)の掘削を行っています。全長1,554m(709mを飛鳥建設で施工)のうち520mまで進んでいます。</p>
--	---	---	--	---	---	---
