



天候に恵まれ順調に施工中



R4.5.25撮影

工事で使用している型枠

下の写真が本体工で使用している型枠です。近年残存型枠が普及してきました。残存型枠は名前のとおり組立てた型枠を打設後に取り外す必要のない型枠のことをいいます。残存型枠にもいろいろあり今回現場で使用する型枠はデコメッシュという製品の型枠です。このデコメッシュは1枚当たり(1.0m×1.0m)約8kgと軽量でタイプも石模様とフラットの2種類あり現場ではこの2種類を組み合わせながら型枠の組立作業を行っています。



R4.5.19撮影(型枠組立完了)



生コンを打設すると模様が浮き出てきます

R4.5.19撮影(生コン打設完了)

湯沢河川国道事務所長現場視察

5月12日に発注者である湯沢河川国道事務所の事務所長が現場視察の為、当現場を訪れました。秋田駒ヶ岳山系砂防出張所の大淵所長・北館技官より現場の説明を、また現場代理人から工事概要や進捗状況の説明を行いました。



工事の進捗状況

4月26日から開始しました生コン打設作業も天候に恵まれ予定工程通り作業が進んでいます。5月は施工が終わった箇所を発注者の確認の上、埋戻し作業を行いました。6月も引き続き型枠組立・生コン打設作業を行っていきます。これから梅雨の時期に入るため、天候の状況に応じて早出もしくは残業で作業を行います。住民の皆様には御通行の際ご迷惑をお掛けしますが、安全第一で作業していきますので御理解・御協力のほどよろしくお願いします。


工事工程表

工期:令和4年3月4日~令和4年12月20日
— 計画工程線 — 実施工程線

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
準備工・後片付け	—	—								—
型枠組立		—	—	—	—	—	—	—		
生コン打設			—	—	—	—	—	—		
埋戻し					—	—	—	—		
養生										—
砂防施設工(鋼製スリット工場製作)	—	—								—

6月の生コン予定日

※ 水色着色箇所が6月打設予定箇所です。

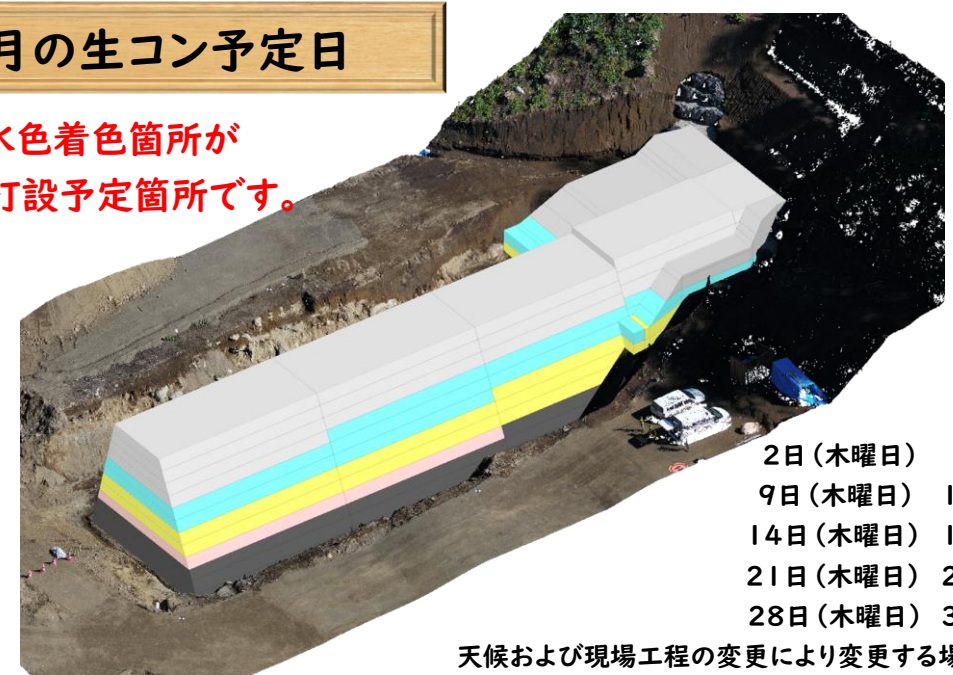

- 2日(木曜日) 7日(火曜日)
- 9日(木曜日) 12日(火曜日)
- 14日(木曜日) 16日(火曜日)
- 21日(木曜日) 23日(火曜日)
- 28日(木曜日) 30日(火曜日)

天候および現場工程の変更により変更する場合があります。
