

# 岩木川中流部地区河道掘削築堤工事


2013. 11. 15

## 堤防の盛土工事が進んでいます！



### 【工事概要】

- 工事箇所 : 北津軽郡鶴田町大字木筒 ~ 大字野木 地内  
(岩木川 35.6 ~ 36.8 K付近 左岸)
- 工期 : 平成25年7月13日 ~ 平成26年3月25日 (予定)
- 施工業者 : (株)脇川建設工業所
- 工事内容 : 鶴田町保安橋付近の岩木川に流すことが出来る水量を増やすため、その上流部の河道を掘削し、その掘削土を利用し、川幅を広げるため堤防を新たに造ります。

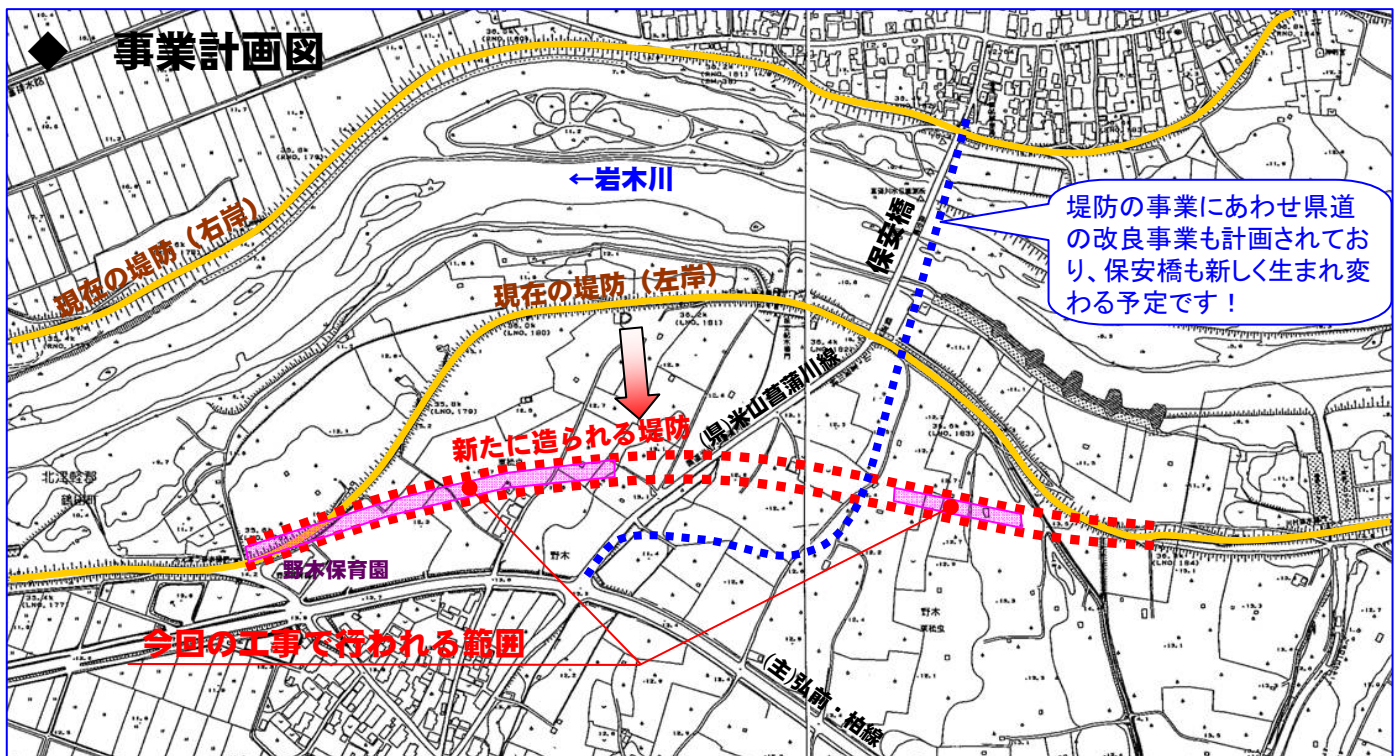

## 《進捗情報 H25. 11. 14現在》

◆鶴田町野木地区の堤防盛土の状況（進捗率 約30%）



堤防工事は、下流側の野木保育園付近から始めています！



河道掘削した土をダンプトラックで盛土箇所まで運搬し荷下ろしした後、規定の厚さで敷き均し締め固めます。



前日までの降雪で積もった雪を除去しながら作業を行っています！



盛土が完了した区間から堤防斜面の形を整えています！



整形された斜面から芝を貼り付けています！



順次、目土をし貼り付けた芝を押しあつていきます！

※ 目土：芝生の上に葉が隠れない程度に薄く土をかける事を言います。  
土壌表面の凹凸を修正したり浮き上がった株を押しあえて、ここからの発根を促し芝生を若返らせる効果があります。

**工事は冬を迎えるこれからが最盛期となり、来年3月まで続きます。  
付近では工事車両の通行が多くなりますが、ご協力をお願いいたします。**
