

平成20年岩手・宮城内陸地震により発生した 河道閉塞（天然ダム）箇所直轄砂防災害関連 緊急事業の実施状況について

河道閉塞（天然ダム）について、引き続き直轄砂防災害関連緊急事業により、地域住民の安全、安心確保のための工事を実施中です。本日の作業実施状況及び明日の作業予定は別紙のとおりです。

●迫川 湯ノ倉温泉地区

- ・昨夜から今朝方の雨で、本日9時15分に湯ノ倉地区において越流を確認しました。
- ・湯ノ倉温泉地区の河道閉塞（天然ダム）箇所の本日15時の水位は、標高395.4m（天然ダム天端と同じ）となっています。
- ・17時現在においても越流しています。
- ・17時現在、ポンプ14台で排水作業を実施中です。

（発表記者会）宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会
※国土交通本省においても発表しています。

また、東北地方整備局災害現地対策本部（栗原市役所内）においても配布しています。

（問い合わせ先）

東北地方整備局 河川部 河川環境課長 宮崎 伸一郎 （内3651）
夜間直通 022-215-3754

住所 仙台市青葉区二日町9-15

電話 022-225-2171（昼間）

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 1/2

平成20年7月12日14:00現在

		磐井川	
12日の工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県② 【②市野々原地区】 ●仮排水路(左岸田面部掘削)完了 延長L=120m <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 通水開始 6/21 12:30 </div> <ul style="list-style-type: none"> ●仮排水路断面拡大(水位低下)掘削作業完了 <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 通水開始 7/5 13:00 7/7 締切壁撤去作業完了 </div>	<ul style="list-style-type: none"> ●岩手県⑤ 【⑤産女川地区】 <div style="border: 1px solid gray; background-color: #cccccc; padding: 10px; text-align: center; color: red; font-weight: bold; margin: 5px 0;"> 7/12朝までの降雨のため、 本日作業中止 </div> <ul style="list-style-type: none"> 瑞山えん堤 横森えん堤 竜ノ口えん堤 <ul style="list-style-type: none"> ●人員 0名 	
	13日の予定	<ul style="list-style-type: none"> 【②市野々原地区】 ●仮排水路監視・点検継続 	<ul style="list-style-type: none"> 【⑤産女川地区】 瑞山えん堤 ●伐木・搬出作業継続 横森えん堤 ●現地調査 竜ノ口えん堤 ●除石掘削・運搬継続 ●土捨場作業 ●人員 60名
特記事項	その他		

河道閉塞(天然ダム)対策実施状況 2/2

平成20年7月12日14:00現在


		追 川	
12日の工事概要	<p>●宮城県②③④</p> <p>【②浅布地区】</p> <p>●仮排水路完了 延長L=203m</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>●既設水路通水開始 6/22 9:00</p> <p>●仮排水路通水開始 6/25 12:20</p> </div> <p style="text-align: center; color: red;">7/12朝までの降雨のため、 本日作業中止</p> <p>【③小川原地区】</p> <p>●仮排水路完了 延長L=475m</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>●仮排水路通水開始 6/27 19:30</p> </div> <p style="text-align: center; color: red;">7/12朝までの降雨のため、 本日作業中止</p> <p>【④温湯地区】</p> <p style="text-align: center; color: red;">7/12朝までの降雨のため、 本日作業中止</p>	<p>●宮城県⑤⑧</p> <p>【⑤湯ノ倉温泉地区】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>●仮排水 7/5 9:00排水開始</p> <p>●7/9 16:40よりポンプ16台排水中</p> <p>●14:00現在の水位 TP395.4m (危険水位394.9mより +0.5m)</p> <p>●7/11 14:00~7/12 14:00の24時間の水位変化=3.7m上昇</p> </div> <p style="text-align: center; color: red;">7/12 10:40作業再開</p> <p>●ポンプ運転管理(14台)継続</p> <p>●作業用通路整備継続</p> <p>●工事用道路造成継続(1100m/2400m)</p> <p>●河床・崩落箇所倒木処理中止</p> <p>●ヘリによる資器材空輸</p> <p>●稼働重機 14台 BH 7台、振動ローラ 1台、DT 5台 カクレーン 1台</p> <p>●人員 48名</p> <p>【⑧湯浜地区】</p> <p>●河道閉塞(天然ダム)目視監視</p>	<p>●宮城県⑦</p> <p>【⑦沼倉地区】</p> <p>沼 倉</p> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> <p>7/12朝までの降雨のため、 本日作業中止</p> </div> <p>沼倉裏沢</p> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> <p>7/12朝までの降雨のため、 本日作業中止</p> </div>
	13日の予定	<p>【②浅布地区】</p> <p>●仮排水路通水中</p> <p>●既設水路パイプ埋立復旧継続</p> <p>●倒木場外搬出継続</p> <p>●重機4台</p> <p>●人員 14名</p> <p>【③小川原地区】</p> <p>●仮排水路通水中</p> <p>●倒木搬出継続</p> <p>●場内整備継続</p> <p>●重機 8台</p> <p>●人員 17名</p> <p>【④温湯地区】</p> <p>●工事用道路造成継続</p> <p>●重機 11台 BH 4台、グラブラー 2台 CD 3台、収集車 2台</p> <p>●人員 22名</p>	<p>【⑤湯ノ倉温泉地区】</p> <p>●ポンプ運転管理(16台)継続</p> <p>●作業用通路整備継続</p> <p>●工事用道路継続</p> <p>●河床・崩落箇所の倒木処理継続</p> <p>●稼働重機 14台 BH 7台、CD 2台 DT 5台</p> <p>●人員50名</p> <p>【⑧湯浜地区】</p> <p>●現地調査準備</p> <p>●河道閉塞(天然ダム)目視監視</p>
特記事項	その他		

湯ノ倉地区 河道閉塞(天然ダム)状況

2008年7月12日15:00現在

時間雨量
(mm/h)


湯浜観測所降雨量

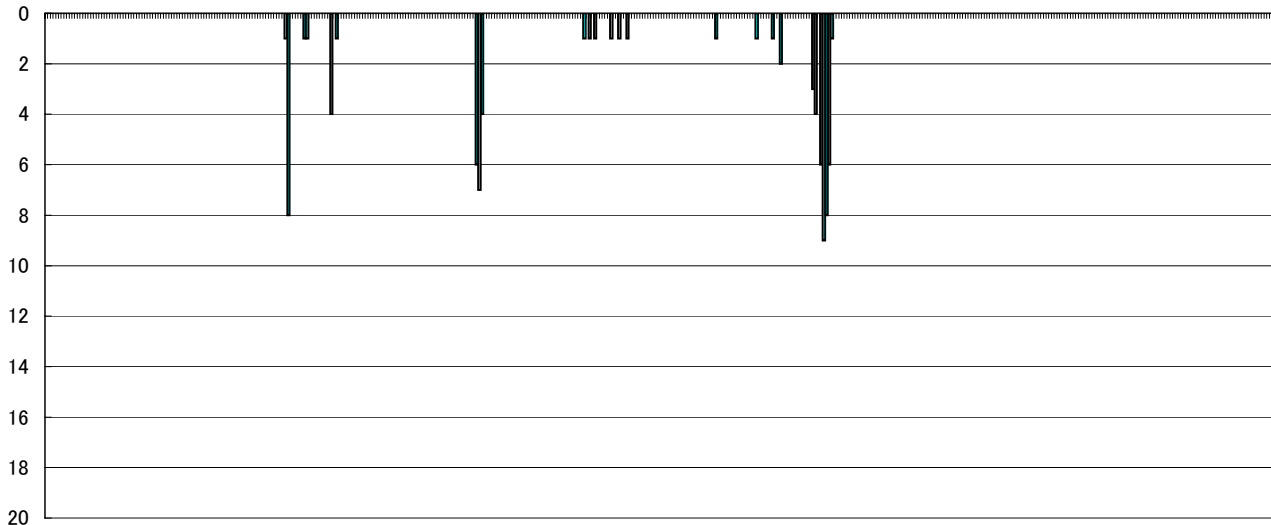

水位(m)

ポンプ排水量
(m³/s)

湯ノ倉地区河道閉塞(天然ダム)水位状況図

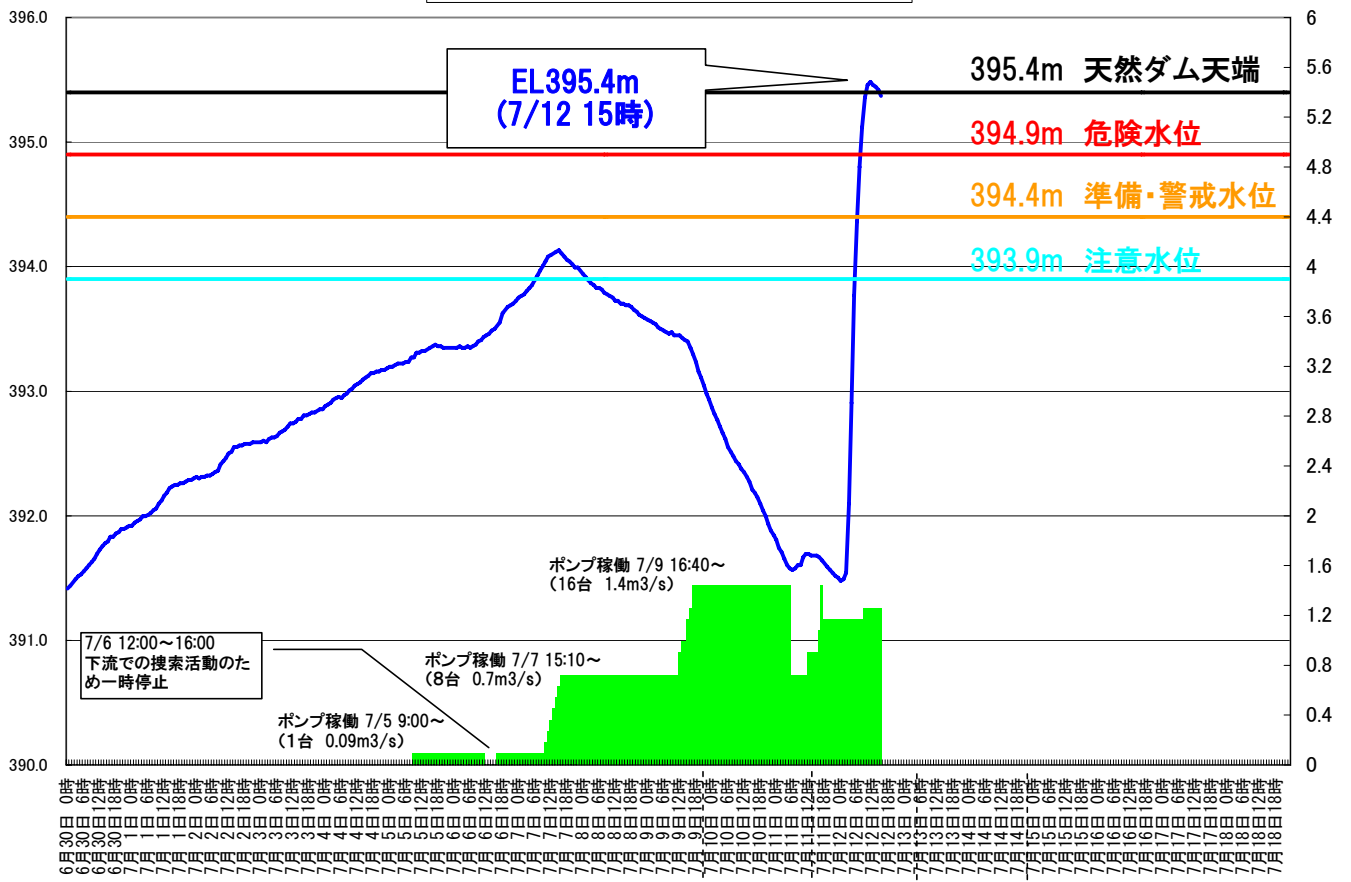

■ ポンプ稼働
 — 水位
 — 危険水位
 — 注意水位
 — 天然ダム天端
 — 準備・警戒水位
