

# 歌津本吉道路[歌津IC～本吉IC](No.355(No.-2+4.0)～No.195) 工事進捗状況

< 歌津IC～本吉ICの延長12kmを2車線事業中 >

H28年7月上旬時点


## 《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事  
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事

## 〔凡例〕

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成・一部完成

歌津本吉地区道路改良工事  
受注者：(株)フジタ  
工期：H26.10.16～H29.1.31

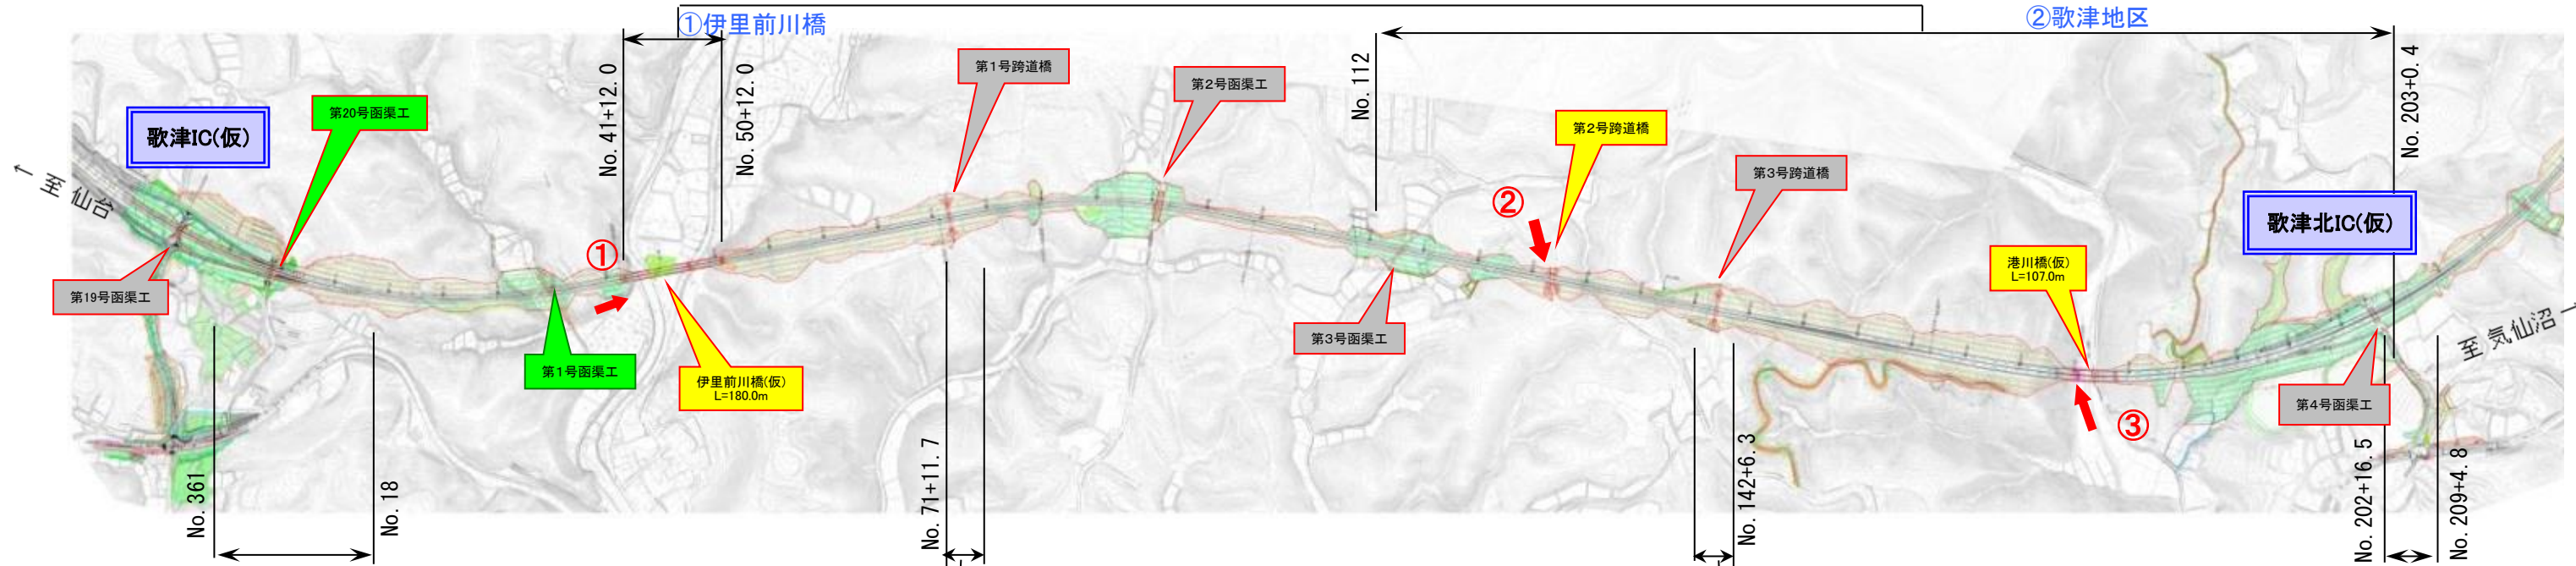

伊里前川南地区道路改良工事  
受注者：泰昌建設株式会社  
工期：H28.4.1～H29.2.24

伊里前川南地区道路改良工事  
受注者：泰昌建設株式会社  
工期：H28.4.1～H29.2.24

伊里前川南地区道路改良工事  
受注者：泰昌建設株式会社  
工期：H28.4.1～H29.2.24

