

岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト



R5.9月末時点

～流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちと暮らし」を守る治水対策の推進～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【鶴田地区】

堤防整備(国)

○鶴田地区の一部区間においては局所的に堤防が暫定堤となっているため、「一連区間で堤防を完成堤化」させ、堤防弱部の解消を図ります。

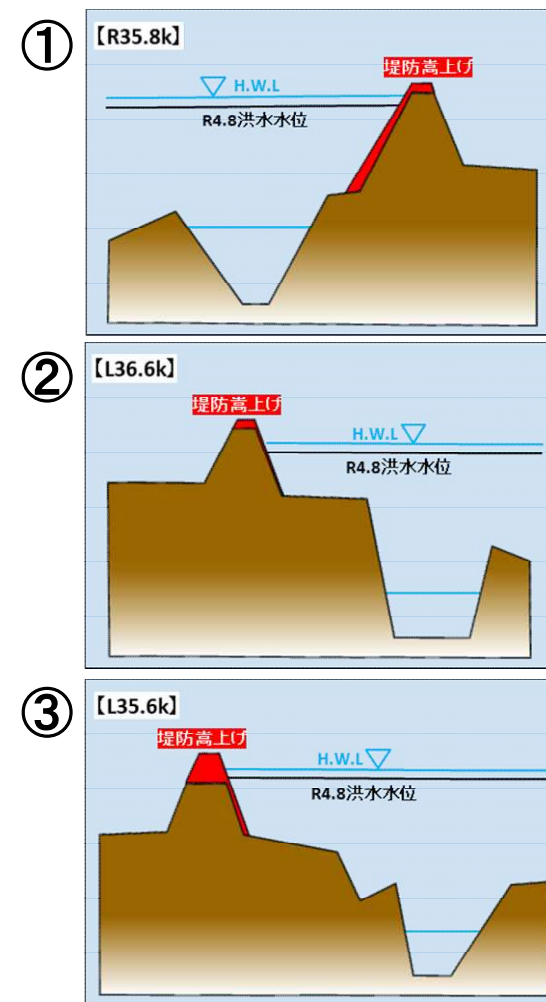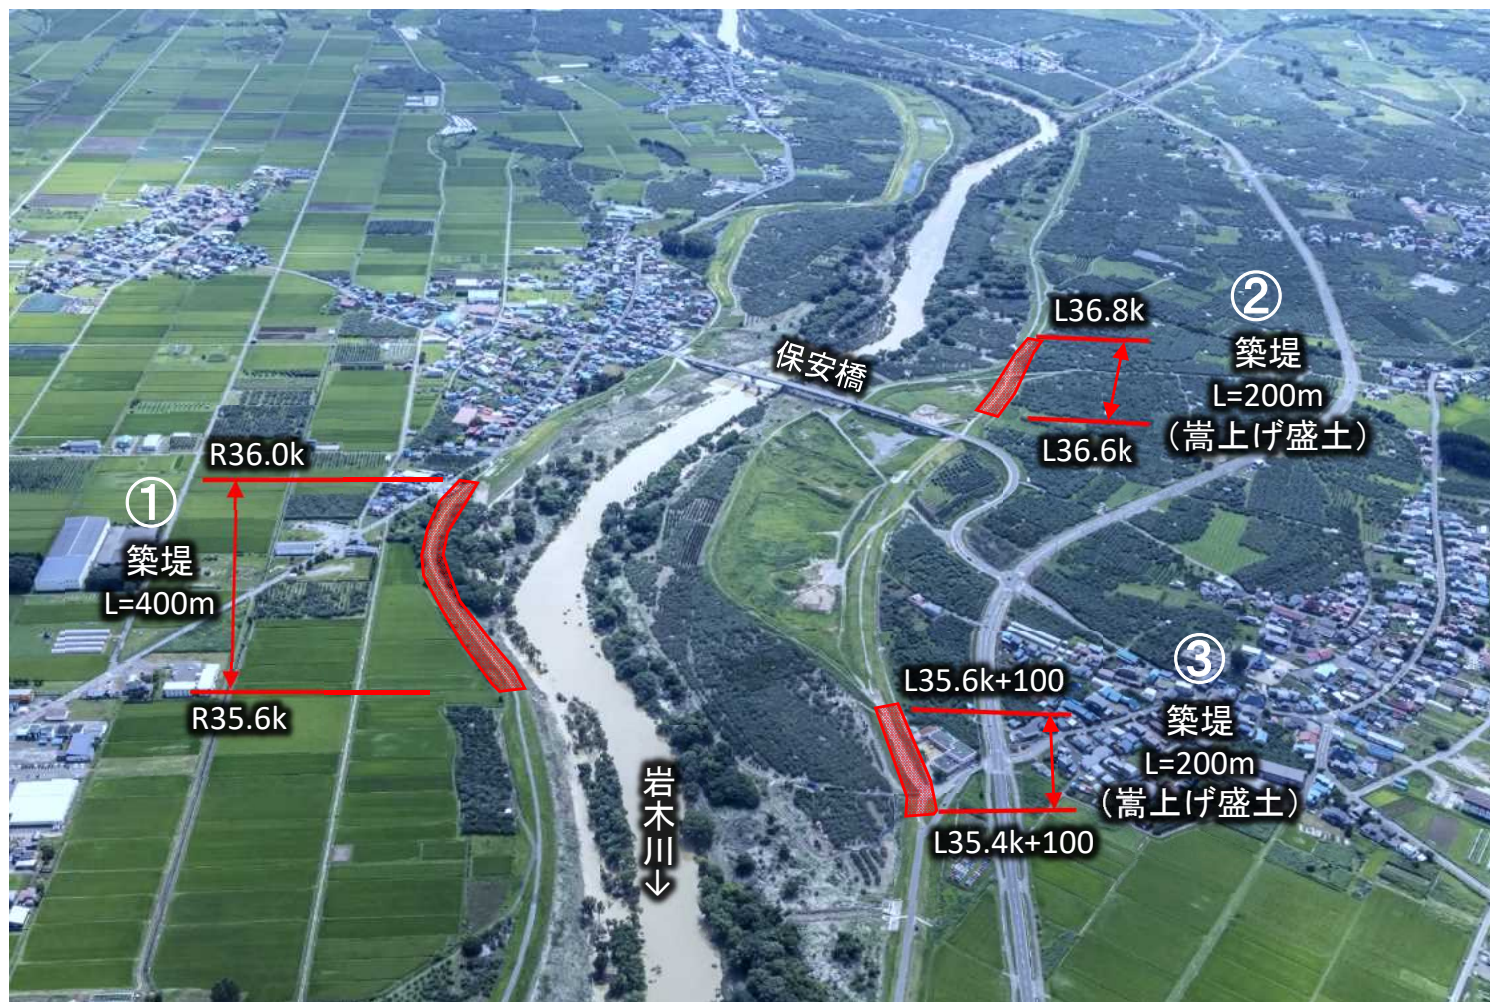

岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト

R5.9月末時点

～流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【岩木川中流部地区】

河道掘削(国)

○岩木川本川のHWL超過区間においては「河道掘削」を行う事で水位低下を図ります。

①岩木川河道掘削:39.4k～41.4k付近



②岩木川河道掘削:41.4k～43.4k付近




河道掘削作業実施状況



河道掘削状況



工事説明会の実施状況

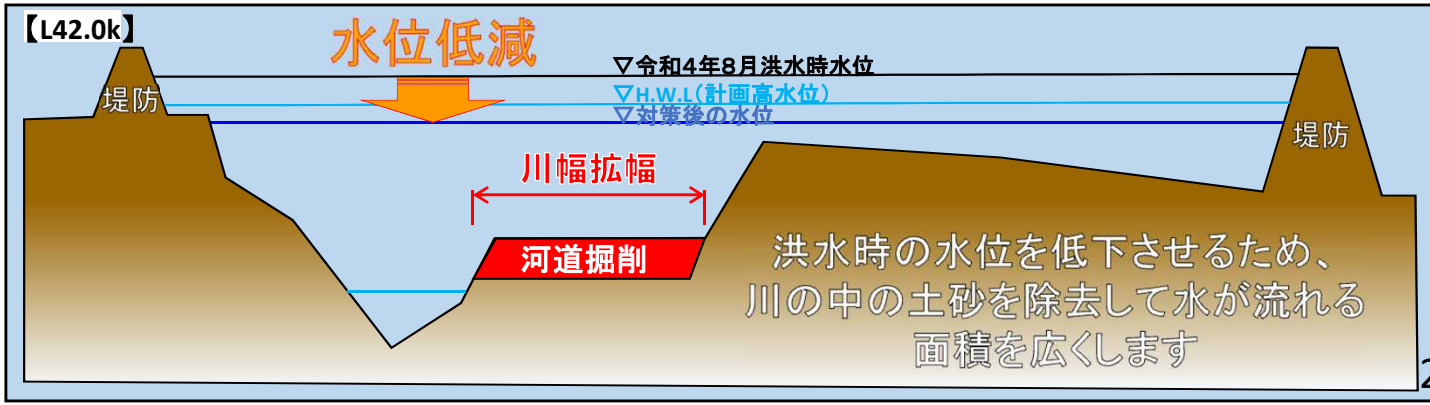

岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト

R5.9月末時点

～ 流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進 ～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 進捗状況

○岩木川 河道掘削工事(川の中の土砂を除去する工事)

進捗状況⇒ 令和5年9月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採が完了し表土剥ぎを実施中」

①

岩木川
39.5km付近
(板柳町小幡地内)



○岩木川 河道掘削工事(川の中の土砂を除去する工事)

進捗状況⇒ 令和5年9月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採が完了し掘削作業実施中」

②

岩木川
40.5km付近
(板柳町灰沼地内)



岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト

R5.9月末時点

～ 流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進 ～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 進捗状況

○岩木川 河道掘削工事(川の中の土砂を除去する工事)

進捗状況⇒ 令和5年9月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採 完」

③

岩木川
41.0km付近
(弘前市種市地内)



○岩木川 河道掘削工事(川の中の土砂を除去する工事)

進捗状況⇒ 令和5年9月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採が完了し掘削作業実施中」

④

岩木川
41.5km付近
(板柳町灰沼地内)



岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト

R5.9月末時点

～ 流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進 ～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 進捗状況

○岩木川 河道掘削工事(川の中の土砂を除去する工事)

進捗状況⇒ 令和5年9月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採が完了し掘削作業実施中」

⑤

岩木川
42.0km付近
(板柳町灰沼地内)



○岩木川 河道掘削工事(川の中の土砂を除去する工事)

進捗状況⇒ 令和5年9月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採 完」

⑥

岩木川
42.5km付近
(弘前市種市地内)



岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト

R5.9月末時点

～ 流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進 ～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 進捗状況

○岩木川 河道掘削工事(川の中の土砂を除去する工事)

進捗状況⇒ 令和5年9月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採が完了し表土剥ぎを実施中」

⑦

岩木川
43.5km付近
(板柳町板柳地内)



○岩木川 河道掘削工事(川の中の土砂を除去する工事)

進捗状況⇒ 令和5年9月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採が完了し掘削作業実施中」

⑧

岩木川
44.0km付近
(弘前市青女子地内)



岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト

R5.9月末時点

～ 流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進 ～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 進捗状況

○岩木川 災害復旧工事(護岸を復旧する工事)

進捗状況⇒ 令和5年9月末時点 「護岸復旧のための前処理である瀬替えが完了し損傷したブロックの撤去を実施中」

⑨

岩木川
48.0km付近
(弘前市町田地内)



○岩木川 災害復旧工事(護岸を復旧する工事)

進捗状況⇒ 令和5年9月末時点 「護岸復旧のための前処理である瀬替えが完了し作業ヤード整備を実施中」

⑩

岩木川
51.0km付近
(弘前市向外瀬地内)



岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト

R5.9月末時点

～ 流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進 ～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 進捗状況

○岩木川 災害復旧工事(護岸を復旧する工事)

進捗状況⇒ 令和5年9月末時点 「護岸復旧のための前処理である瀬替えが完了し作業ヤード整備を実施中」

⑪

岩木川
53.6km付近
(弘前市駒越地内)



○平川 災害復旧工事(護岸を復旧する工事)

進捗状況⇒ 令和5年9月末時点 「護岸復旧のための前処理である瀬替えが完了し作業ヤード整備を実施中」

⑫

平川
0.2km付近
(藤崎町藤崎地内)



岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト

R5.9月末時点




～流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【中泊地区】


堤防復旧(県)

○岩木川水系中里川の堤防決壊箇所における堤防復旧(延長 約30m)

進捗状況⇒「堤防復旧完了」

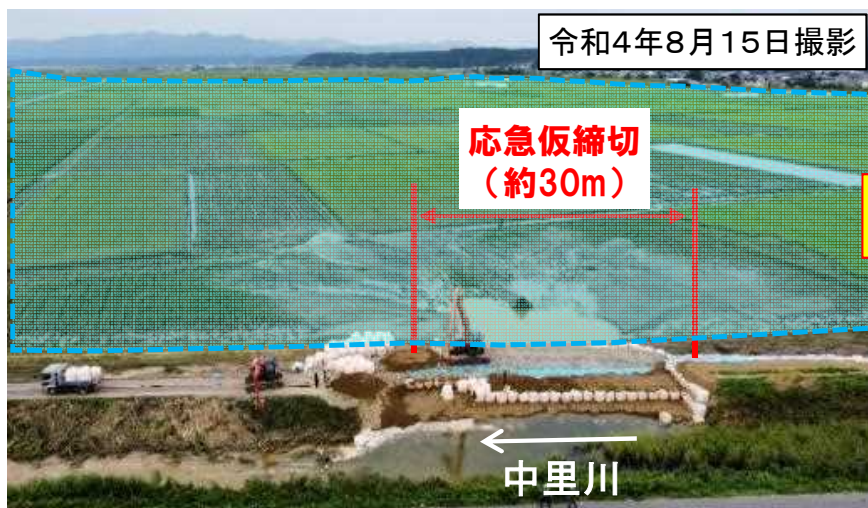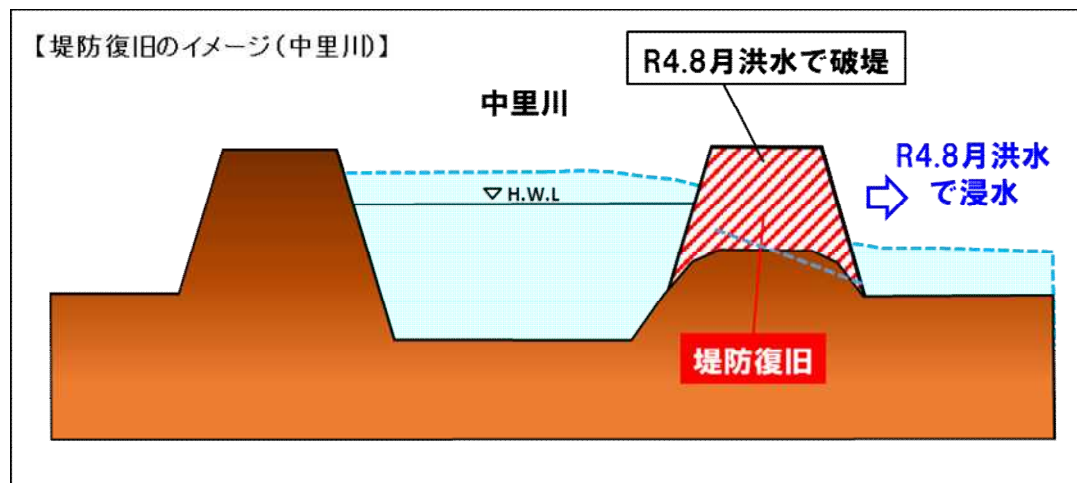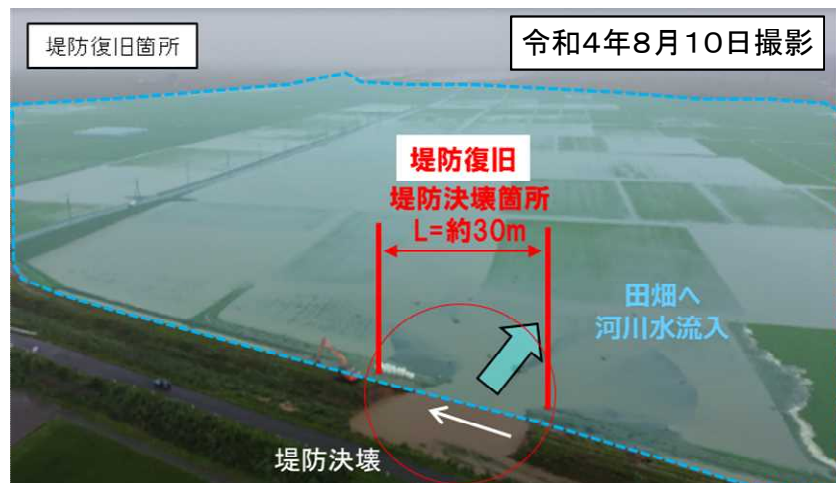

堤防復旧完了



岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト

R5.9月末時点



～流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【つがる地区】

堤防復旧(県)

○岩木川水系山田川の田光沼の堤防決壊箇所における堤防復旧(延長 約50m)

進捗状況⇒「堤防復旧完了」

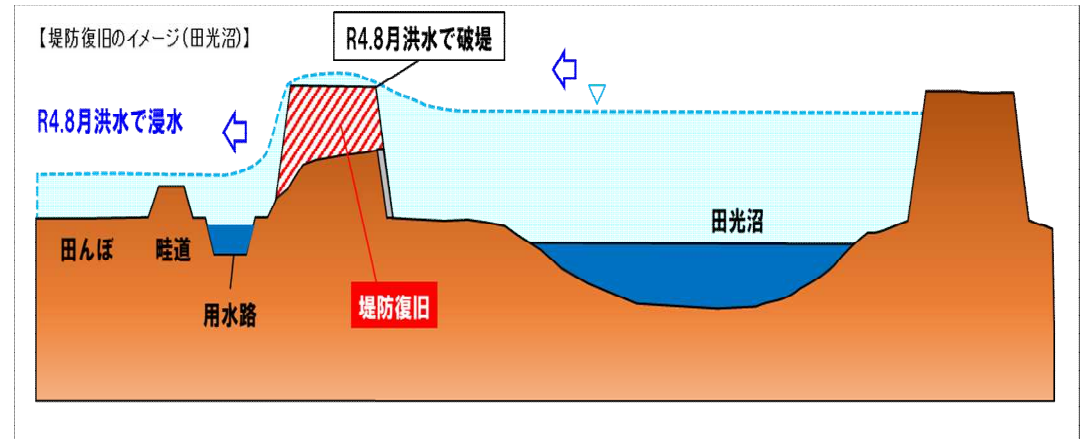

堤防復旧完了

