

国道46号仙岩トンネル天井板撤去工事は予定どおり進捗 ～ 12月10日(火)朝6時で夜間通行止め規制を解除 ～

国道46号仙岩道路の「仙岩トンネル(L=2,544m)」の天井板撤去工事を11月11日(月)より12月10日(火)まで、夜9時から翌朝6時までの夜間全面通行止めにより鋭意工事を進めているところです。

皆様のご理解とご協力により、本日(11月29日)夜9時から作業で天井板撤去作業が終了する予定です。今後は、吊り金具撤去作業とともにトンネル補修等を実施し、12月10日(火)6時をもって夜間全面通行止めを解除します。

工事期間中ご迷惑をおかけしますが、国道4号または県道1号及び国道107号、13号を迂回するようご協力をお願いいたします。

なお、国道46号仙岩道路または迂回路を通行される場合は、積雪や凍結の恐れがありますので冬タイヤやチェーンの装着をお願いします。

《平成25年11月29日6時現在進捗状況》

○進捗状況：(別添資料参照)

天井板撤去13,006枚中12,651枚(進捗率97%)撤去。本日(11/29)の作業で終了予定。今後は吊り金具撤去並びにトンネル覆工コンクリート等の補修予定。

○その他

秋田、岩手両河川国道事務所のホームページに工事の進捗状況を掲載しております。

【記者発表先】 秋田県政記者会、岩手県政記者クラブ 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

TEL:018-823-4167

副所長(道路担当) こんの けいじ 今野 敬二

道路管理第二課長 さいとう まさし 齋藤 正志

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所

TEL:019-624-3131

副所長(道路担当) かめい まさよし 亀井 督悦

道路管理第一課長 みうら くにひこ 三浦 邦彦

天井板撤去状況

昨日までの作業状況

全13,006枚中11,697枚撤去

本日の作業状況

954枚撤去（累計12,651枚）

残り作業量

355枚

吊り金具撤去状況

昨日までの作業状況

全2,500本中2,166本撤去

本日の作業状況


246本撤去（累計2,412本）

残り作業量

88本

: 昨日迄の施工済箇所
 : 本日施工箇所

①班: 0m～859m
 ②班: 859m～1,718m
 ③班: 1,718m～2,577m

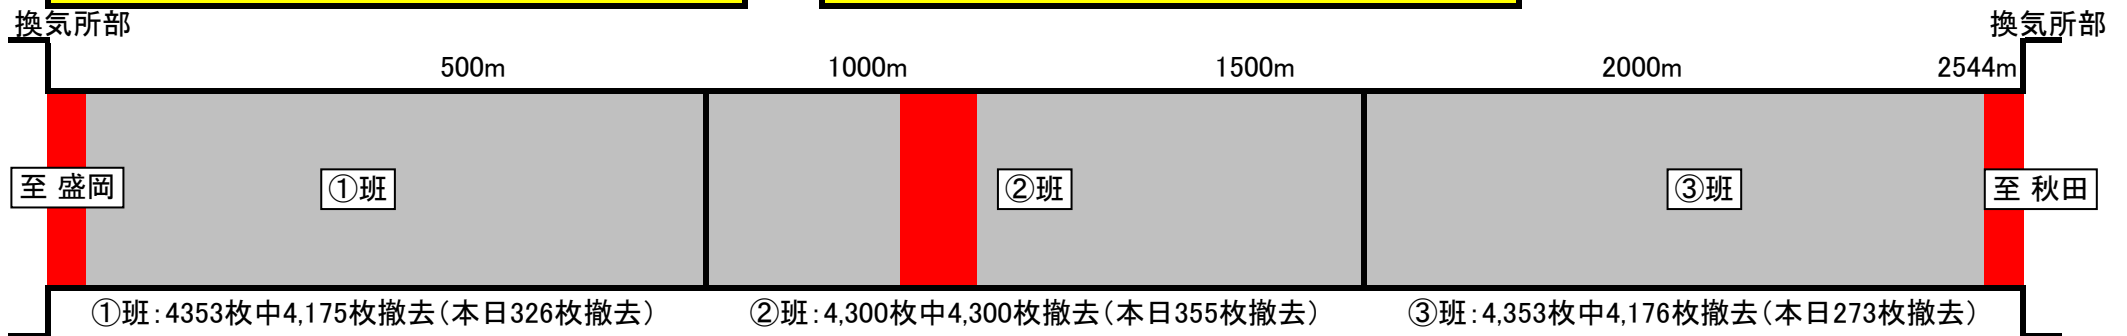

■吊り金具撤去等を除いた天井板撤去の進捗率=97.3%(12,651枚/13,006枚)

作業状況写真



天井板撤去状況



吊り金具撤去状況



天井板撤去後の状況

※天井板撤去作業終了後、トンネル覆工コンクリート補修等の作業を夜間全面通行止めで10日間実施する予定です。
