



- 左岸小山地区・右岸芝野地区は11月で掘削・運搬を終了しております。
- 『豊巻地区』は10月下旬に掘削運搬に着手し、順調に進捗しております。多くのダンプトラックが走行しますので、引き続きご理解とご協力をお願い致します。
- 新たに『仁井田地区』の工事が契約となりました。掘削・運搬は少し先ですが、順次樹木の伐採作業に入ります。

12/28時点 【掘削運搬ボリューム】

93,700m³ / 93,700m³

芝野地区 進捗率 **100%** 完


60,900m³ / 60,900m³

小山地区 進捗率 **100%** 完

33,600m³ / 55,500m³

豊巻地区 進捗率 **60.5%**

※各地区3工事の合計です。現地状況で変わることがあります

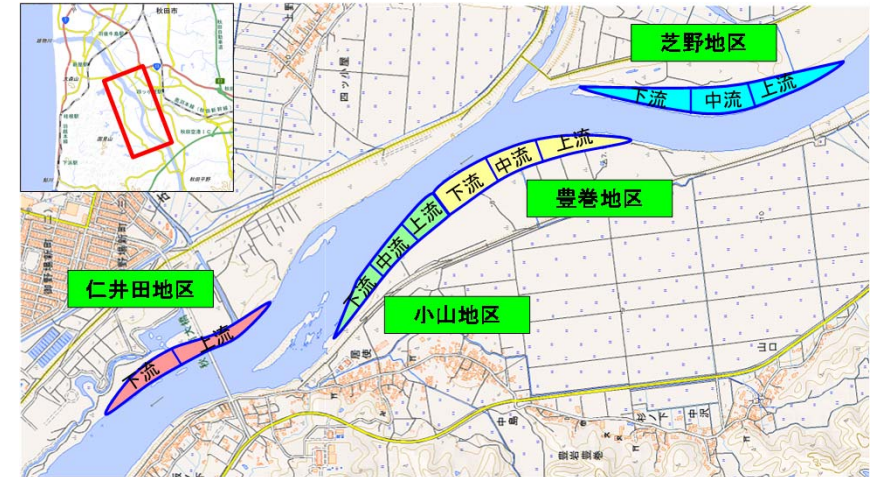

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平30東保 第23号)

豊巻地区上空から



※11月第3週撮影



※12月第3週撮影

掘削した土はどこに運んでいるの？

ダンプトラックがたくさん走っているけど、どこに運んでいるの？
よくお問い合わせを頂きます。

主に雄和方面の国有地、自治体の所有地などに運び、雨などで周囲に流出しないよう対策を施した上で、整形して仮置きしています。

今後、堤防の材料として使用します。



種沢地区



戸賀沢地区

※上記は運搬先の一部です。

