

田沢湖田沢供養佛地区の緊急工事進捗状況 ～ 一時工事休止し、年明け 3 月中旬に再開へ ～

8月9日に発生した田沢湖田沢供養佛地区の土砂災害について、10月1日より国による緊急工事に着手し、12月3日からはコンクリート打設を進めているところです。

11月11日の初冠雪以降、現地では度々降雪にみまわれ、12月27日8時現在で積雪が33cmを記録しております。

今後の工事については、コンクリート打設を26日で年内予定分を終了し、30日をもって一時工事休止期間に入ります。工事の再開は3月中旬を予定しております。

《参考資料》

工事の進捗情報 NO.5



※当事務所HPの「田沢湖田沢供養佛地区災害関連情報」のバナーから、工事の進捗状況など、当該災害に関する情報を一元的に公開しています

※発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢・角館支局

《問い合わせ先》

国土交通省東北地方整備局湯沢河川国道事務所

湯沢市関口字上寺沢 6 4 - 2
電話 0 1 8 3 - 7 3 - 5 5 4 4

副所長

つちだ つねとし
土田 恒年（内線 2 0 4）

調査第一課長

はたやま さくえい
畑山 作栄（内線 3 5 1）

湯沢河川国道事務所HP URL

<http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/>

供養佛地区緊急工事の進捗情報

【平成25年11月22日～12月26日】

No5

[作成・連絡先] 国土交通省湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所
Tel: 0187-46-2681

10月1日より国による緊急工事に着手しました。

12月26日までの工事状況は以下のとおりです。

なお、12月30日より冬期一時工事休止いたします。（次回のお知らせは、工事再開予定3月中旬の予定）

■進捗状況および今後の予定

平成25年10月1日から12月26日までの工事状況

工事用道路の造成		完了
倒木および土砂処理		完了
落石対策（雪崩防止兼用）		仮設土のう、設置完了（延長約50m、2段積、135袋） 落石防護柵、設置完了（延長約40m、高さ約3m）
砂防本体工事 12月30日より 一時工事休止	掘削工事	10月25日より掘削を開始し、11月27日に完了
	地盤改良工事	11月23日より着手し、12月7日に完了
	コンクリート打設	12月3日より着手し、年内は12月26日まで打設（堰堤底部で、約2mの打設完了） 工事再開は、年明け3月中旬を予定しています


■工事状況



コンクリート養生状況（12月20日撮影）



工事着手前（9月27日撮影）

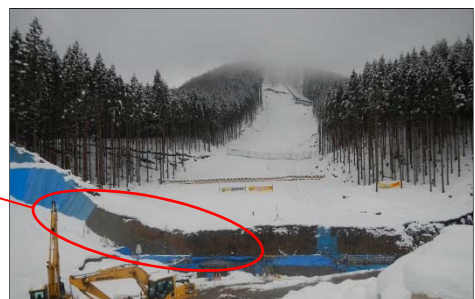

12月25日現在の状況
