

〔道路メンテナンス年報〕  
**山形の道路メンテナンス概要**



2021年11月  
**山形県道路メンテナンス会議**

## まえがき

山形県内の道路延長は、幹線ネットワークを構成する高速道路や一般国道から市町村が管理する生活道路まで約 17,500 kmにおよび、その中には約 9,400 の橋梁、約 160 のトンネル、約 540 の道路附属物等があります。また、その道路構造物の多くが高度経済成長期に建設され、道路構造物の老朽化は急速に進んでいます。

例えば、山形県内の建設後 50 年を経過した橋梁は、建設年次が不明な橋梁を除くと 2021 年 3 月末時点では約 2,700 橋で、全体の 30%ですが、20 年後には 74%の約 6,700 橋まで増加するため、老朽化対策の課題に早期に取り組むことが求められています。

道路構造物の老朽化対策は緊急的・社会的な課題であり、2014 年度から道路のメンテナンスサイクルの構築に向けた取組みが本格化し、2018 年度までの 5 年間（1 巡目）で、各道路管理者により計画的に点検が実施されたところです。引き続き 2 巡目点検を計画的に進めるとともに、点検結果を踏まえた補修・修繕等を実施していきます。

「山形県道路メンテナンス会議」は、県内の道路管理者が連携しながら、道路構造物の維持管理に対する技術力の向上、道路インフラの予防保全・老朽化対策を推進するための体制強化を図るために 2014 年度に設立し、これまで道路施設の定期点検計画の策定、点検業務の地域一括発注、点検・補修に関する見学会・研修会及び修繕の実施に取り組んできたところです。

2021 年 11 月の「山形の道路メンテナンス概要」は、山形県道路メンテナンス会議の取組みの一環として、2 巡目点検となる 2019～2020 年度の県内道路施設の点検結果や老朽化の実態、1 巡目点検施設のメンテナンスの取組み実態をとりまとめ、県民や道路利用者に情報発信していくものです。

この「山形県道路メンテナンス概要」により、メンテナンスの取組みへの理解が深まり、道路メンテナンスの更なる推進に繋がれば幸いです。

山形県道路メンテナンス会議 会長  
(山形河川国道事務所長) 橋本 裕樹

## 目 次

1 道路構造物の現状 .....	1
(1) 道路構造物の管理者 .....	1
(2) 道路構造物の急速な老朽化 .....	1
2 山形の道路メンテナンス概要について .....	2
(1) 概要 .....	2
(2) 橋梁・トンネル・道路附属物等の健全性の診断について .....	2
3 橋梁・トンネル・道路附属物等の点検結果 .....	3
(1) 2巡目（2019～2020年度）の点検結果（全道路管理者） .....	3
(2) 2巡目（2019～2020年度）の点検結果（管理者別） .....	5
(3) 2019～2020年度点検実施施設における判定区分の遷移状況 .....	11
(4) 直近5年間（2016～2020年度）の点検結果（全道路管理者） .....	14
(5) 直近5年間（2016～2020年度）の点検結果（管理者別） .....	18
4 判定区分Ⅲ、Ⅳの施設の修繕等措置の実施状況 .....	21
(1) 1巡目点検施設における修繕等措置の実施状況 .....	21
(2) 直近5年間の点検施設における修繕等措置の実施状況 .....	25
(3) 判定区分Ⅳの施設の措置状況 .....	28
(4) 修繕等措置の取り組み事例 .....	29
(5) 橋梁の損傷傾向 .....	36
(6) 個別施設計画の策定状況 .....	38
5 予防保全への移行状況 .....	40
6 道路メンテナンス会議の取り組み .....	41
7 参考資料（東北と県全体の比較） .....	43
8 巻末資料 .....	54

## 1 道路構造物の現状

### (1) 道路構造物の管理者

県内の道路には、橋梁やトンネル、道路附属物等といった道路構造物があります。このうち、橋梁の数が最も多く、約6割を市町村で管理しています。

表1-1 道路管理者別の道路構造物等内訳

管理者	道路延長 (km)	橋梁 (橋)	トンネル (箇所)	道路附属物等				
				(施設)	シェッド	大型カルバート	横断歩道橋	門型標識等
国土交通省	591	961	46	219	28	73	38	80
高速道路会社	182	337	40	172	14	124	0	34
県	3,464	2,433	57	126	26	24	24	52
市町村	13,275	5,738	18	22	6	11	2	3
合計	17,512	9,469	161	539	74	232	64	169


※2021年3月末時点

※道路延長は「道路統計年報2020」より集計

### (2) 道路構造物の急速な老朽化

橋梁やトンネル、道路附属物等といった道路構造物は、その多くが高度経済成長期に建設され、今後、これらの道路構造物の老朽化が急速に進みます。

特に構造物数の多い橋梁でみると、建設後50年を経過した橋梁は、現在30%に対し、10年後には56%に増加するため、計画的・効率的なメンテナンスサイクルの構築が必要な状況です。

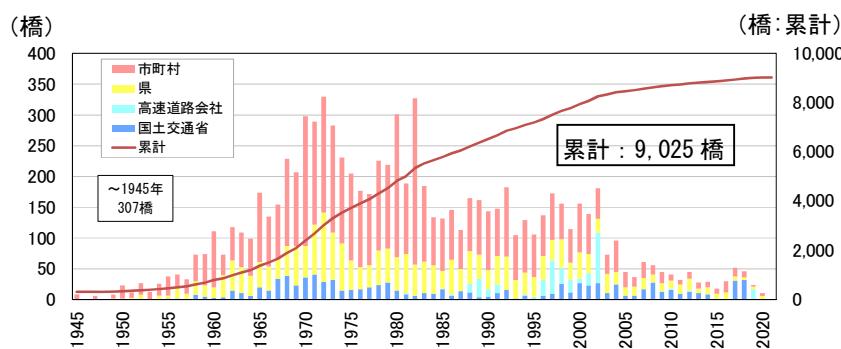

※この他、古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁が約400橋ある。  
(出典) 道路局調べ (2021.3末時点)

図1-1 建設年代別施設数（橋梁）


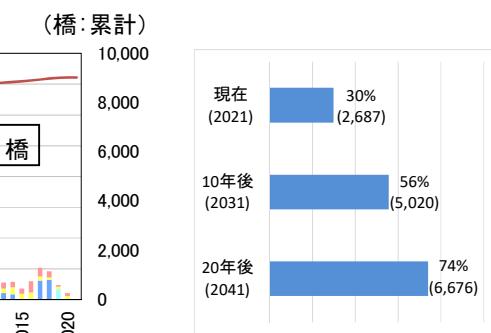


図1-2 建設後50年を経過した施設の割合（橋梁）

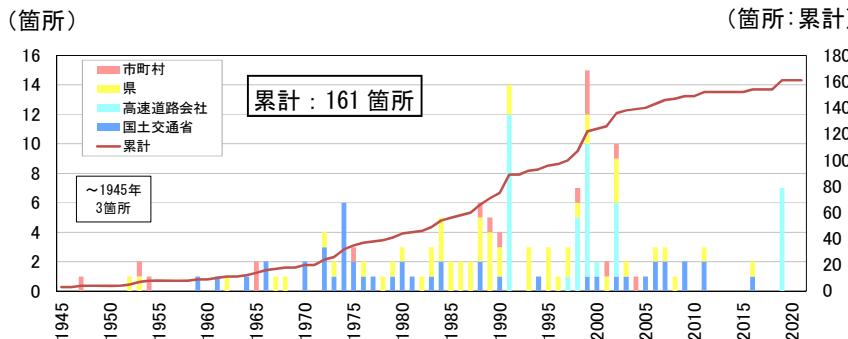

(出典) 道路局調べ (2021.3末時点)

図1-3 建設年代別施設数（トンネル）

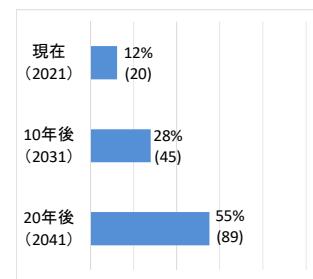


図1-4 建設後50年を経過した施設の割合（トンネル）

## 2 山形の道路メンテナンス概要について

### (1) 概要

- 山形県道路メンテナンス会議では、県民・道路利用者に道路インフラの現状及び老朽化対策についてご理解頂くため、点検の実施状況や結果等を「山形の道路メンテナンス概要」としてとりまとめています。
- 橋梁・トンネル・道路附属物等※については、2014～2018 年度における 1 巡目点検（以降、1 巡目点検）が完了し、2019 年度より 2 巡目の点検に着手しています。
- 今回は、下記についてとりまとめました。
  - 2019～2020 年度における点検結果及び判定区分の遷移状況
  - 直近 5 年間（2016～2020 年度）の点検結果
  - 1 巡目点検施設及び直近 5 年間の修繕等措置の実施状況（2020 年度末時点）
- この調査結果は、点検結果を踏まえた今後の措置方針の立案等に活用します。

道路の老朽化の現状はどうなっているの  
だろうか。  
→地域毎のデータ、経年的な変化等、様々な観  
点から県内の道路施設の老朽化の実態を把握  
することができます。

今後どのように措置していくのか。  
→各道路管理者は、自らの管理施設の老朽化の  
実態を踏まえ、今後の措置方針を立案してい  
くことになります。

※道路附属物等：シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等

### (2) 橋梁・トンネル・道路附属物等の健全性の診断について

全ての道路管理者は、2013 年の道路法改正等を受け、2014 年 7 月より 5 年に 1 回の頻度で近接目視による点検を実施しています。

健全性の診断は、以下の 4 段階に区分します。

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じている可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。



写真 2-1 橋梁点検状況



写真 2-2 トンネル点検状況

### 3 橋梁・トンネル・道路附属物等の点検結果

#### (1) 2巡目(2019~2020年度)の点検結果(全道路管理者)

2巡目(2019~2020年度)の累積点検実施率は、橋梁 42%、トンネル 25%、道路附属物等 30%です。

判定区分の割合は、橋梁：I 42%、II 46%、III 12%、IV 0.1%、トンネル：I 0%、II 76%、III 24%、IV 0%、道路附属物等：I 48%、II 42%、III 10%、IV 0%です。

※判定区分の割合は四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。(次頁以降も同様)  
※道路附属物等の内訳は巻末資料(1)を参照。

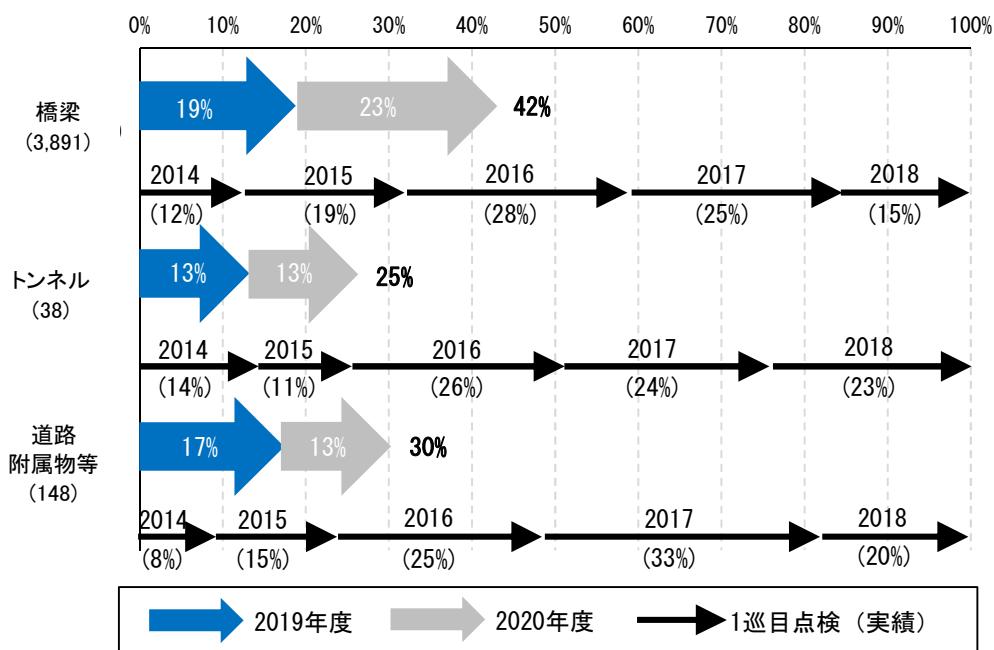


図3-1 2巡目(2019~2020年度)の点検実施率(全道路管理者合計)

※()内は、2019~2020年度に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

表3-1 2巡目(2019~2020年度)の点検実施率(全道路管理者)

	管理施設数	うち点検対象施設数※1	点検実施数	点検実施率※2
橋梁	9,469	9,306	3,891	42% (31%)
トンネル	161	150	38	25% (25%)
道路附属物等	539	496	148	30% (23%)

2021.3末時点

※1: 2021年3月時点での施設数のうち、供用後5年以内などを除いた施設数の合計。

※2: 点検対象施設数を分母とした点検実施数の割合。( )内は、1巡目(2014~2015年度)における点検実施率であり、四捨五入の関係で上記グラフの年度毎の合計値とは一致しない場合がある。

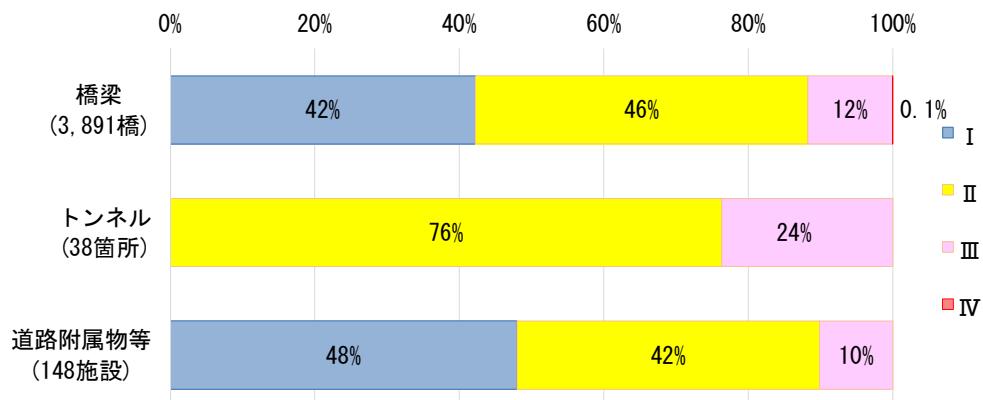


図3－2 2巡目（2019～2020年度）の判定区分の割合（全道路管理者）

※()内は、2巡目（2019～2020年度）に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

表3－2 2巡目（2019～2020年度）の判定区分の割合（全道路管理者）

	点検実施数	判定区分 上段：実数、下段：割合			
		I	II	III	IV
橋梁	3,891	1,644	1,789	455	3
		42%	46%	12%	0.1%
トンネル	38	0	29	9	0
		0%	76%	24%	0%
道路附属物等	148	71	62	15	0
		48%	42%	10%	0%

2021.3末時点

【参考】1巡目（2014～2018年度）の判定区分の割合（全道路管理者合計）

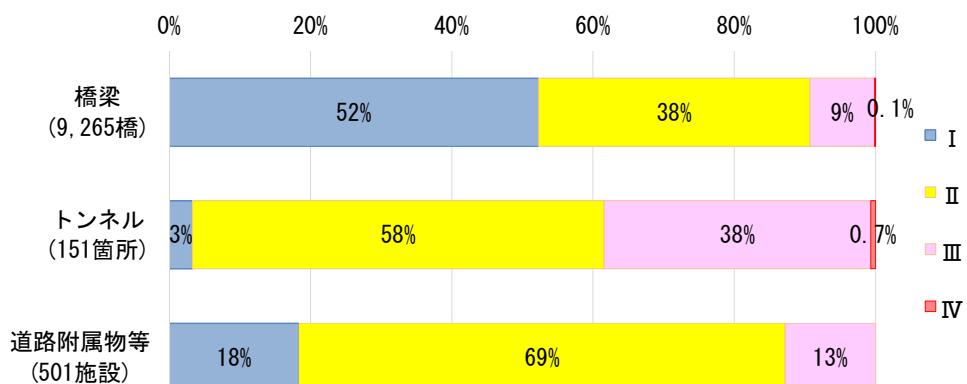


図3－3 1巡目（2014～2018年度）の判定区分の割合（全道路管理者合計）

※2019年3月時点での集計値

※()内は、1巡目（2014～2018年度）に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

## (2) 2巡目(2019~2020年度)の点検結果(管理者別)

### ①橋梁

橋梁の2巡目(2019~2020年度)の累積点検実施率は、国土交通省40%、高速道路会社42%、県35%、市町村45%です。

全管理者の判定区分割合は、I 42%、II 46%、III 12%、IV 0.1%です。

※判定区分の割合は四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

### ○2巡目(2019~2020年度)の点検実施率(橋梁)

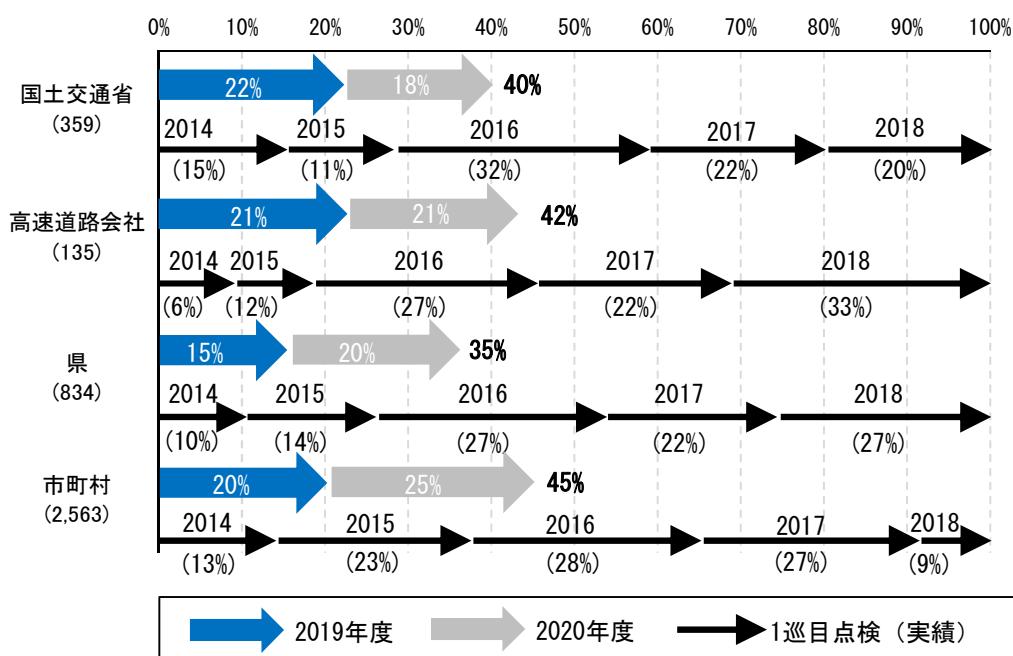


図3-4 2巡目(2019~2020年度)の点検実施率(橋梁)

※()内は、2019~2020年度に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

表3-3 2巡目(2019~2020年度)の点検実施率(橋梁)

管理者	管理施設数	うち点検対象施設数※1	点検実施数	点検実施率※2
国土交通省	961	897	359	40% (26%)
高速道路会社	337	320	135	42% (18%)
県	2,433	2,401	834	35% (24%)
市町村	5,738	5,688	2,563	45% (36%)
合計	9,469	9,306	3,891	42% (31%)

2021.3末時点

※1: 2021年3月時点での施設数のうち、供用後5年以内などを除いた施設数の合計。

※2: 点検対象施設数を分母とした点検実施数の割合。()内は、1巡目(2014~2015年度)における点検実施率。

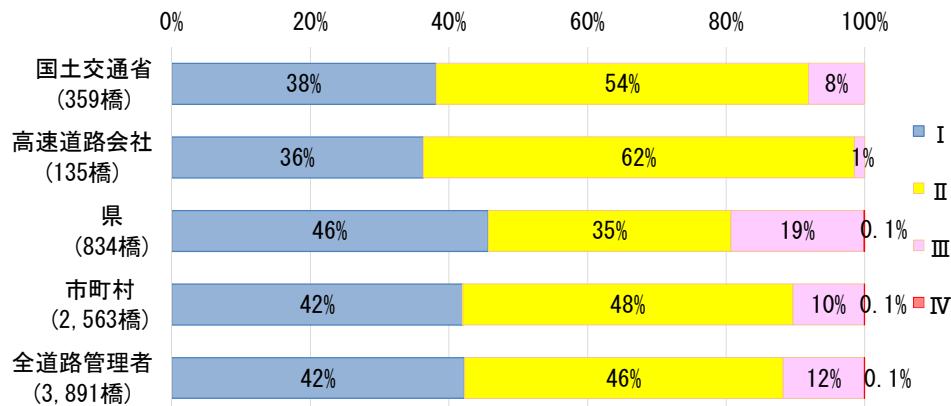


図3－5 2巡目（2019～2020年度）の判定区分の割合（橋梁）

※()内は、2巡目（2019～2020年度）に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

表3－4 2巡目（2019～2020年度）の判定区分の割合（橋梁）

管理者	点検実施数	判定区分			
		I	II	III	IV
国土交通省	359	137	193	29	0
		38%	54%	8%	0%
高速道路会社	135	49	84	2	0
		36%	62%	1%	0%
県	834	381	292	160	1
		46%	35%	19%	0.1%
市町村	2,563	1,077	1,220	264	2
		42%	48%	10%	0.1%
合計	3,891	1,644	1,789	455	3
		42%	46%	12%	0.1%

2021.3末時点

【参考】1巡目（2014～2018年度）の判定区分の割合（橋梁）

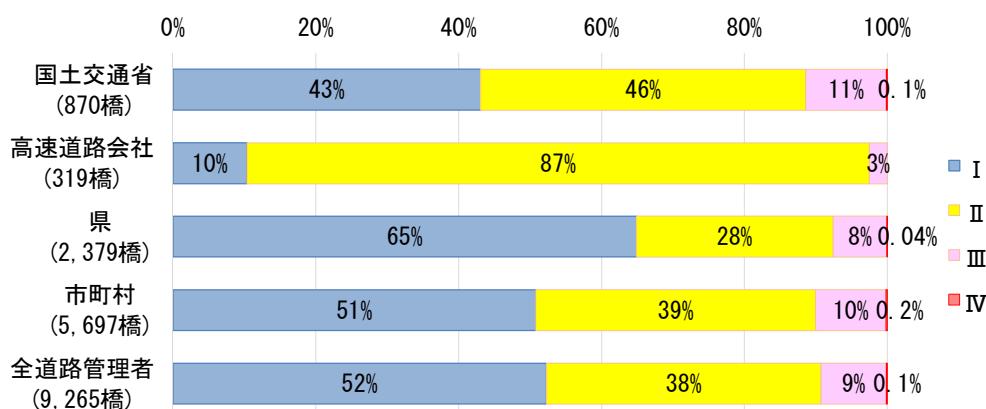


図3－6 1巡目（2014～2018年度）の判定区分の割合（橋梁）

※2019年3月時点での集計値

※()内は、1巡目（2014～2018年度）に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

## ②トンネル

トンネルの2巡目（2019～2020年度）の累積点検実施率は、国土交通省42%、高速道路会社52%、県2%、市町村11%です。

全管理者の判定区分割合は、I 0%、II 76%、III 24%、IV 0%です。

○2巡目（2019～2020年度）の点検実施率（トンネル）

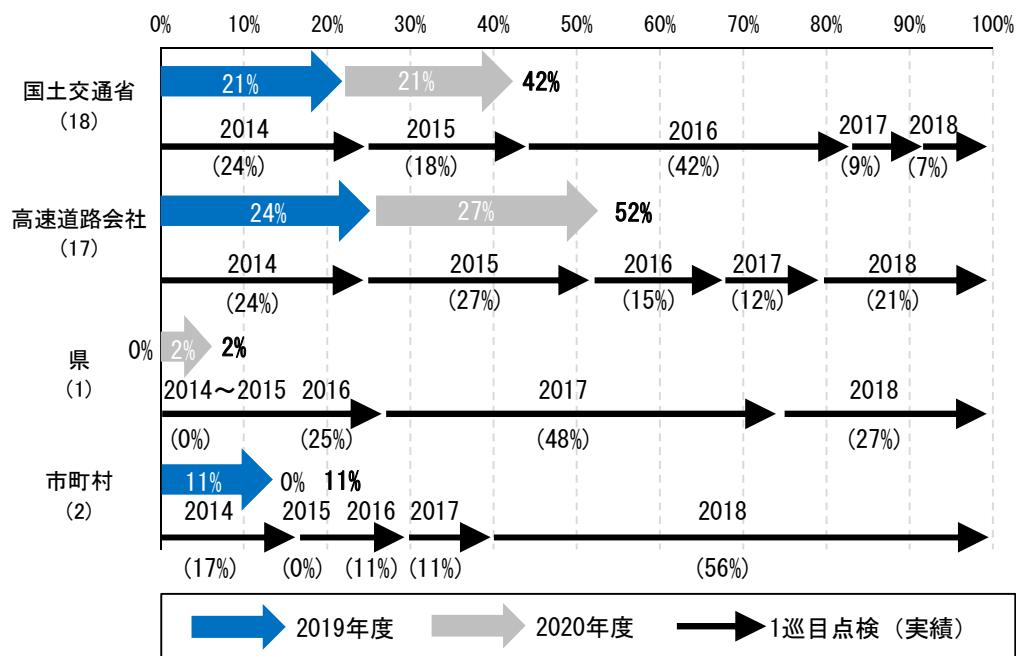


図3-7 2巡目（2019～2020年度）の点検実施率（トンネル）

※ () 内は、2019～2020年度に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

表3-5 2巡目（2019～2020年度）の点検実施率（トンネル）

管理者	管理施設数	うち点検対象施設数※1	点検実施数	点検実施率※2
国土交通省	46	43	18	42% (42%)
高速道路会社	40	33	17	52% (51%)
県	57	56	1	2% (0%)
市町村	18	18	2	11% (17%)
合計	161	150	38	25% (25%)

※1：2021年3月時点での施設数のうち、供用後5年以内などを除いた施設数の合計。

2021.3末時点

※2：点検対象施設数を分母とした点検実施数の割合。()内は、1巡目（2014～2015年度）における点検実施率。



図3-8 2巡目（2019～2020年度）の判定区分の割合（トンネル）

※()内は、2巡目（2019～2020年度）に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

表3-6 2巡目（2019～2020年度）の判定区分の割合（トンネル）

管理者	点検実施数	判定区分 上段：実数、下段：割合			
		I	II	III	IV
国土交通省	18	0	12	6	0
		0%	67%	33%	0%
高速道路会社	17	0	15	2	0
		0%	88%	12%	0%
県	1	0	0	1	0
		0%	0%	100%	0%
市町村	2	0	2	0	0
		0%	100%	0%	0%
合計	38	0	29	9	0
		0%	76%	24%	0%

2021.3末時点

【参考】1巡目（2014～2018年度）の判定区分の割合（トンネル）

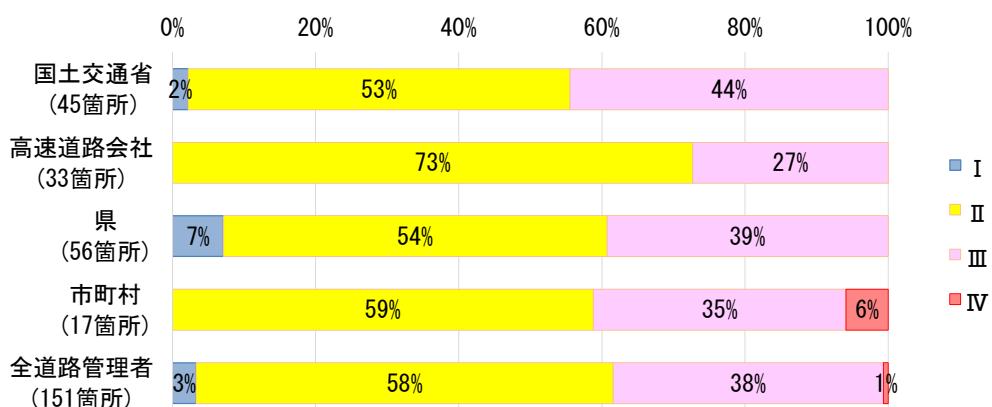


図3-9 1巡目（2014～2018年度）の判定区分の割合（トンネル）

※2019年3月時点での集計値

※()内は、1巡目（2014～2018年度）に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

### ③道路附属物等

道路附属物等の2巡目（2019～2020年度）の点検実施率は、国土交通省 20%、高速道路会社 58%、県 10%、市町村 36%です。

全管理者の判定区分割合は、I 48%、II 42%、III 10%、IV 0%です。

○2巡目（2019～2020年度）の点検実施率（道路附属物等）

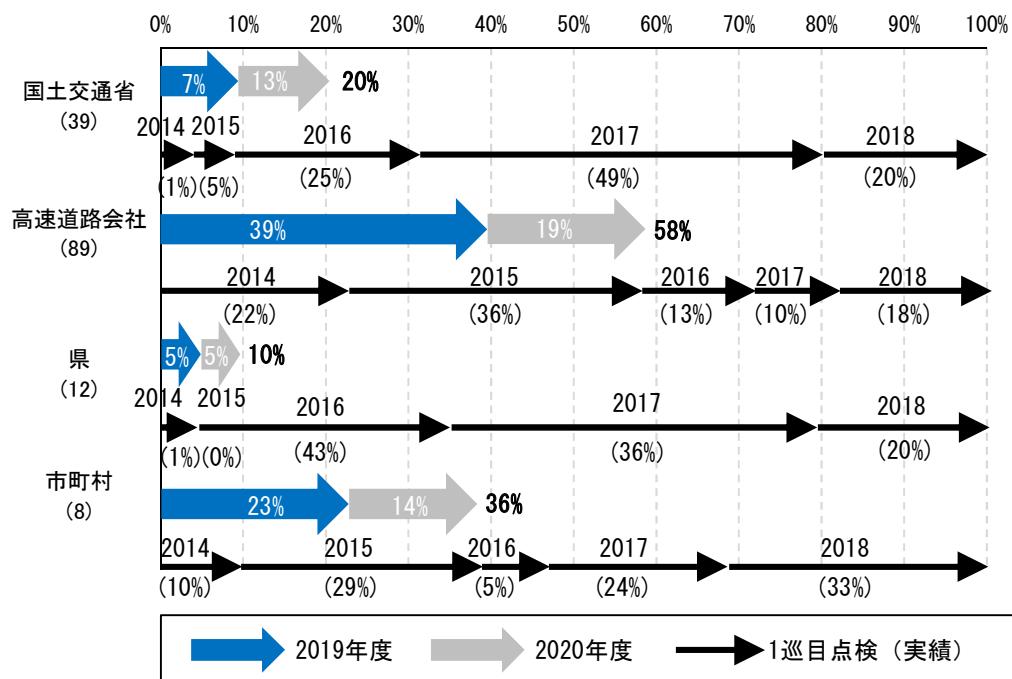


図3-10 2巡目（2019～2020年度）の点検実施率（道路附属物等）

※()内は、2019～2020年度に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

表3-7 2巡目（2019～2020年度）の点検実施率（道路附属物等）

管理者	管理施設数	うち点検対象施設数※1	点検実施数	点検実施率※2
国土交通省	219	196	39	20% ( 6%)
高速道路会社	172	153	89	58% (58%)
県	126	125	12	10% ( 1%)
市町村	22	22	8	36% (39%)
合計	539	496	148	30% (23%)

※1：2021年3月時点での施設数のうち、供用後5年以内などを除いた施設数の合計。

2021.3末時点

※2：点検対象施設数を分母とした点検実施数の割合。()内は、1巡目（2014～2015年度）における点検実施率。



図3－11 2巡目（2019～2020年度）の判定区分の割合（道路附属物等）

※()内は、2巡目（2019～2020年度）に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

表3－8 2巡目（2019～2020年度）の判定区分の割合（道路附属物等）

管理者	点検実施数	判定区分 上段：実数、下段：割合			
		I	II	III	IV
国土交通省	39	16	16	7	0
		41%	41%	18%	0%
高速道路会社	89	54	34	1	0
		61%	38%	1%	0%
県	12	0	5	7	0
		0%	42%	58%	0%
市町村	8	1	7	0	0
		13%	88%	0%	0%
合計	148	71	62	15	0
		48%	42%	10%	0%

2021.3末時点

【参考】1巡目（2014～2018年度）の判定区分の割合（道路附属物等）

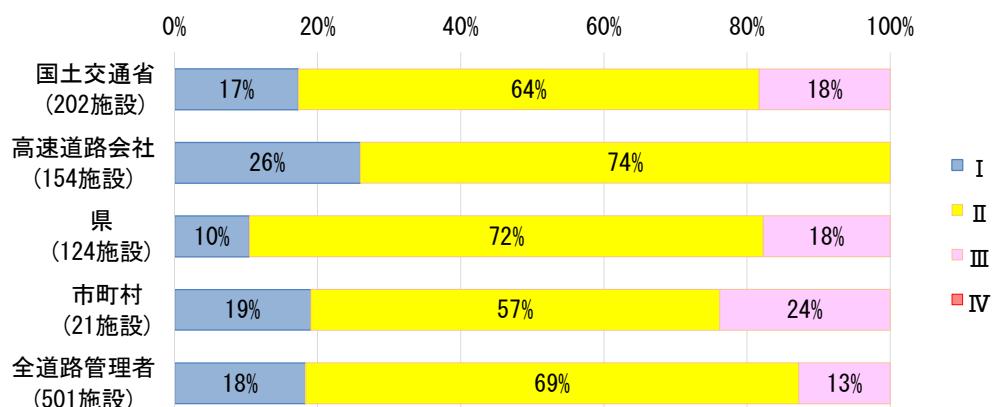


図3－12 1巡目（2014～2018年度）の判定区分の割合（道路附属物等）

※2019年3月時点での集計値

※()内は、1巡目（2014～2018年度）に点検を実施した施設数の合計。


※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

### (3) 2019～2020年度点検実施施設における判定区分の遷移状況

#### ①橋梁

1巡目の2014年度及び2015年度の点検で健全又は予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態（判定区分I・II）に診断された施設のうち、修繕等の措置を講じないまま、5年後の2019年度及び2020年度の点検において、早期又は緊急に措置を講すべき状態（判定区分III・IV）へ遷移した割合は、全道路管理者で7%です。

橋梁では、判定区分I・IIから判定区分III・IVに遷移した割合と建設年数の間に明らかな関係性は見られません。

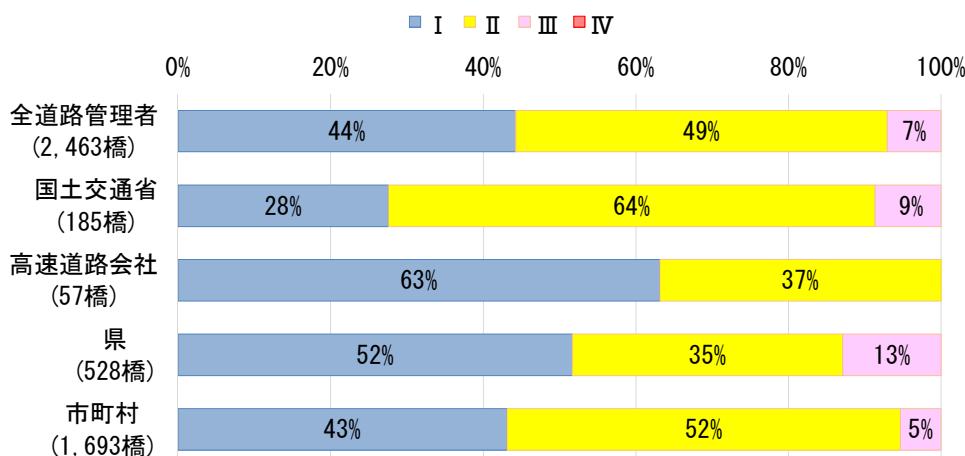

※()内は、1巡目（2014年度及び2015年度）の結果が判定区分IまたはIIとなった橋梁数の内、修繕等の措置を講じないまま5年後の2019年度及び2020年度に点検を実施した橋梁の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

図3－13 管理者別の判定区分の遷移状況

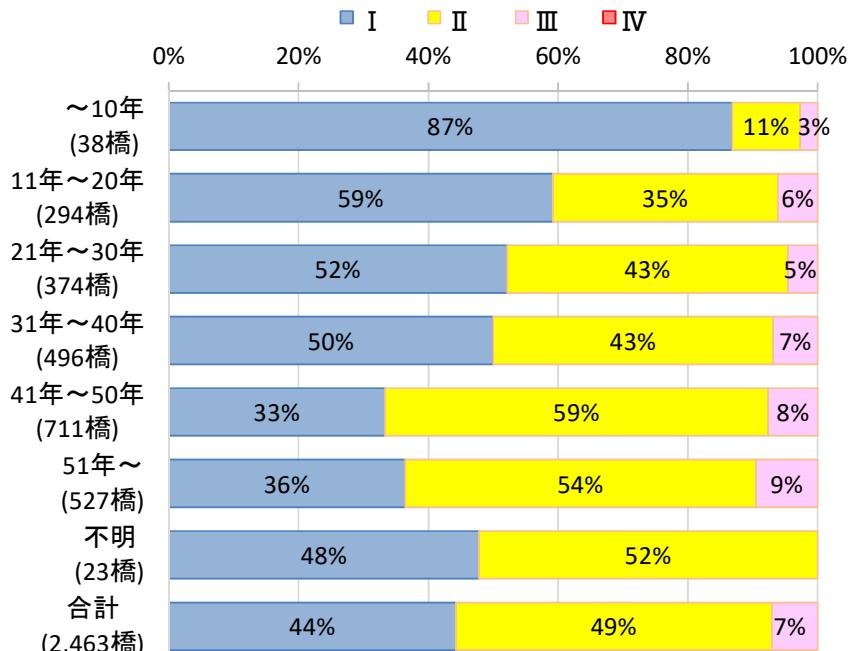


図3－14 建設年数別の遷移状況（全道路管理者）

## ②トンネル

1巡目の2014年度及び2015年度の点検で健全又は予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態（判定区分I・II）に診断された施設のうち、修繕等の措置を講じないまま、5年後の2019年度及び2020年度の点検において、早期又は緊急に措置を講すべき状態（判定区分III・IV）へ遷移した割合は、全道路管理者で10%です。

建設年数が51年以上となるトンネルでは、判定区分I・IIから判定区分III・IVに遷移した割合が高くなっています。

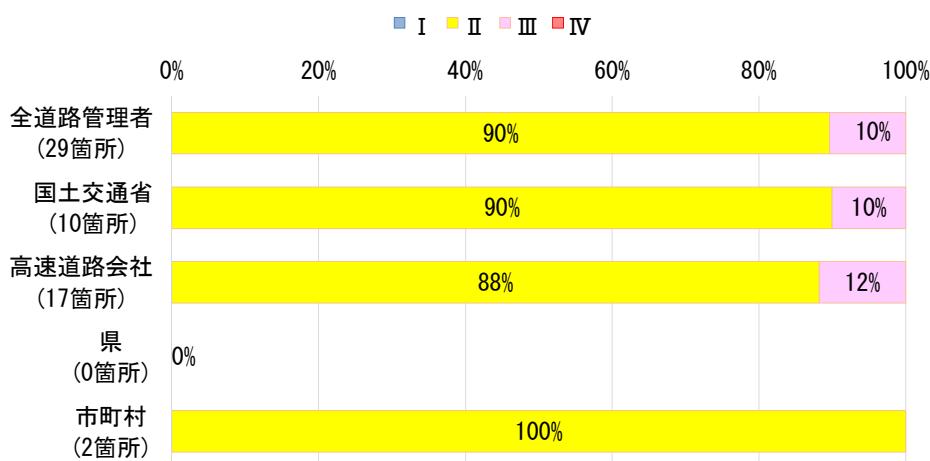


図3-15 管理者別の判定区分の遷移状況

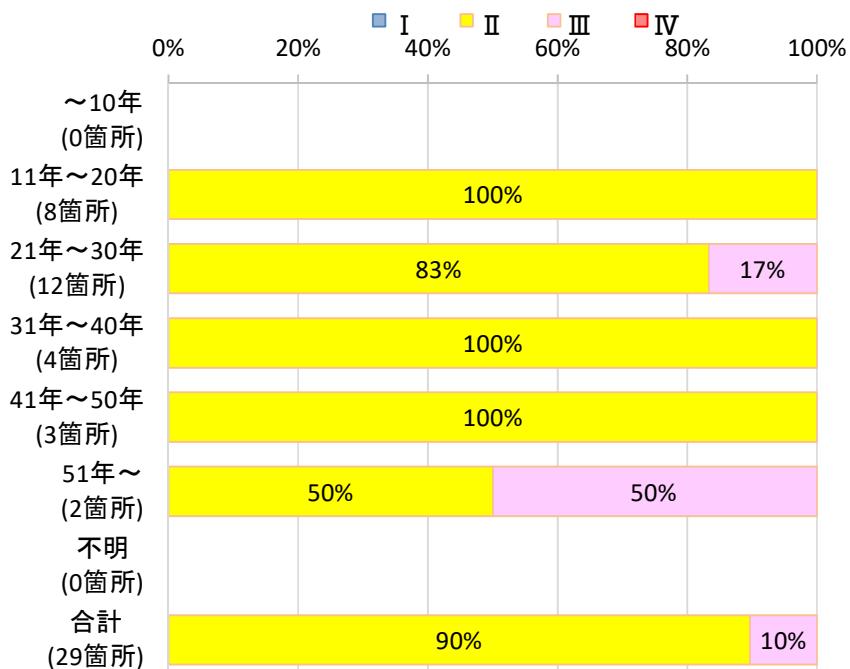


図3-16 建設年数別の遷移状況(全道路管理者)

### ③道路附属物等

1巡目の2014年度及び2015年度の点検で健全又は予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態（判定区分I・II）に診断された施設のうち、修繕等の措置を講じないまま、5年後の2019年度及び2020年度の点検において、早期又は緊急に措置を講すべき状態（判定区分III・IV）へ遷移した割合は、全道路管理者で2%です。

道路附属物等では、判定区分I・IIから判定区分III・IVに遷移した割合と建設年数の間に明らかな関係性は見られません。

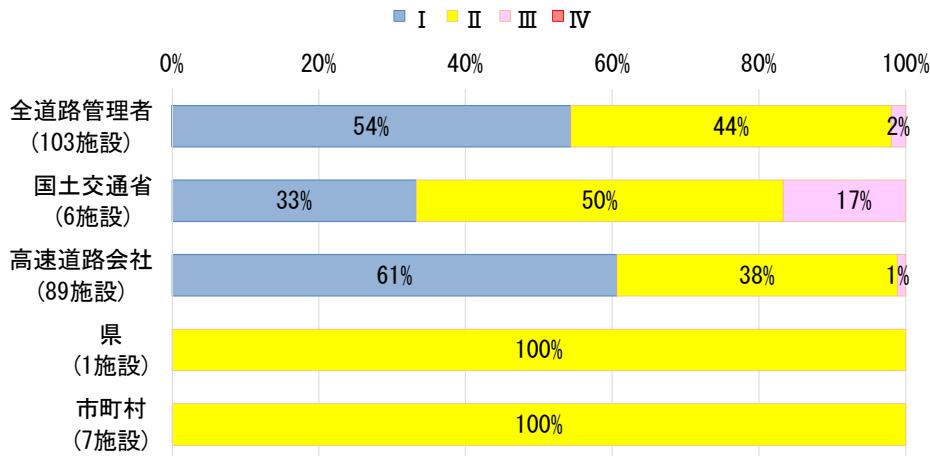


図3-17 管理者別の判定区分の遷移状況

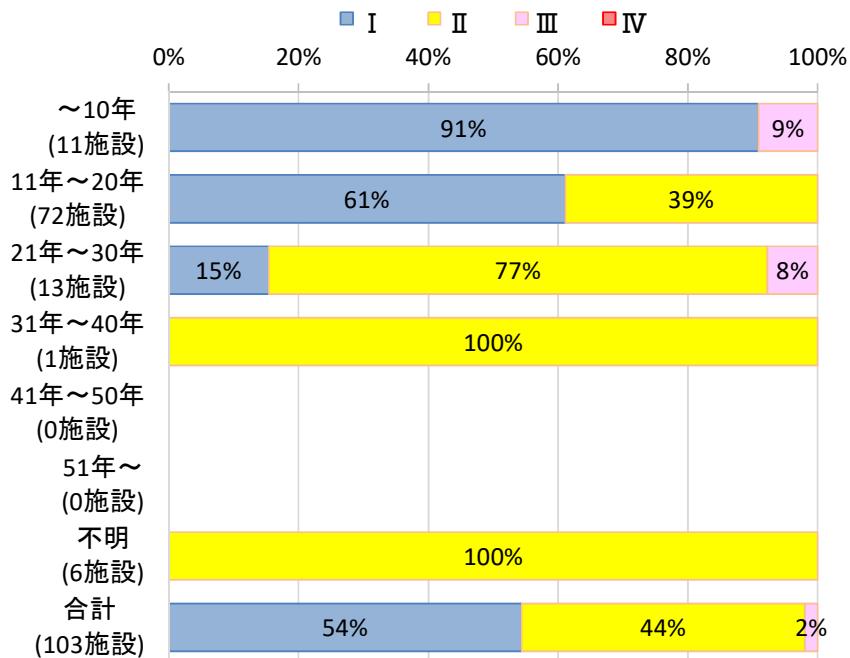


図3-18 建設年数別の遷移状況（全道路管理者）

#### (4) 直近 5 年間（2016～2020 年度）の点検結果（全道路管理者）

直近 5 年間（2016～2020 年度）の点検における 2020 年度末時点での判定区分の割合は、橋梁：I 50%、II 40%、III 10%、IV 0.1%、トンネル：I 3%、II 57%、III 39%、IV 1%、道路附属物等：I 24%、II 64%、III 12%、IV 0%です。

※道路附属物等の内訳は巻末資料（1）を参照。

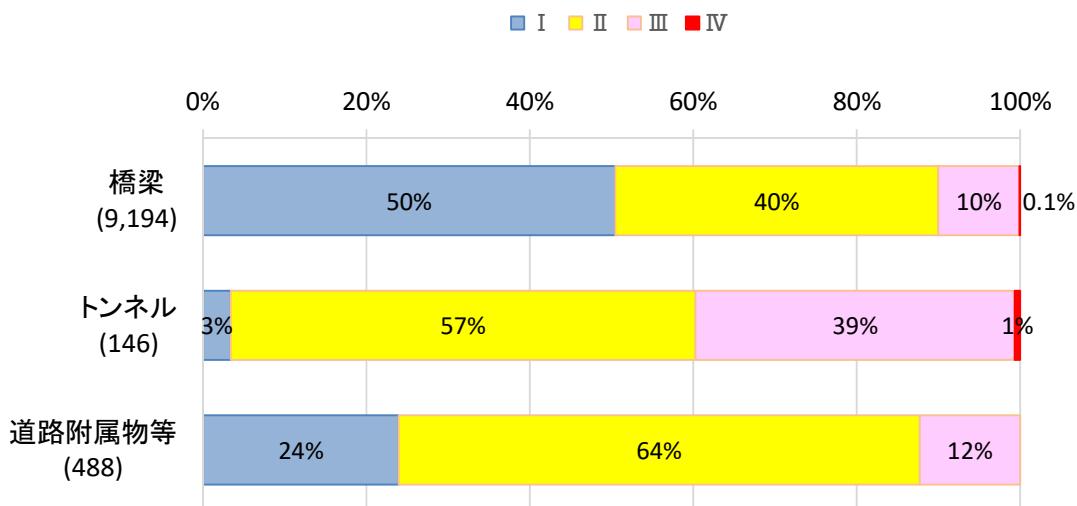


図3－19 直近5年間（2016～2020年度）の判定区分の割合（全道路管理者合計）

※（）内は、2021年3月末時点の施設数のうち、2016～2020年度に点検を実施した施設数の合計。

※点検を実施した施設のうち、2021年3月末時点で診断中の施設を除く。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

## ①橋梁

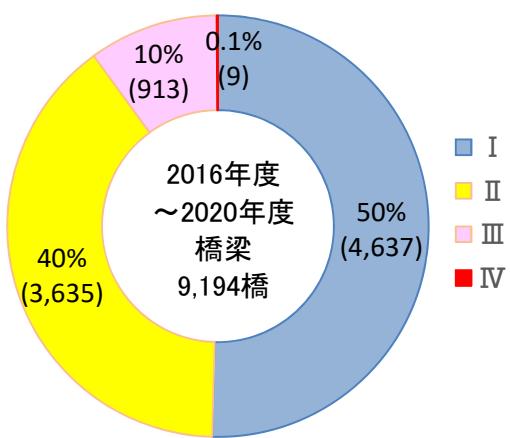


図3－20 直近5年間（2016～2020年度）の判定区分の割合

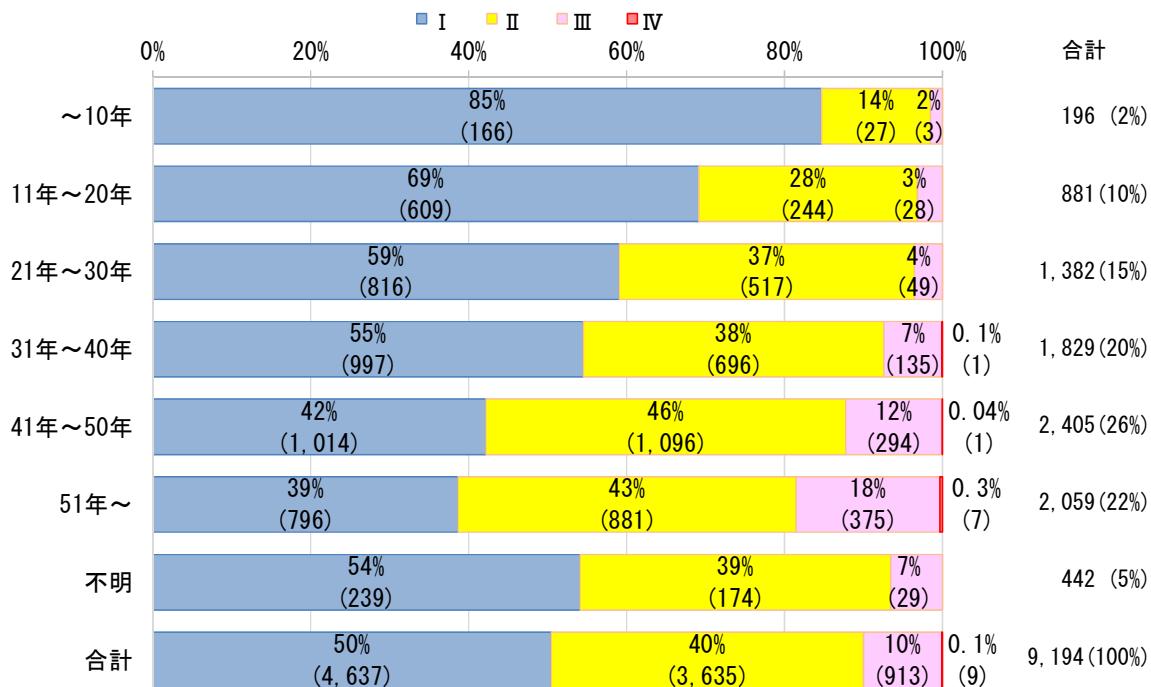


図3－21 直近5年間（2016～2020年度）の判定区分と建設後経過年数

## ②トンネル

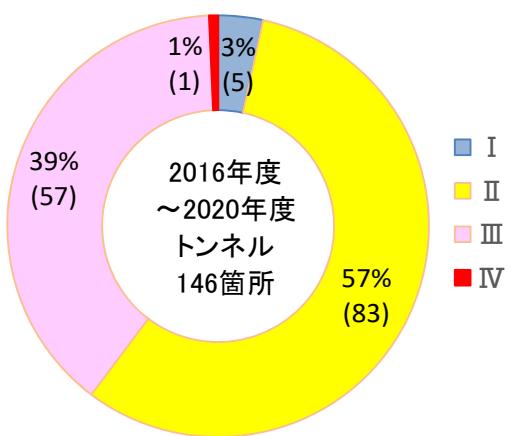


図3－22 直近5年間（2016～2020年度）の判定区分の割合

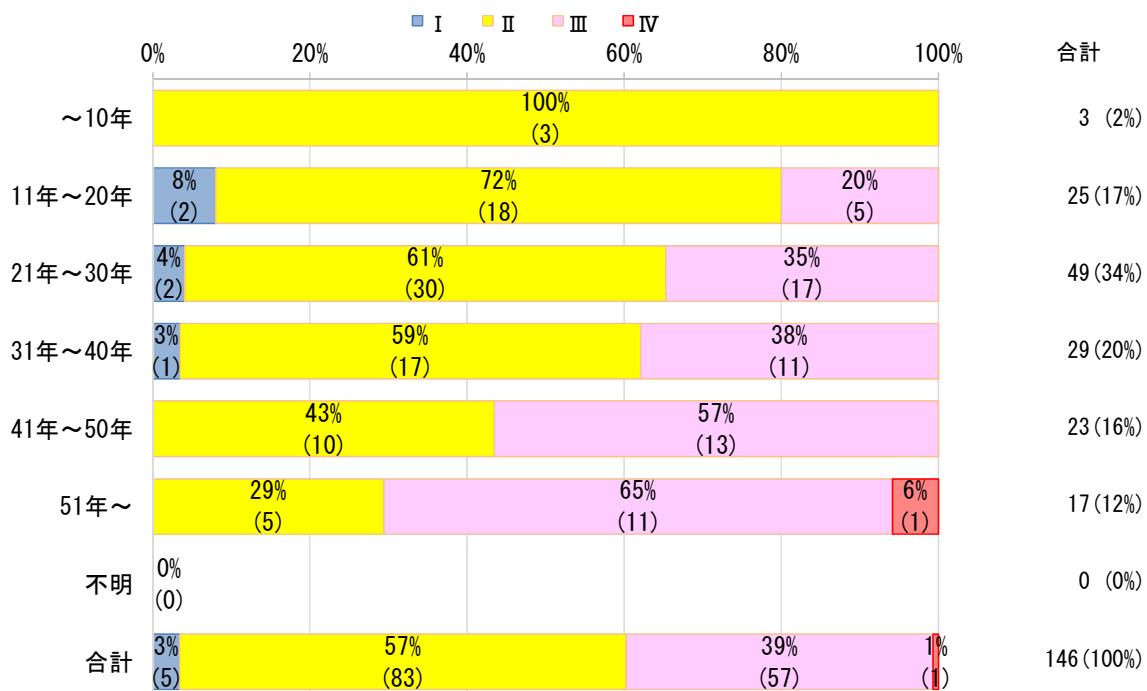


図3－23 直近5年間（2016～2020年度）の判定区分と建設後経過年数

### ③道路附属物等

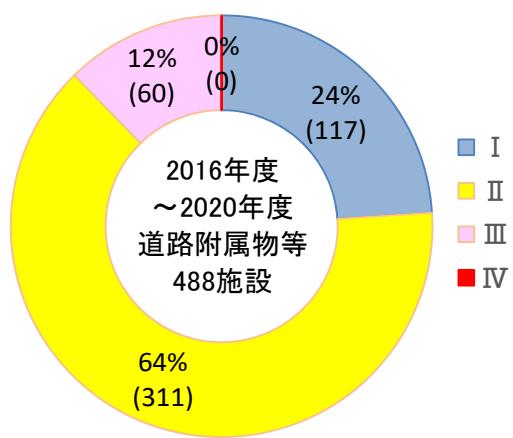


図3－24 直近5年間（2016～2020年度）の判定区分の割合

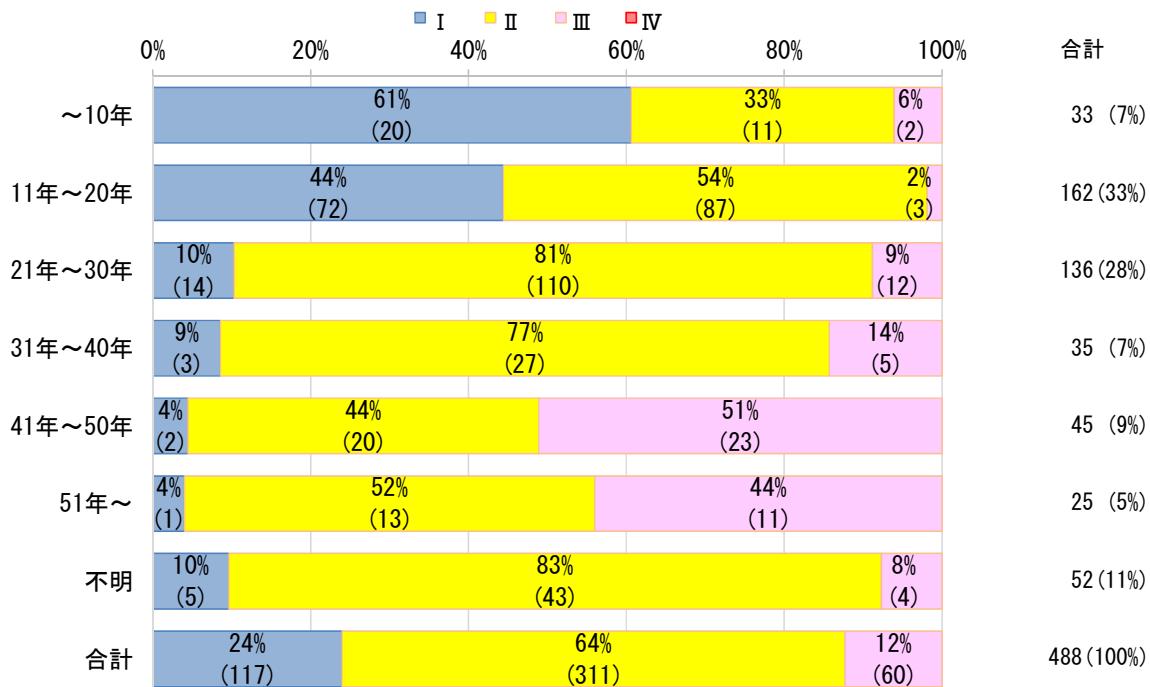


図3－25 直近5年間（2016～2020年度）の判定区分と建設後経過年数

## (5) 直近 5 年間（2016～2020 年度）の点検結果（管理者別）

### ①橋梁

橋梁の直近 5 年間（2016～2020 年度）の点検における 2020 年度末時点での判定区分の割合は、全道路管理者で、I 50%、II 40%、III 10%、IV 0.1%です。

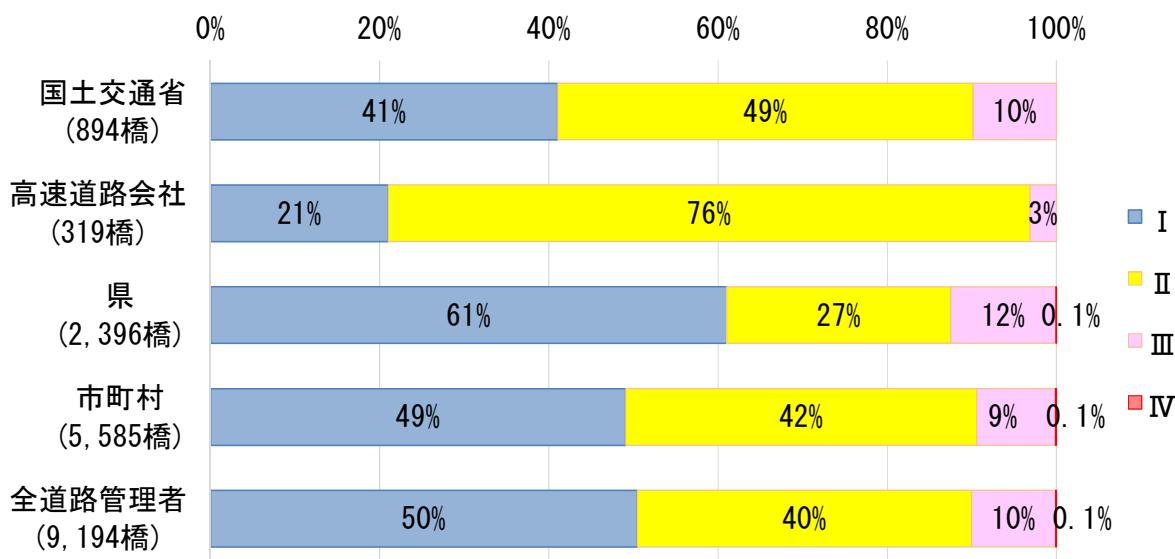


図3－26 直近5年間（2016～2020年度）の判定区分の割合（橋梁）

※()内は、直近5年間（2016～2020年度）に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

表3－9 直近5年間（2016～2020年度）の判定区分の割合（橋梁）

管理者	点検実施数	判定区分			
		上段：実数、下段：割合			
		I	II	III	IV
国土交通省	894	367	439	88	0
		41%	49%	10%	0%
高速道路会社	319	67	242	10	0
		21%	76%	3%	0%
県	2,396	1,462	635	297	2
		61%	27%	12%	0.1%
市町村	5,585	2,741	2,319	518	7
		49%	42%	9%	0.1%
合計	9,194	4,637	3,635	913	9
		50%	40%	10%	0.1%

2021.3末時点

## ②トンネル

トンネルの直近5年間（2016～2020年度）の点検における2020年度末時点での判定区分の割合は、全道路管理者で、I 3%、II 57%、III 39%、IV 1%です。

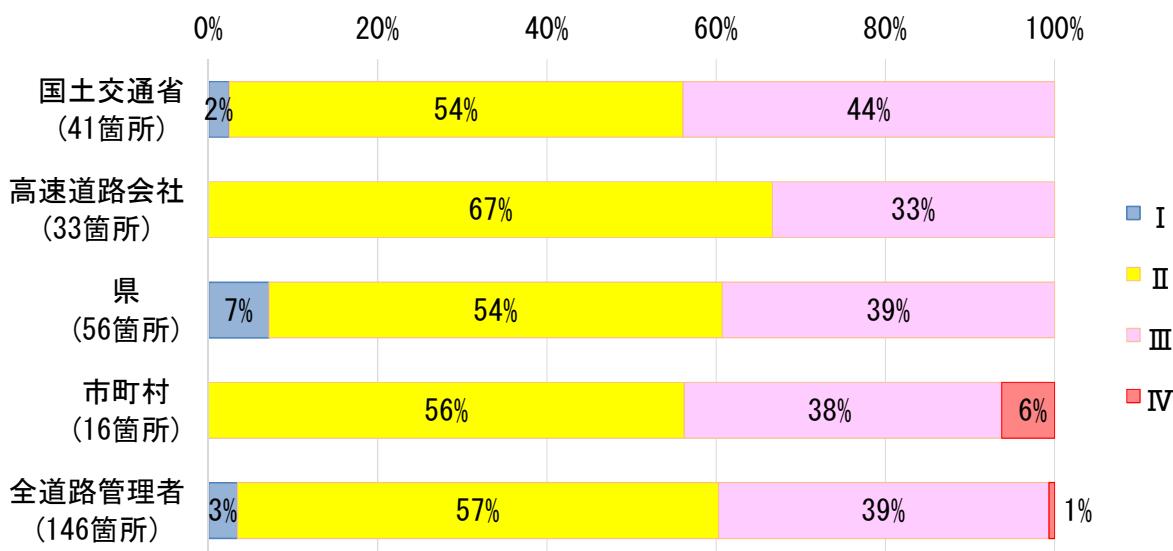


図3－27 直近5年間（2016～2020年度）の判定区分の割合（トンネル）

※()内は、直近5年間（2016～2020年度）に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

表3－10 直近5年間（2016～2020年度）の判定区分の割合（トンネル）

管理者	点検実施数	判定区分 上段：実数、下段：割合				
		I	II	III	IV	
国土交通省	41	1	22	18	0	
		2%	54%	44%	0%	
高速道路会社	33	0	22	11	0	
		0%	67%	33%	0%	
県	56	4	30	22	0	
		7%	54%	39%	0%	
市町村	16	0	9	6	1	
		0%	56%	38%	6%	
合計		5	83	57	1	
		3%	57%	39%	1%	

2021.3末時点

### ③道路附属物等

道路附属物等の直近 5 年間（2016～2020 年度）の点検における 2020 年度末時点での判定区分の割合は、全道路管理者で、I 24%、II 64%、III 12%、IV 0%です。

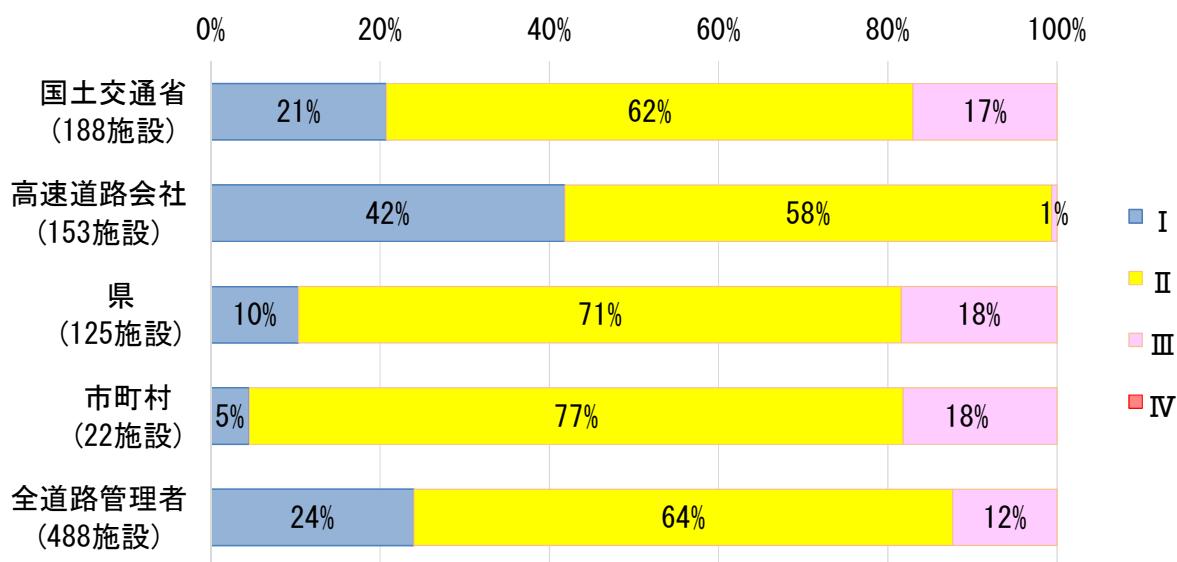


図3－28 直近5年間（2016～2020年度）の判定区分の割合（道路附属物等）

※ () 内は、直近5年間（2016～2020年度）に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

表3－11 直近5年間（2016～2020年度）の判定区分の割合（道路附属物等）

管理者	点検実施数	判定区分			
		I	II	III	IV
国土交通省	188	39	117	32	0
		21%	62%	17%	0%
高速道路会社	153	64	88	1	0
		42%	58%	1%	0%
県	125	13	89	23	0
		10%	71%	18%	0%
市町村	22	1	17	4	0
		5%	77%	18%	0%
合計	488	117	311	60	0
		24%	64%	12%	0%

2021.3 末時点

## 4 判定区分III、IVの施設の修繕等措置の実施状況

### (1) 1巡目点検施設における修繕等措置の実施状況

各施設の修繕等措置については、定期点検の判定区分に応じて対策等を行います。

#### ○判定区分IV

「構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講すべき状態」と診断された施設は、損傷発見後、緊急に措置を講ずることとしています。

#### ○判定区分III

「構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講すべき状態」と診断された施設は、次回点検まで（5年以内）に措置を講ずることとしています。

#### 1) 判定区分III・IVの修繕等措置の実施状況（2020年度末時点）

1巡目点検で判定区分III、IVと診断された施設の措置着手率（2020年度末時点）は、橋梁74%、トンネル80%、道路附属物等89%となっています。

表4－1 判定区分III、IVの修繕等措置の実施状況（全道路管理者）

	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に着工済の施設数 C (C/A)	措置完了済の施設数 D (D/A)
橋梁	850	630 (74%)	460 (54%)	411 (48%)
トンネル	56	45 (80%)	42 (75%)	39 (70%)
道路附属物等	61	54 (89%)	30 (49%)	25 (41%)

2021.3末時点

判定区分III、IVの修繕等措置  
(2014～2018)

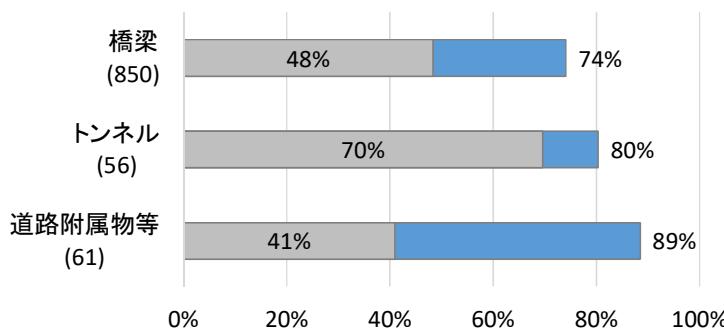


図4－1 判定区分III、IVの修繕等措置（2014年度～2018年度）

措置着手率  
措置完了率

:措置(設計を含む)に着手した割合(B/A)  
:措置が完了した割合(D/A)


2021.3末時点

## ①橋梁

1巡目（2014～2018年度）の点検で判定区分Ⅲ又はⅣと診断された橋梁の修繕等の措置に着手した割合は、2020年度末時点で国土交通省100%、高速道路会社88%、地方公共団体71%です。

措置の完了率は、国土交通省55%、高速道路会社0%、地方公共団体48%です。

表4-2 橋梁の判定区分Ⅲ・Ⅳの修繕等措置の実施状況

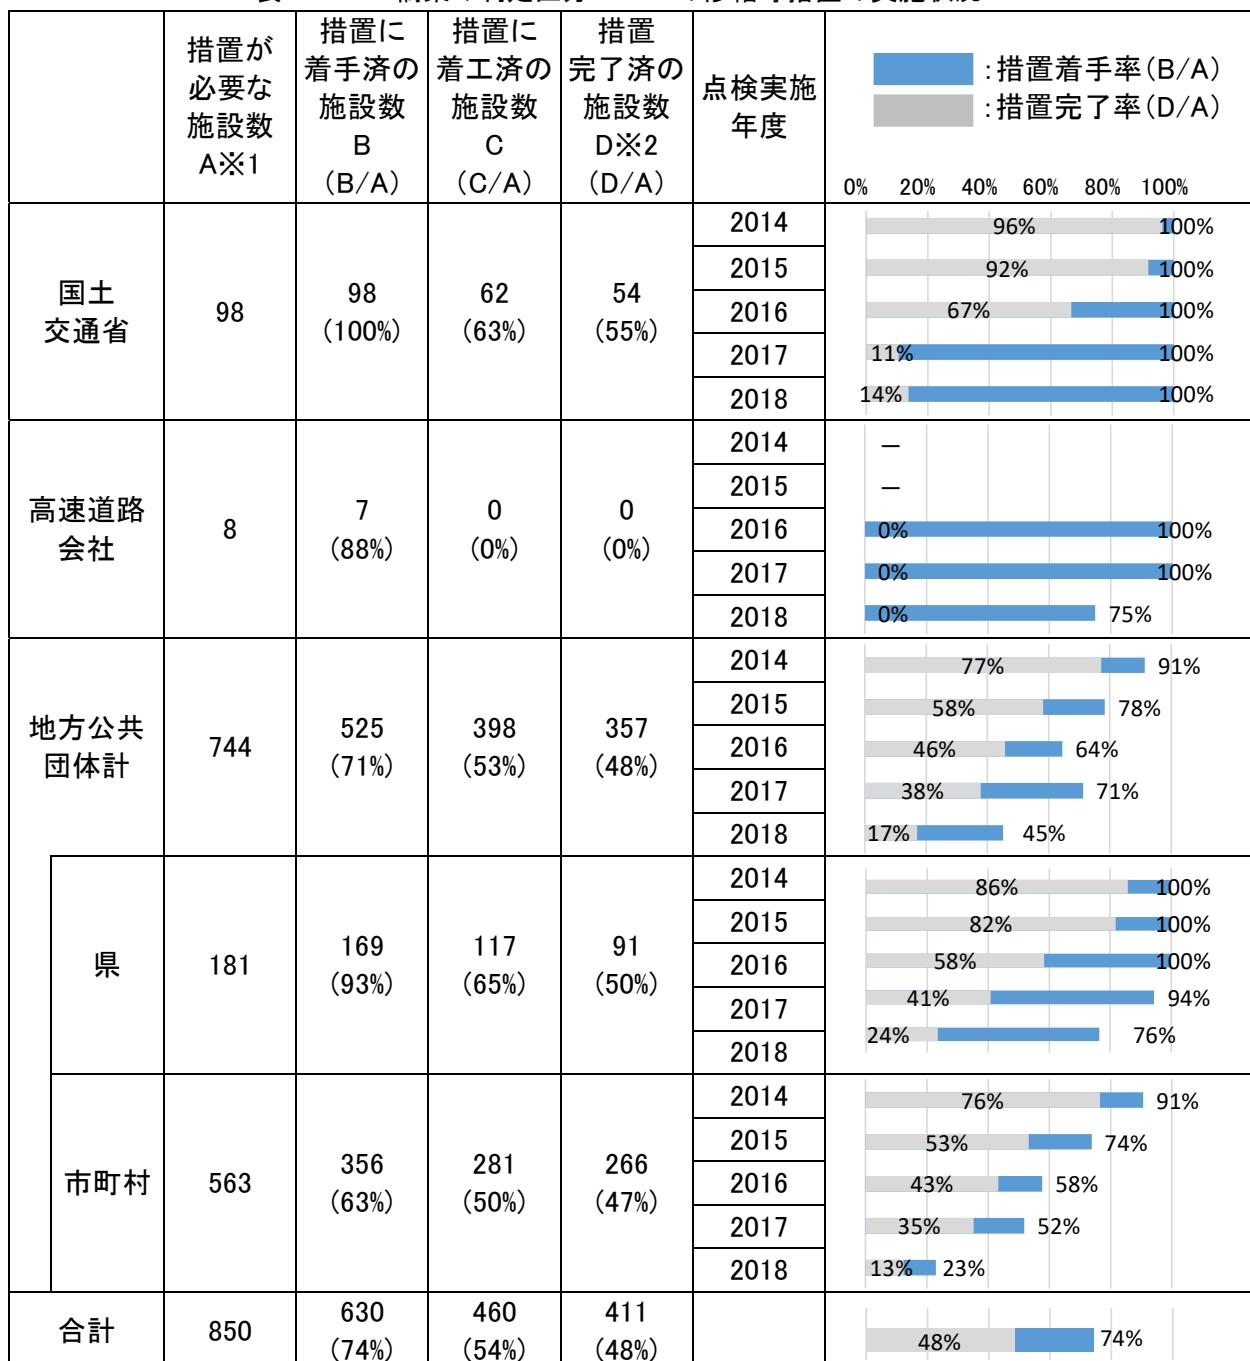

**措置着手率** :措置(設計を含む)に着手した割合(B/A)

2021.3末時点

**措置完了率** :措置が完了した割合(D/A)

\*修繕等措置には、補修や補強などの施設の機能や耐久性等を維持又は回復するための「対策」のほか、「撤去」、定期的あるいは常時の「監視」、緊急に措置を講じることができない場合などの対応としての「通行規制・通行止」があるが、実施状況の集計からは「監視」は除く。

\*1:1巡目点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設のうち、点検対象外となった施設を除く施設数。


\*2:2巡目点検で再度Ⅲ、Ⅳと診断された施設でも、1巡目点検に対する措置が完了した施設は含む。

## ②トンネル

1巡目（2014～2018年度）の点検で判定区分Ⅲ又はⅣと診断されたトンネルの修繕等の措置に着手した割合は、2020年度末時点では国土交通省100%、高速道路会社22%、地方公共団体86%です。

措置の完了率は、国土交通省84%、高速道路会社11%、地方公共団体79%です。

表4-3 トンネルの判定区分Ⅲ・Ⅳの修繕等措置の実施状況

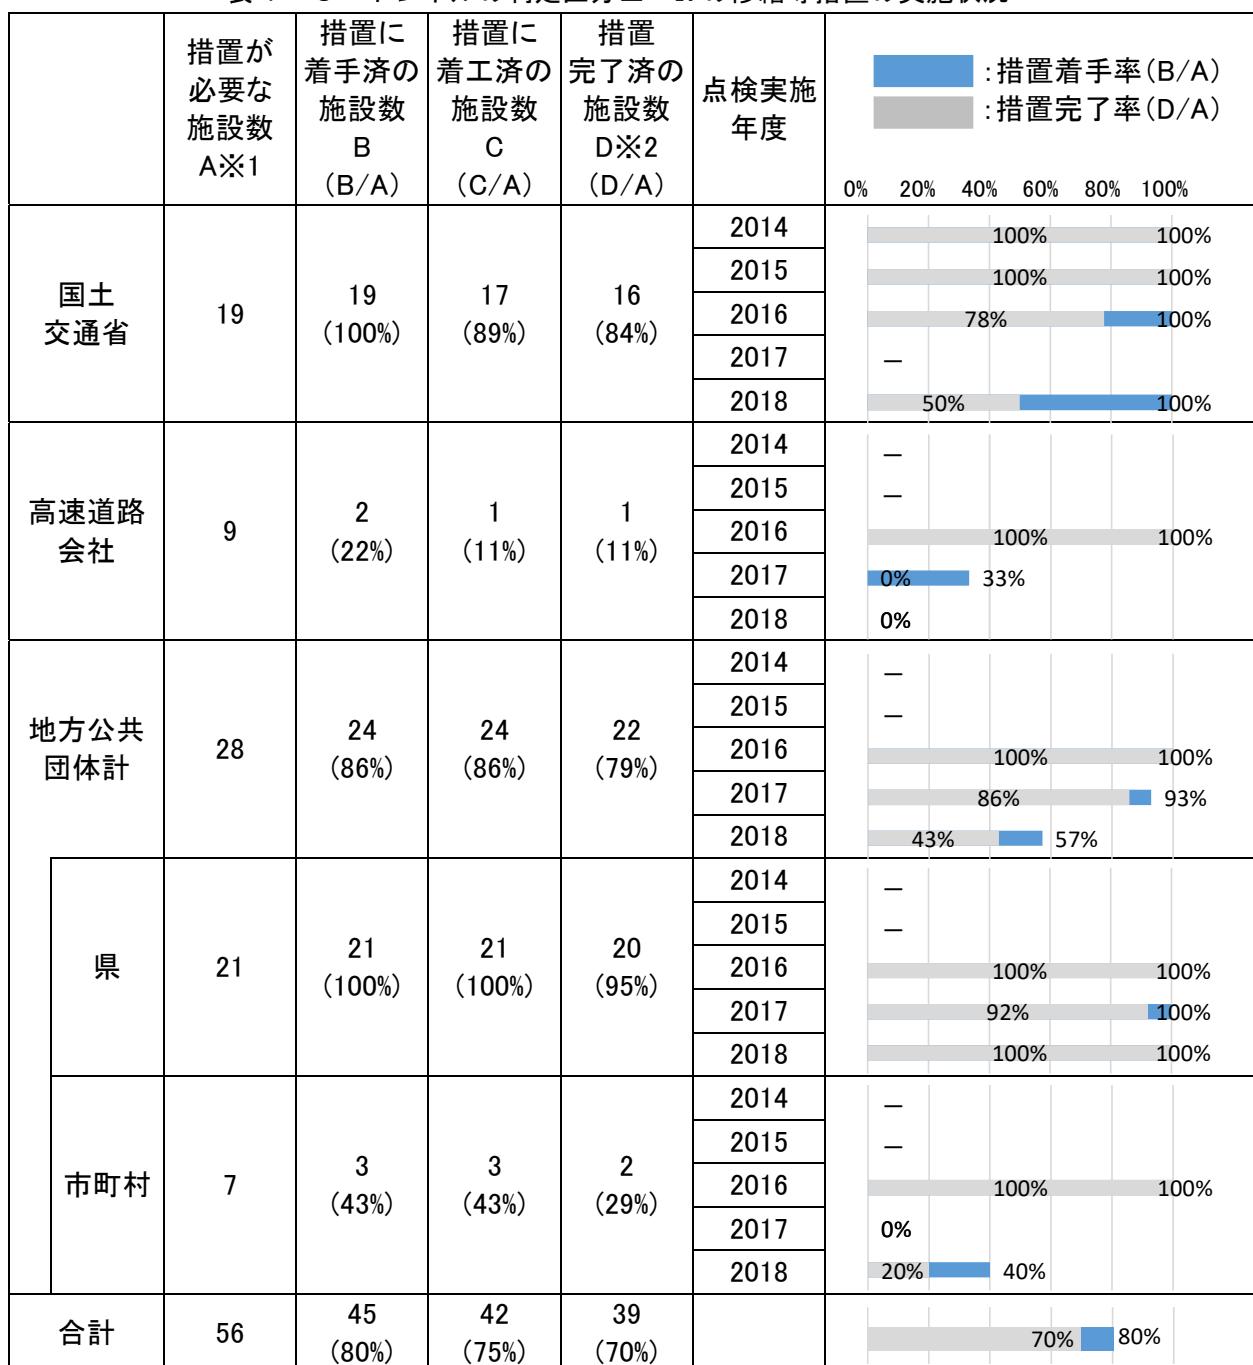

**措置着手率**

:措置(設計を含む)に着手した割合(B/A)

2021.3末時点

**措置完了率**

:措置が完了した割合(D/A)

※修繕等措置には、補修や補強などの施設の機能や耐久性等を維持又は回復するための「対策」のほか、「撤去」、定期的あるいは常時の「監視」、緊急に措置を講じることができない場合などの対応としての「通行規制・通行止」があるが、実施状況の集計からは「監視」は除く。

※1:1巡目点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設のうち、点検対象外となった施設を除く施設数。


※2:2巡目点検で再度Ⅲ、Ⅳと診断された施設でも、1巡目点検に対する措置が完了した施設は含む。

### ③道路附属物等

1巡目（2014～2018年度）の点検で判定区分Ⅲ又はⅣと診断された道路附属物等の修繕等の措置に着手した割合は、2020年度末時点で国土交通省91%、地方公共団体86%です。

措置の完了率は、国土交通省45%、地方公共団体36%です。

表4-4 道路附属物等の判定区分Ⅲ・Ⅳの修繕等措置の実施状況

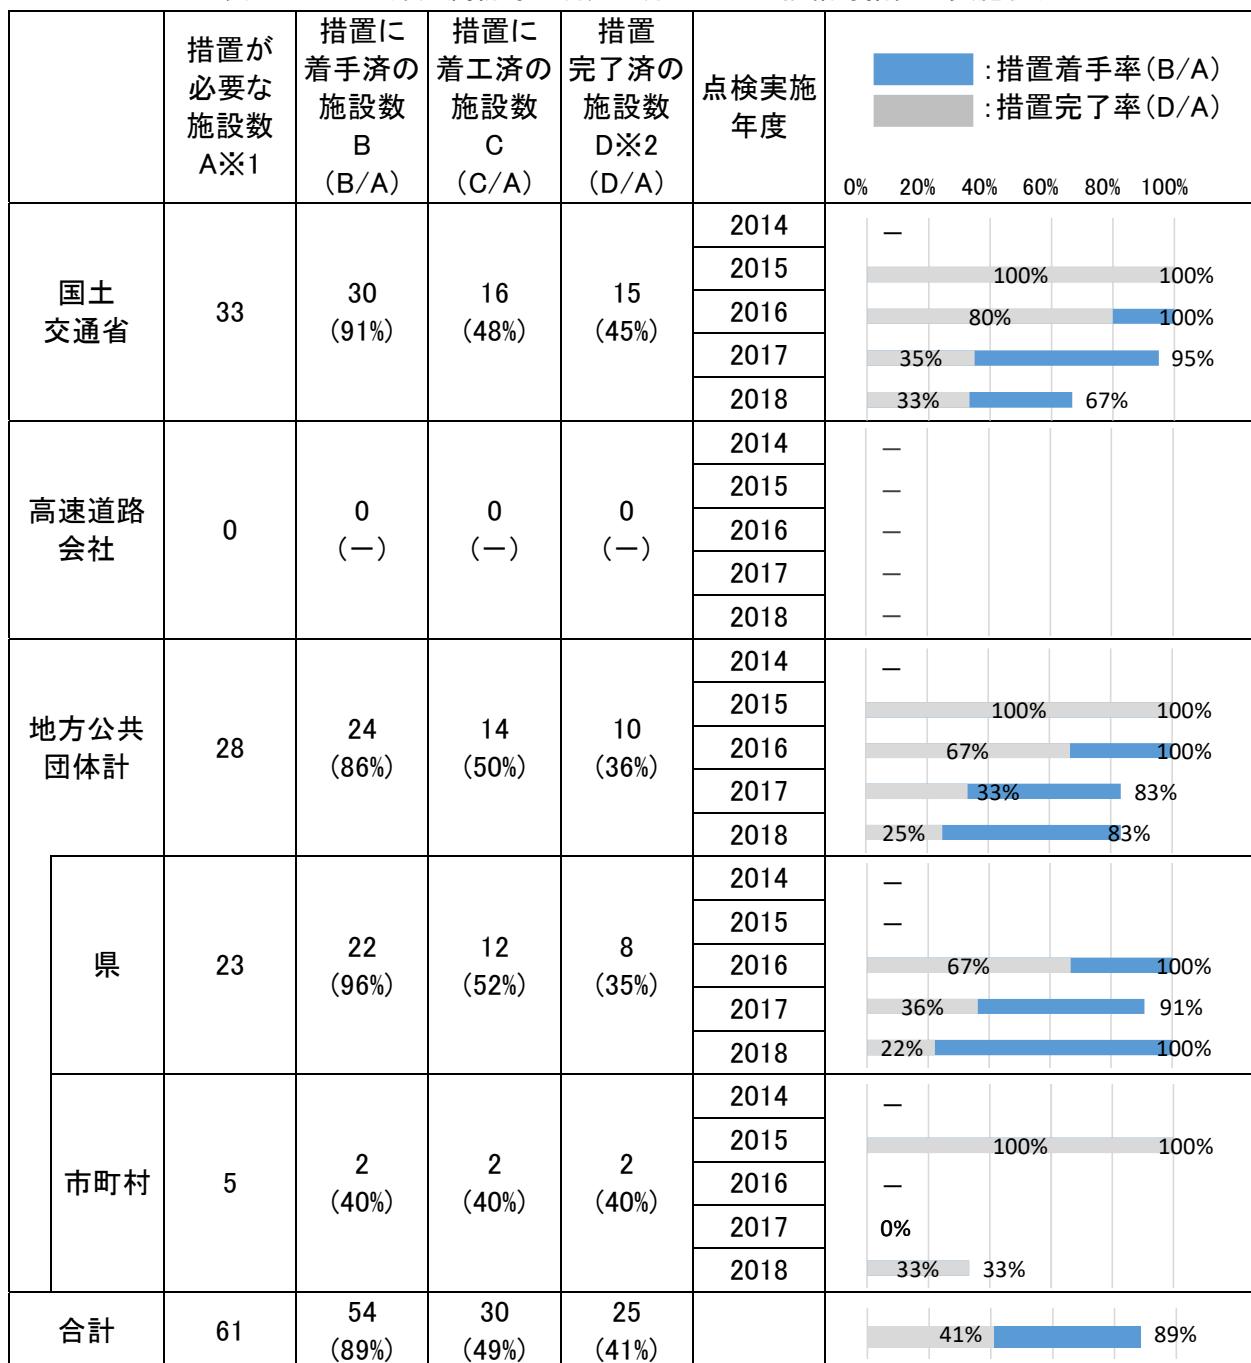

**措置着手率** : 措置(設計を含む)に着手した割合(B/A)

2021.3末時点

**措置完了率** : 措置が完了した割合(D/A)

※修繕等措置には、補修や補強などの施設の機能や耐久性等を維持又は回復するための「対策」のほか、「撤去」、定期的あるいは常時の「監視」、緊急に措置を講じることができない場合などの対応としての「通行規制・通行止」があるが、実施状況の集計からは「監視」は除く。

※1: 1巡目点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設のうち、点検対象外となった施設を除く施設数。

※2: 2巡目点検で再度Ⅲ、Ⅳと診断された施設でも、1巡目点検に対する措置が完了した施設は含む。


## (2) 直近5年間の点検施設における修繕等措置の実施状況

### ①橋梁

直近5年間(2016~2020年度)の点検で早期に措置を講ずるべき状態(判定区分III)又は緊急に措置を講ずるべき状態(判定区分IV)と診断された橋梁の修繕等の措置に着手した割合は、2020年度末時点で国土交通省86%、高速道路会社90%、地方公共団体46%です。

措置の完了率は、国土交通省19%、高速道路会社0%、地方公共団体22%です。

表4-5 橋梁の判定区分III・IVの修繕等措置の実施状況

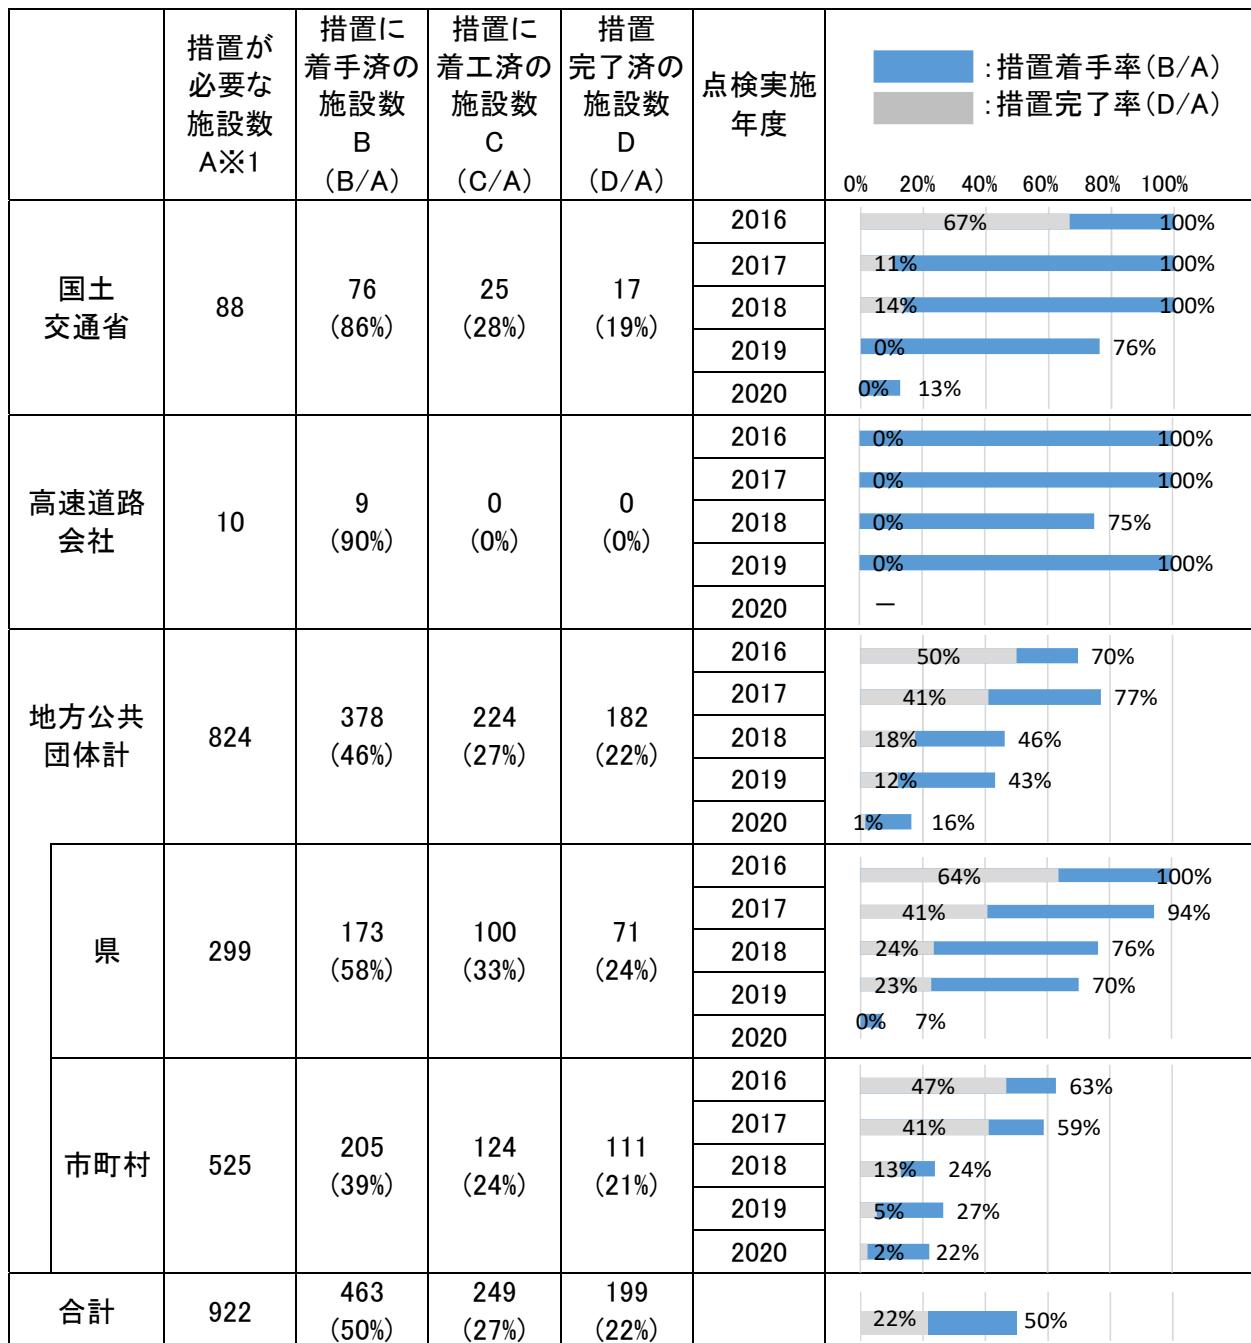

**措置着手率** :措置(設計を含む)に着手した割合(B/A)

**措置完了率** :措置が完了した割合(D/A)

2021.3末時点

※修繕等措置には、補修や補強などの施設の機能や耐久性等を維持又は回復するための「対策」のほか、「撤去」、定期的あるいは常時の「監視」、緊急に措置を講じることができない場合などの対応としての「通行規制・通行止」があるが、実施状況の集計からは「監視」は除く。


※1:直近5年間(2016~2020年度)の点検における判定区分III、IVの施設数のうち、点検対象外等となった施設を除く施設数。

## ②トンネル

直近5年間（2016～2020年度）の点検で早期に措置を講ずるべき状態（判定区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき状態（判定区分Ⅳ）と診断されたトンネルの修繕等の措置に着手した割合は、2020年度末時点で国土交通省71%、高速道路会社18%、地方公共団体86%です。

措置の完了率は、国土交通省47%、高速道路会社9%、地方公共団体79%です。

表4-6 トンネルの判定区分Ⅲ・Ⅳの修繕等措置の実施状況

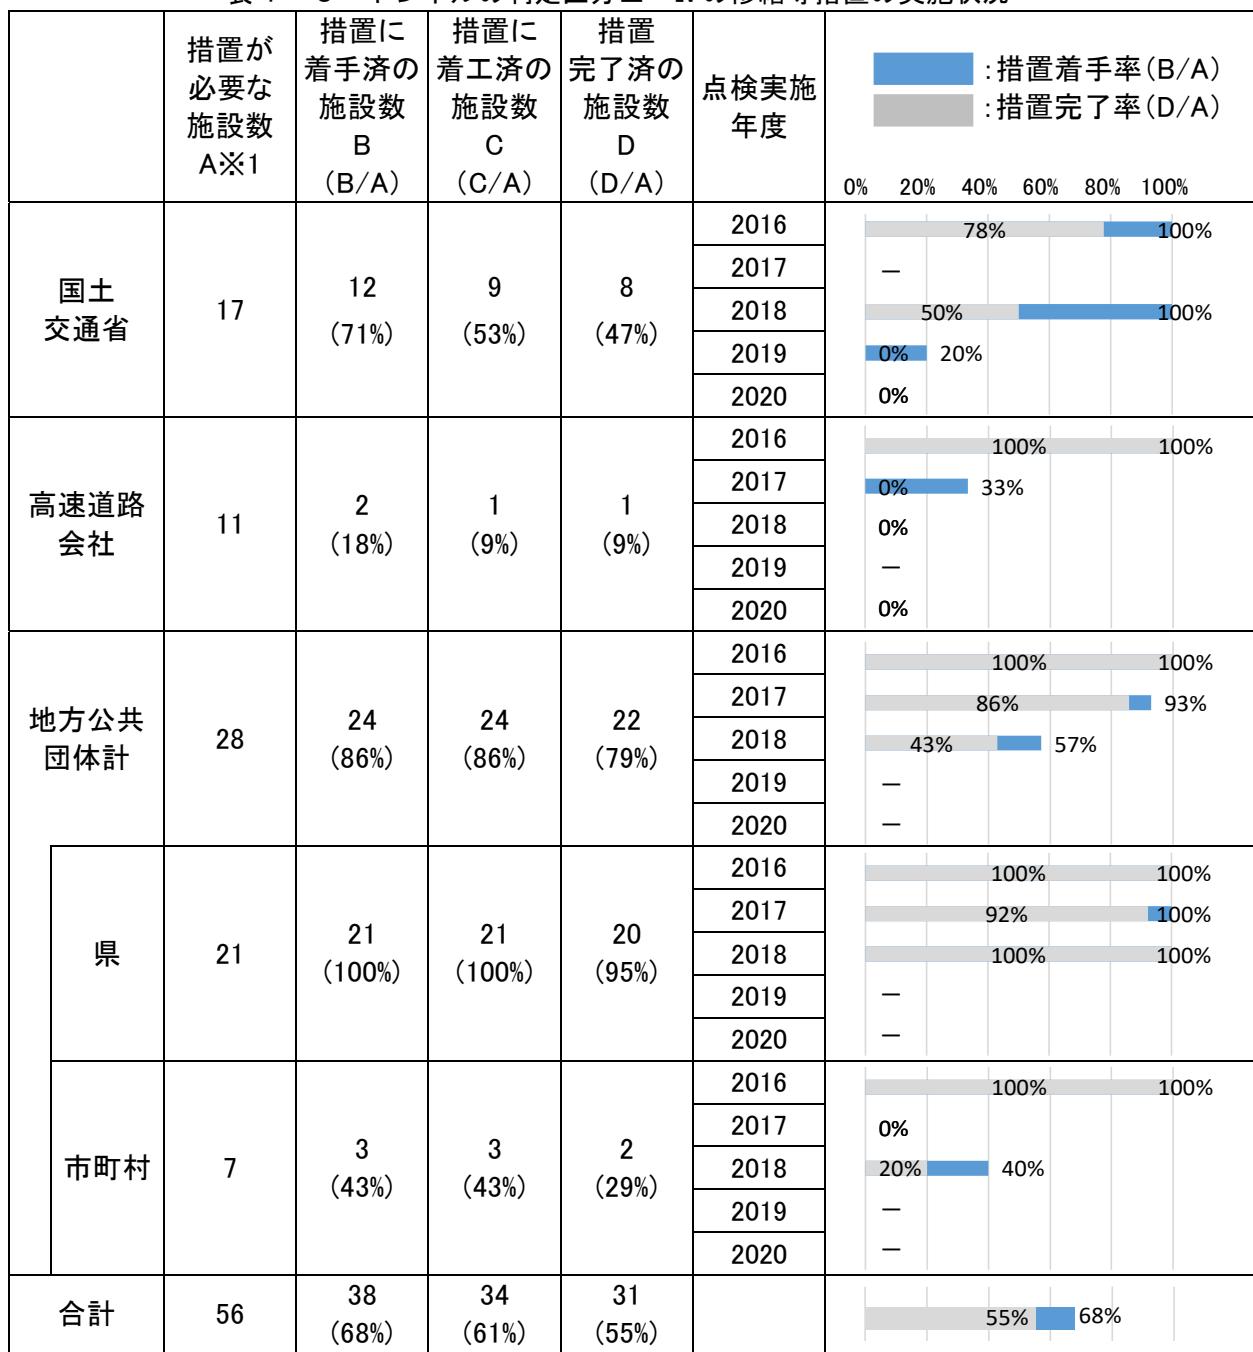

**措置着手率** :措置(設計を含む)に着手した割合(B/A)

**措置完了率** :措置が完了した割合(D/A)

2021.3末時点

※修繕等措置には、補修や補強などの施設の機能や耐久性等を維持又は回復するための「対策」のほか、「撤去」、定期的あるいは常時の「監視」、緊急に措置を講じることができない場合などの対応としての「通行規制・通行止」があるが、実施状況の集計からは「監視」は除く。


※1:直近5年間（2016～2020年度）の点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設数のうち、点検対象外等となった施設を除く施設数。

### ③道路附属物等

直近5年間(2016～2020年度)の点検で早期に措置を講ずるべき状態(判定区分Ⅲ)又は緊急に措置を講ずるべき状態(判定区分Ⅳ)と診断された道路附属物等の修繕等の措置に着手した割合は、2020年度末時点で国土交通省77%、高速道路会社0%、地方公共団体85%です。

措置の完了率は、国土交通省33%、高速道路会社0%、地方公共団体22%です。

表4-7 道路附属物等の判定区分Ⅲ・Ⅳの修繕等措置の実施状況

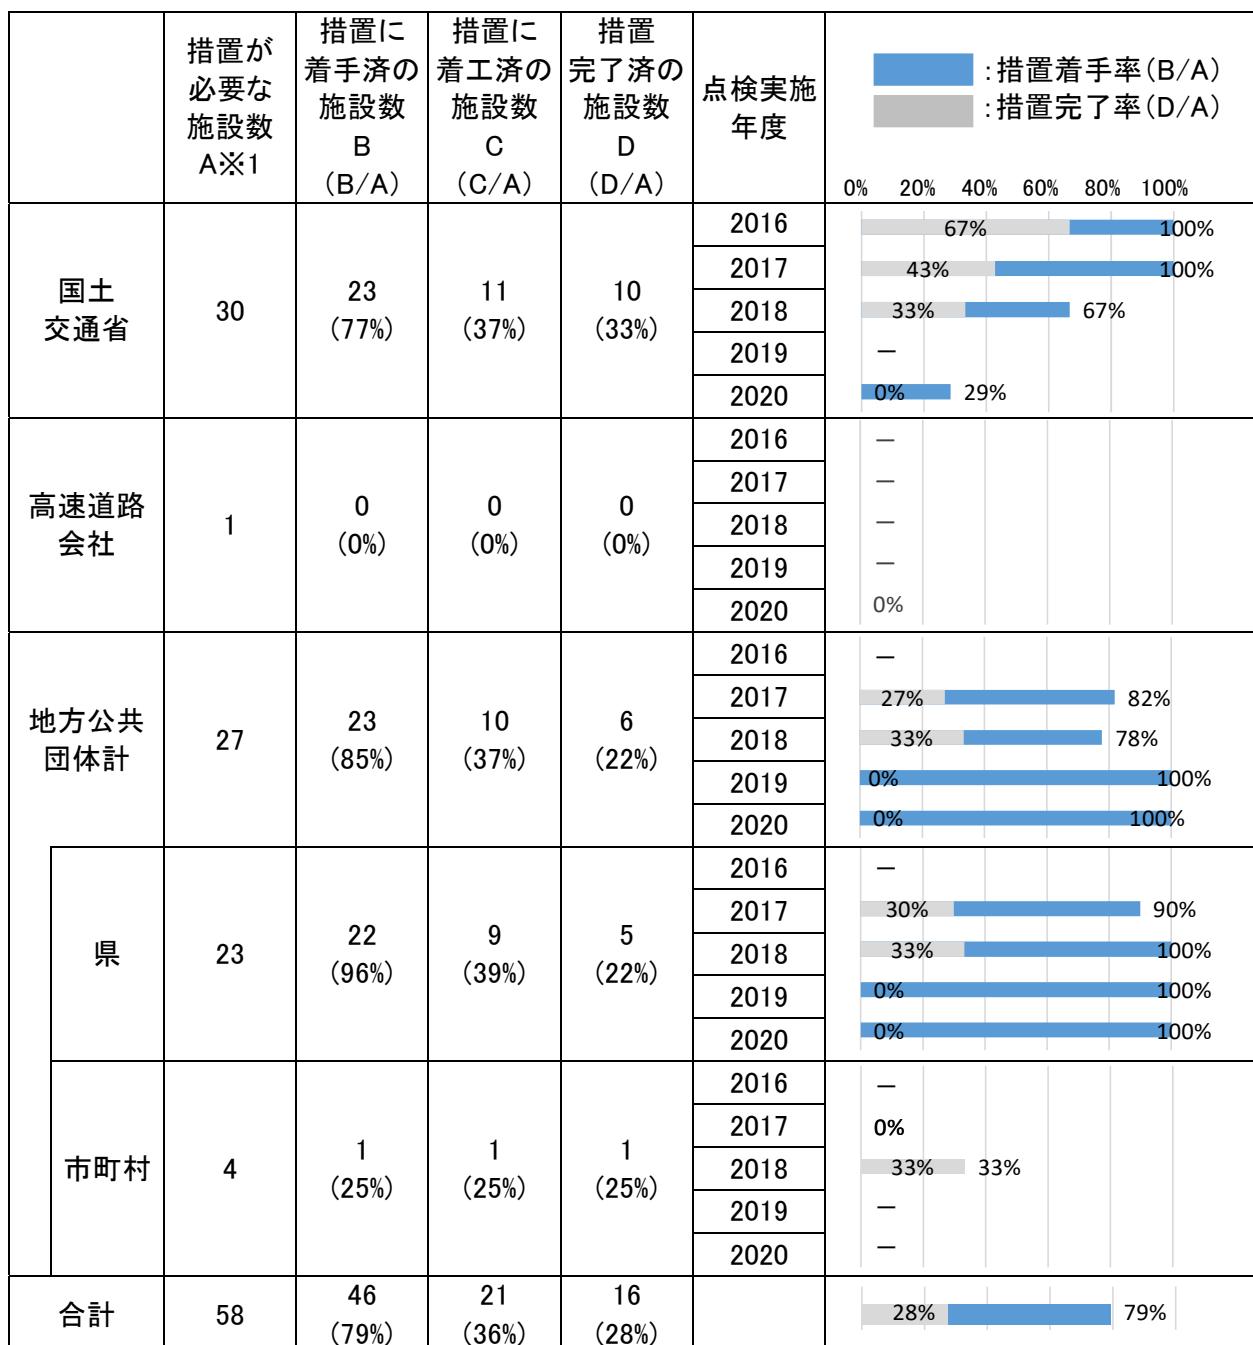

2021.3末時点

**措置着手率** :措置(設計を含む)に着手した割合(B/A)

**措置完了率** :措置が完了した割合(D/A)

※修繕等措置には、補修や補強などの施設の機能や耐久性等を維持又は回復するための「対策」のほか、「撤去」、定期的あるいは常時の「監視」、緊急に措置を講じることができない場合などの対応としての「通行規制・通行止」があるが、実施状況の集計からは「監視」は除く。

※1:直近5年間(2016～2020年度)の点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設数のうち、点検対象外等となった施設を除く施設数。


### (3) 判定区分IVの施設の措置状況

2020年度末時点で判定区分IVと診断された施設は、橋梁18橋、トンネル1箇所あり、措置済みの施設数は、橋梁13橋、トンネル1箇所となっています。道路附属物等は、2020年度末時点で判定区分IVと診断された施設はありませんでした。


老朽化した道路インフラの適正な維持管理を行っていくうえでも、ライフサイクルコストや地域の状況を踏まえて、必要に応じて施設の集約化・撤去などにより合理化を図っていく必要があります。

※IV判定の施設リストは巻末資料（5）を参照

#### ○判定区分IVの橋梁の措置状況(予定含む)

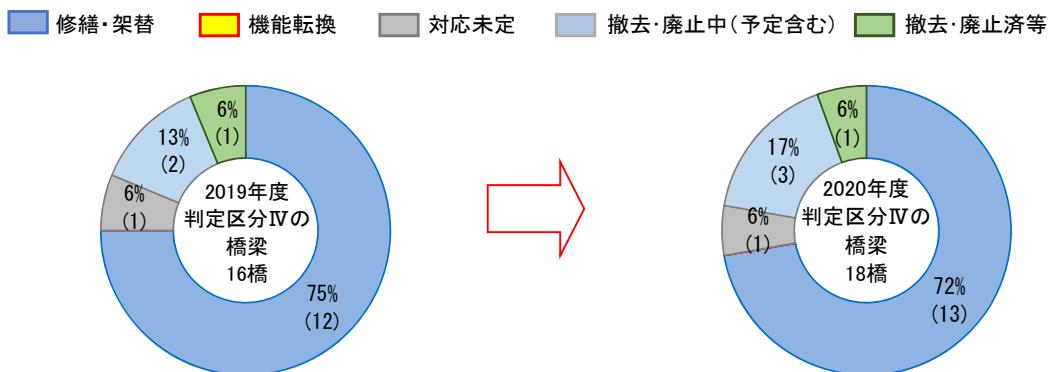

#### ○判定区分IVのトンネルの措置状況(予定含む)

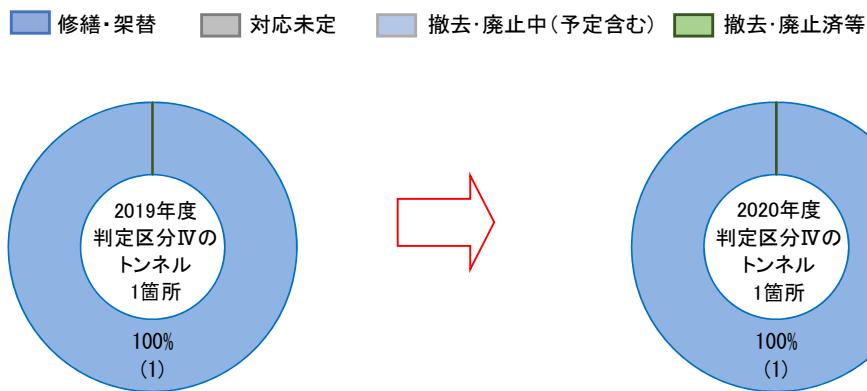

#### (4) 修繕等措置の取り組み事例

##### ①判定区分Ⅱの修繕事例（橋梁）

施設名：宮海橋  
管理者：国土交通省  
酒田河川国道事務所  
路線名：国道7号  
位置：山形県酒田市宮海  
建設年：1965年（昭和40年）  
主な損傷：伸縮装置の漏水



写真4-2 【損傷】伸縮装置の漏水




写真4-1 【全景】宮海橋



写真4-3 【損傷】伸縮装取替

##### ②判定区分Ⅲの修繕事例（橋梁）

施設名：大越川橋  
管理者：国土交通省  
山形河川国道事務所  
路線名：国道112号  
位置：山形県西川町  
建設年：1980年（昭和55年）  
主な損傷：アーチリブの腐食



写真4-4 【全景】大越川橋

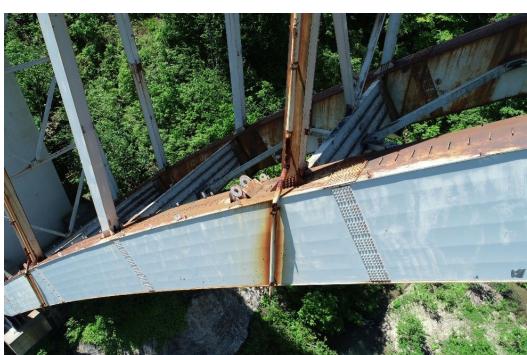


写真4-5 【損傷】アーチリブの腐食




写真4-6 【対策】  
アーチリブ塗装、配水管交換

施設名：武川沢橋  
管理者：小国町  
路線名：町道木積場線  
位置：山形県小国町  
建設年：1987年（昭和62年）  
主な損傷：主桁の剥離・鉄筋露出



写真4-7 【全景】武川沢橋

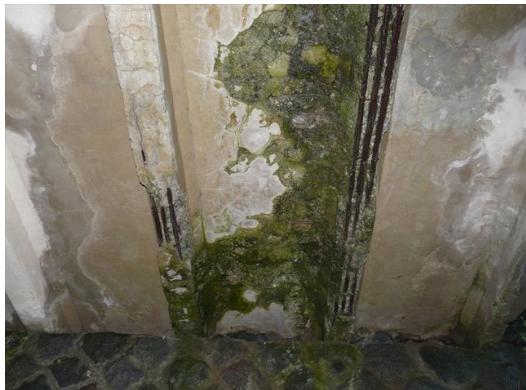


写真4-8 【損傷】主桁剥離、鉄筋露出



写真4-9 【対策】更新(ボックス化)

施設名：三山橋  
管理者：国土交通省  
山形河川国道事務所  
路線名：国道112号  
位置：山形県西川町  
建設年：1970年（昭和45年）  
主な損傷：主桁の腐食、変形・欠損  
支承本体の腐食



写真4-10 【全景】三山橋



写真4-11 【損傷】主桁腐食




写真4-12 【対策】当て板補修

施設名：八紘沢橋  
 管理者：国土交通省  
     酒田河川国道事務所  
 路線名：国道112号  
 位置：山形県鶴岡市  
 建設年：1978年（昭和53年）  
 主な損傷：支承の変形、機能障害



写真4-13 【全景】八紘沢橋



写真4-14 【損傷】  
支承の機能障害（異常変形）




写真4-15 【対策】  
支承取替

施設名：荒砥橋  
 管理者：山形県  
 路線名：県道長井白鷹線  
 位置：山形県白鷹町  
 建設年：1957年（昭和32年）  
 主な損傷：主桁の腐食、支承の沈下・腐食、  
     下部工の剥離・鉄筋露出



写真4-16 【全景】荒砥橋




写真4-17 【損傷】主桁の腐食



写真4-18 【対策】  
架替（新名称：白鷹大橋）

施設名：田麦橋  
 管理者：山形県  
 路線名：国道112号  
 位置：山形県鶴岡市  
 建設年：1932年（昭和7年）  
 主な損傷：鋼材の腐食・防食機能の劣化



写真 4-19 【全景】田麦橋



写真 4-20 【損傷】鋼材の腐食




写真 4-21 【対策】  
塗装塗替、当て板補修

### ③判定区分IVの修繕事例（橋梁）

施設名：続橋  
 管理者：川西町  
 路線名：市道高橋七裏線  
 位置：山形県川西町  
 建設年：1978年（昭和53年）  
 主な損傷：橋台の傾斜、主桁の鉄筋露出



写真 4-22 【全景】続橋



写真 4-23 【損傷】橋台の傾斜




写真 4-24 【対策】更新（ボックス化）

#### ④判定区分Ⅲの修繕事例（トンネル）

施設名：猿羽根トンネル  
管理者：国土交通省  
山形河川国道事務所  
路線名：国道13号  
位置：山形県尾花沢市  
建設年：1961年（昭和36年）  
主な損傷：材料劣化によるうき



写真4－25 【全景】猿羽根トンネル

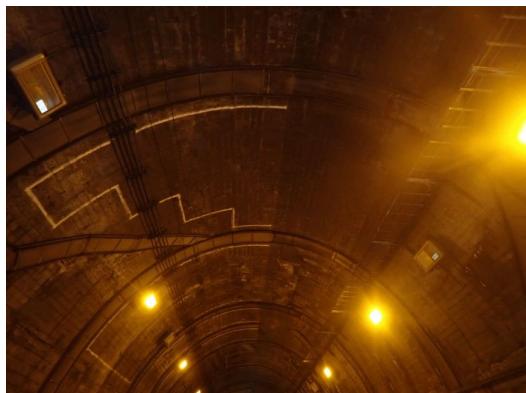


写真4－26 【損傷】材質劣化

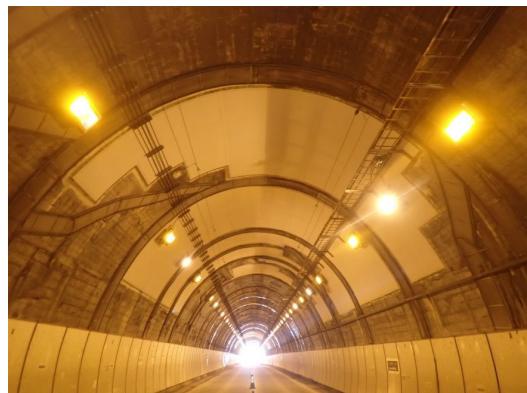


写真4－27 【対策】  
炭素繊維内蔵パネル設置

施設名：月山第一トンネル  
管理者：国土交通省  
酒田河川国道事務所  
路線名：国道112号  
位置：山形県西村郡西川町/鶴岡市  
建設年：1976年（昭和51年）  
主な損傷：漏水



写真4－28 【全景】月山第一トンネル



写真4－29 【損傷】漏水防止版の腐食



写真4－30 【対策】漏水防止版交換

## ⑤判定区分Ⅲの修繕事例（シェルター）

施設名：関山スノーシェルター  
管理者：国土交通省  
山形河川国道事務所  
路線名：国道48号  
位置：山形県東根市  
建設年：1968年（昭和43年）  
主な損傷：主梁等の腐食、破断、板厚減少



写真4-31 【全景】関山スノーシェルター



写真4-32 【損傷】  
主梁等の腐食、破断、板厚減少



写真4-33 【対策】  
PCシェルターへ更新

## ⑥判定区分Ⅲの修繕事例（横断歩道橋）

施設名：両羽横断歩道橋  
管理者：国土交通省  
酒田河川国道事務所  
路線名：国道7号  
位置：山形県酒田市  
建設年：1978年（昭和53年）  
主な損傷：桁、床版に腐食、  
防食機能の劣化等



写真4-34 【全景】両羽横断歩道橋  
(R2架替え後)



写真4-35 【損傷】  
桁、床版腐食、防食機能の劣化



写真4-36 【対策】上部工架替え

**施設名**: 白山横断歩道橋  
**管理者**: 山形県  
**路線名**: 県道面野山鶴岡線  
**位置**: 山形県鶴岡市  
**建設年**: 1969年（昭和44年）  
**主な損傷**: 鋼材の腐食



写真4-37 【全景】白山横断歩道橋



写真4-38 【損傷】腐食




写真4-39 【対策】塗装塗替

## ⑦撤去事例（横断歩道橋）

**施設名**: 滝野横断歩道橋  
**管理者**: 山形県  
**路線名**: 国道348号  
**位置**: 山形県白鷹町  
**建設年**: 不明  
**主な損傷**: 鋼材の腐食・防食機能の劣化



写真4-40 【全景】滝野横断歩道橋



写真4-41 【損傷】腐食・防食機能の劣化

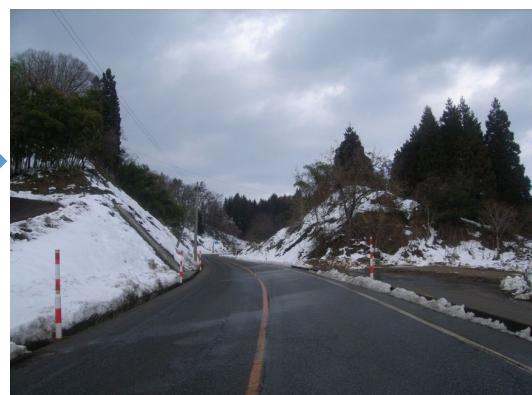



写真4-42 【損傷】撤去

## (5) 橋梁の損傷傾向

### 1) 地勢

山形県は、全国でも有数の豪雪地域であり、県内全域が積雪寒冷地域として知られています。

そのため、冬期は厳しい気象条件となっており、全域にわたって凍結抑制剤が散布されている実態があります。

また、日本海側は冬期の厳しい季節風や地吹雪により、塩害の影響が激しい地域が存在しています。

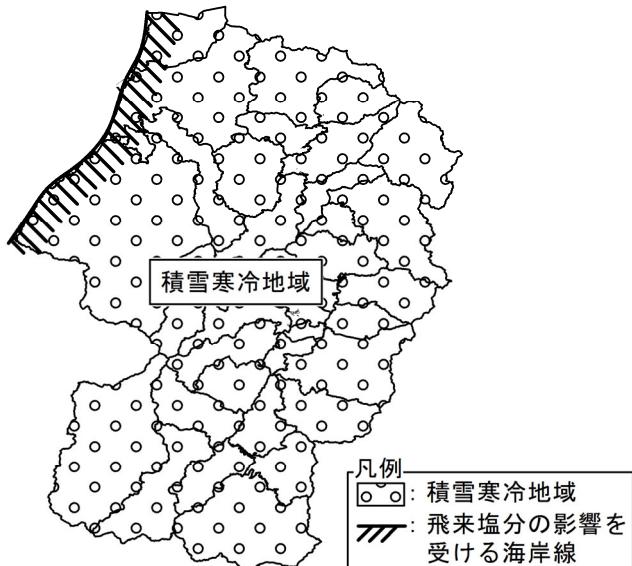


図 4－2 山形県の地理的特徴

#### 【凍結抑制剤による損傷事例】



写真 4－4 6 RC 床版のひびわれ  
鉛汁を伴う漏水・遊離石灰

#### 【塩害による損傷事例】



写真 4－4 7 主桁の全般的な腐食

### 2) 長寿命化に向けて

橋梁の損傷の多くは支承や橋桁端部に集中しており、伸縮装置からの凍結抑制剤の塩分を含んだ漏水が原因と考えられます。また、床版においても、路面水の浸透が劣化を早める原因と考えられます。このため、伸縮装置や橋面の止水・防水・排水対策等を適切に行い、長寿命化を図ることが重要となっています。

### 3) 凍結抑制剤の影響

凍結抑制剤の散布量の影響について分析した結果、散布量が少ない橋梁に比べ、散布量が多い橋梁では健全度が低い傾向です。

部材別では、主桁や床版などの上部工部材に影響が見受けられます。

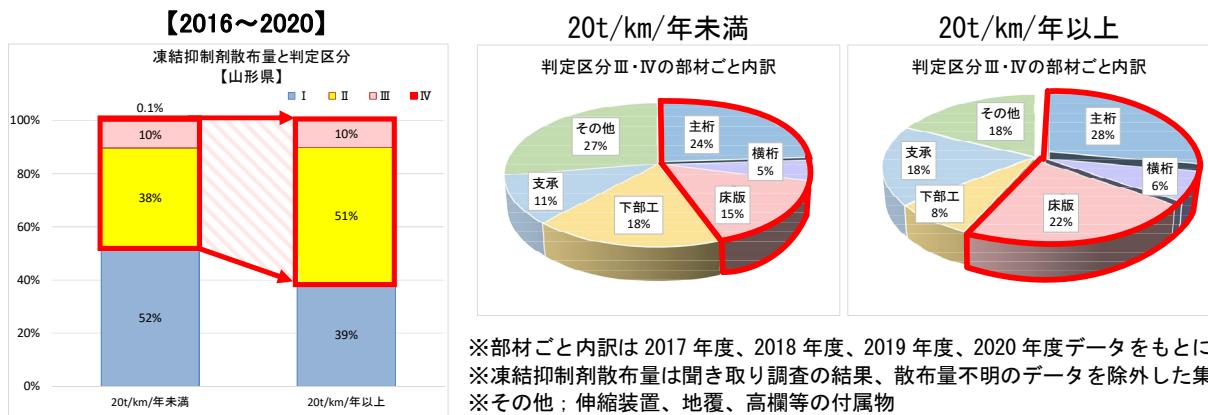


図4-3 凍結抑制剤散布量別の橋梁判定区分及び判定区分III・IVの部材ごと内訳

### 4) 塩害の影響

飛来塩分の影響について分析した結果、内陸部に位置する橋梁に比べ、海岸線に近い橋梁の健全度が低い傾向です。

部材別では、上部工部材（主桁）に影響が見受けられます。

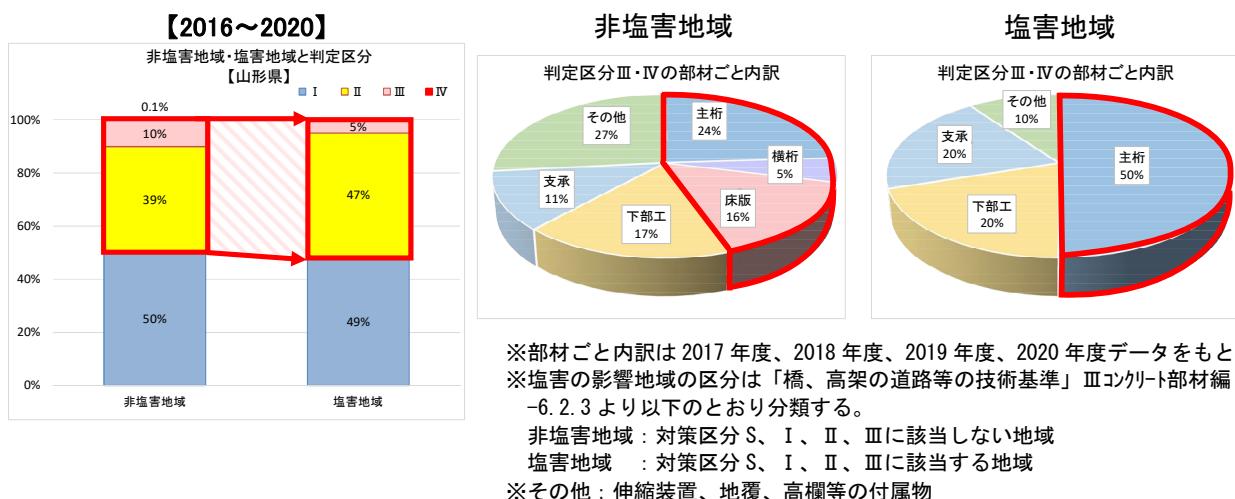


図4-4 非塩害地域・塩害地域別の橋梁判定区分及び判定区分III・IVの部材ごと内訳

## (6) 個別施設計画の策定状況

各道路管理者は、橋梁・トンネル・道路附属物等の定期点検の結果に基づき長寿命化修繕計画（個別施設計画）※を策定しています。

長寿命化修繕計画（個別施設計画）に基づき、メンテナンスサイクルを予防保全型へ転換することにより施設の長寿命化を図るものであります。

また、長寿命化修繕計画（個別施設計画）は、計画的に対策を行うことにより、ライフサイクルコストの縮減や維持管理費の平準化を目指します。

さらに、計画的な定期点検を行い、新たに措置が必要な施設についても確実に対策を実施していくため、長寿命化修繕計画（個別施設計画）はその都度更新します。

2020年度末時点における県内の市町村の長寿命化修繕計画（個別施設計画）の策定状況は、橋梁100%、トンネル100%、道路附属物等89%となっています。

※維持管理・更新等にかかるトータルコストの縮減・平準化を図る上で点検・診断等の結果を踏まえた個別施設毎の具体的な対応方針を定めた計画


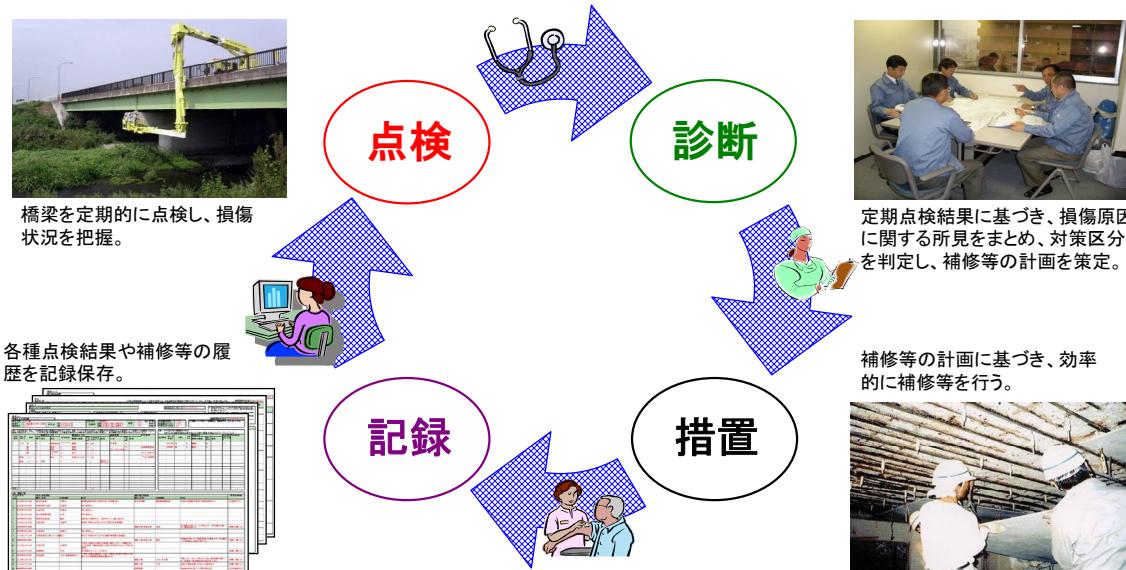


図4-5 橋梁保全のマネジメント図

## ○ インフラ長寿命化計画の体系

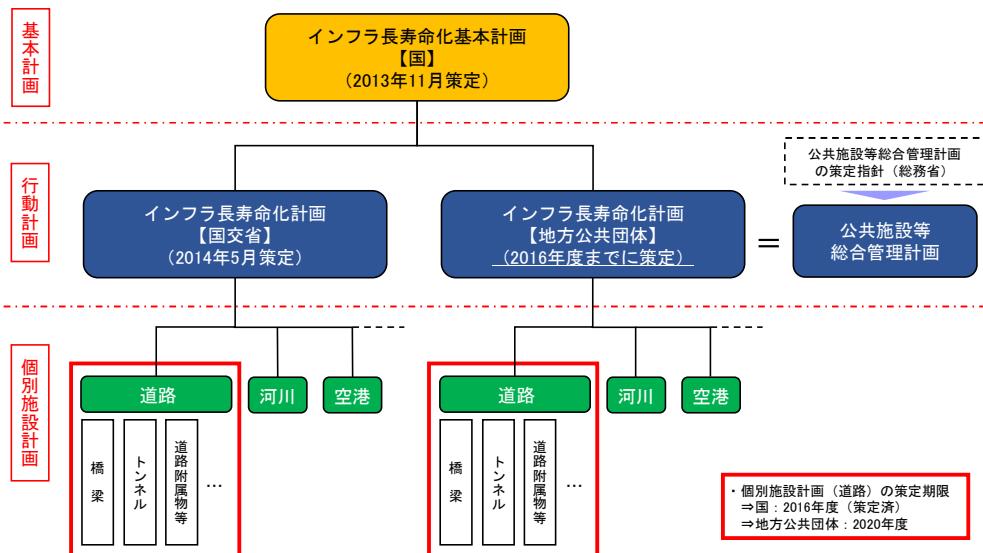

## ○ 個別施設計画の策定期限状況（2020年度末時点）

表 4－8 個別施設計画の策定期限状況

〈橋梁〉				〈トンネル〉				〈道路附属物等〉			
管理者	策定期限	管理団体数	計画策定期回数	管理者	策定期限	管理団体数	計画策定期回数	管理者	策定期限	管理団体数	計画策定期回数
国土交通省	100%	1	1	国土交通省	100%	1	1	国土交通省	100%	1	1
高速道路会社	100%	1	1	高速道路会社	100%	1	1	高速道路会社	100%	1	1
県	100%	1	1	県	100%	1	1	県	100%	1	1
市町村	100%	35	35	市町村	100%	10	10	市町村	89%	9	8

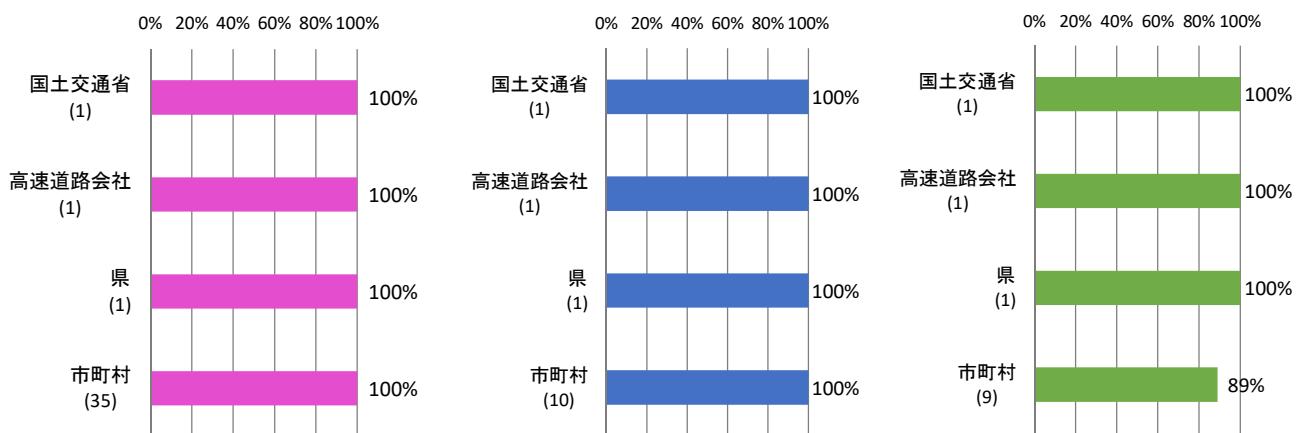


図 4－6 個別施設計画の策定期限

※()は団体数

※2021年9月末時点の集計値




※割合は個別施設計画策定期対象の施設を管理する団体数により算出

※道路附属物等は横断歩道橋、門型標識等、シェッド、大型カルバートであり、いずれかの施設の個別施設計画が策定期限内に策定期満了としている

## 5 予防保全への移行状況

### 1) 地方公共団体の予防保全への移行状況

橋梁の修繕等の措置が予防保全段階に移行可能と考えられる地方公共団体（判定区分Ⅲ・Ⅳの施設が存在しない、または修繕等の措置が完了している団体）は、2020年度末時点で6%に留まっており、措置完了率が20%未満の団体が約半数を占めています。

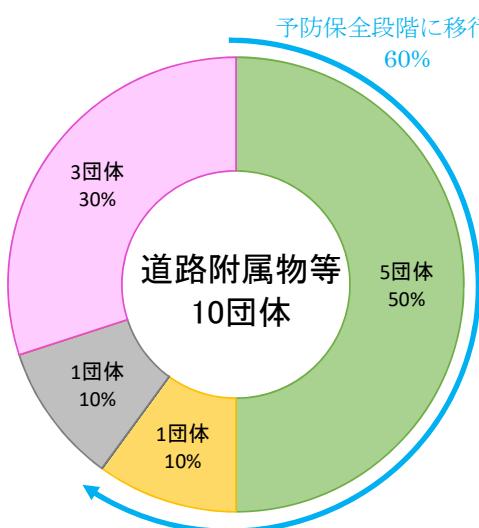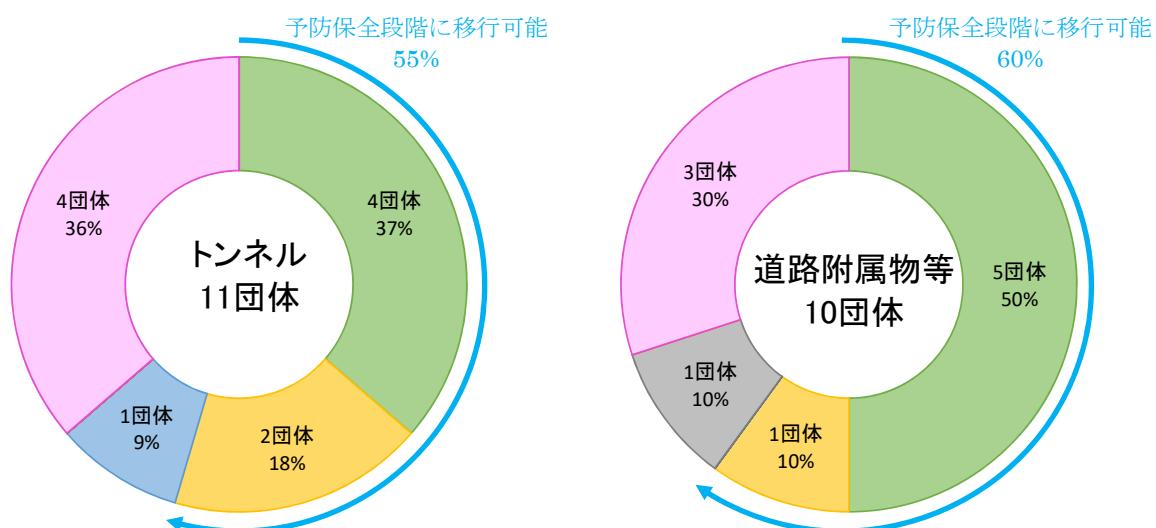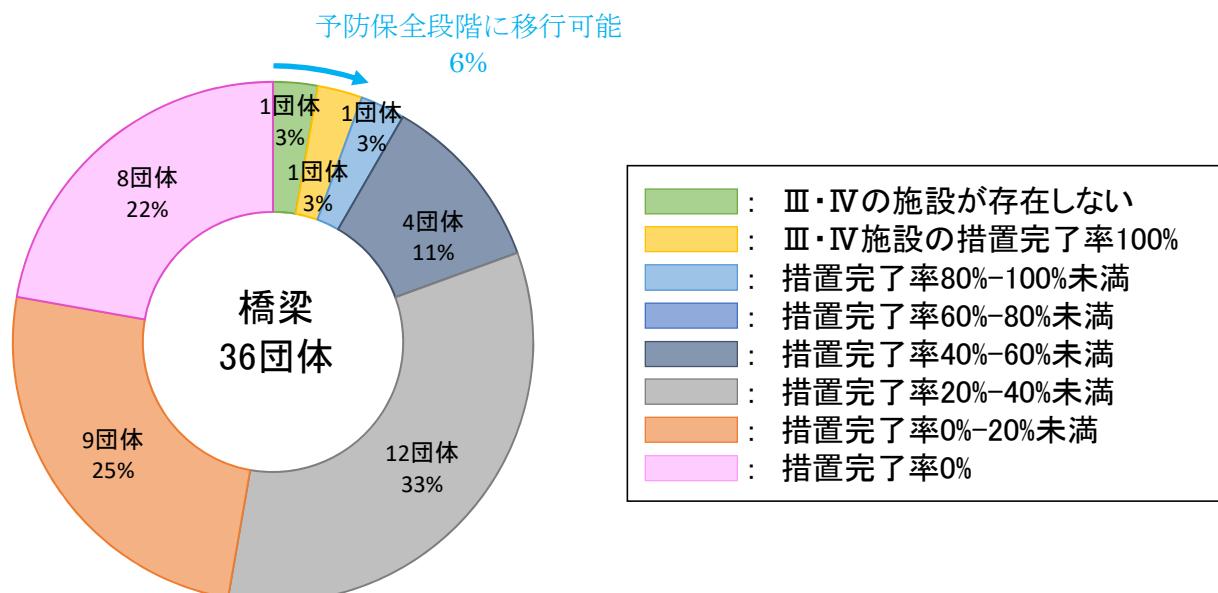

※団体数は、2020年度末時点の点検対象施設(管理施設のうち、供用後5年以内などを除いた施設)を管理する都道府県、市町村の合計。

※措置完了率は、2020年度末時点で判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設の修繕等の措置が完了した割合。

※2021年3月末時点の集計値

## 6 道路メンテナンス会議の取り組み

山形県道路メンテナンス会議は、インフラの老朽化対策が社会的な課題となり、橋梁・トンネル等の定期的な点検がスタートした2014年度に、技術力の向上、インフラの長寿命化の推進、さらには道路インフラの維持管理についての情報共有や課題解決への連携と道路の管理を効果的に行っていくことが急務であるとして、県内の道路管理者が一体的連携を図るための組織として設置されました。

特に市町村では、道路構造物の維持管理についての技術ノウハウや土木技術系職員が不足しているなど課題がある中で、道路インフラを適正に維持管理していくことが重要であるため、山形県道路メンテナンス会議では、市町村の技術的支援に重点をおいた活動を展開しています。



写真6-1 橋梁技術研修状況



写真6-2 現場研修状況



写真6-3 広報活動状況  
(損傷供試体による打音確認)



写真6-4 パネル展状況  
(県庁1Fロビー)

## ○これまでの取り組み

表 6-1 取り組み経緯

年度	月	会議開催	研修・講習会	広報活動
2014 (H26)	4~6	5/30 第1回道路メンテナンス会議(設立)		6月 パネル展示(鶴岡市役所)
	7~9		8/6 橋梁長寿命化総合研修(点検編)新庄会場 8/7 橋梁長寿命化総合研修(点検編)天童会場	7月~8月 パネル展示(各道の駅・各自治体)
	10~12	10/10 第2回道路メンテナンス会議	11/6 橋梁長寿命化研修(概説編・設計編) 12/17 トンネル長寿命化対策研修	10/7 橋梁点検体験実習(高校生) 10/25 橋の老朽化対策現場特別見学会(一般者)
	1~3	1/14 第3回道路メンテナンス会議 3/11 二道橋連絡会議(設立)		
2015 (H27)	4~6	5/29 第1回メンテナンス会議	6/25 橋梁長寿命化総合研修(点検編)酒田会場	
	7~9	8/26 第2回道路メンテナンス会議	7/2 橋梁長寿命化総合研修(点検編)長井会場 7/17 現地研修(Co橋補修事例) 9/9 トンネル長寿命化対策研修	
	10~12		11/10~11 橋梁技術研修(鋼橋・PC橋)	12月 パネル展示(各道の駅・県庁)
	1~3	1/13 第3回道路メンテナンス会議		1月~2月 パネル展示(各道の駅・県庁)
2016 (H28)	4~6	6/29 第1回道路メンテナンス会議		4月~6月 パネル展示・点検体験(各道の駅・各自治体) 6/8 天童市イベント パネル展示・点検体験(高校生) 6/11 河北町イベント 橋梁打音検査体験(小学生) 6/17 橋梁点検体験学習(高校生)
	7~9	8/3 二道橋連絡会議	9/27 橋梁長寿命化総合研修(点検編)山形会場 9/28 橋梁長寿命化総合研修(点検編)寒河江会場	8月 パネル展示(県庁)
	10~12		10/26 現地研修(PC橋補修事例) 11/11 現地研修(鋼橋補修事例) 11/29 長寿命化対策研修(道路附属物・溝橋編)	10月 パネル展示(各自治体) 10/19 補修工事現場見学会(一般者) 11/22 トンネル内装版更新工事見学会(報道関係者) 12/1 老朽化対策取材(TV放映)
	1~3	3/6 第2回道路メンテナンス会議 3/6 道路鉄道連絡会議(設立)		2/14 メンテナンスサイクル新聞広告掲載
2017 (H29)	4~6			4月~6月 パネル展示・点検体験(各道の駅・各自治体) 5/18 職業体験学習 座学・点検体験(高校生) 6/7 天童市イベント パネル展示・点検体験(高校生) 6/24 河北町イベント 橋梁打音検査体験(小学生)
	7~9	8/2 第1回道路メンテナンス会議 8/2 二道橋連絡会議	7/28 現地研修(横断歩道橋補修事例) 9/6 道路メンテナンス研修(点検編)酒田会場 9/7 道路メンテナンス研修(点検編)高島会場 9/27 既設橋の耐震補強現場視察・座学	7/7 職業体験学習 座学・点検体験(高校生) 8月 パネル展示(県庁)
	10~12	12/20 第2回道路メンテナンス会議	10/5 現地研修(橋梁床版補修事例) 10/31 道路メンテナンス研修(舗装点検・小規模附属物編)	10月 パネル展示・点検体験(各道の駅・各自治体)
	1~3	2/19 第3回道路メンテナンス会議 2/19 道路鉄道連絡会議		
2018 (H30)	4~6	5/31 事務局会議		4月~6月 パネル展示・点検体験(各道の駅・各自治体) 6/6 天童市イベント パネル展示・点検体験(高校生) 6/23 河北町イベント 橋梁打音検査体験(小学生)
	7~9	9/4 第1回道路メンテナンス会議	9/10 道路メンテナンス研修(点検編)天童会場 9/12 道路メンテナンス研修(点検編)新庄会場 9/19 現地研修(橋梁補修例・塗装) 9/26 既設橋の耐震補強現場視察・座学	7/6 職業体験学習 座学・点検体験(高校生) 8月 パネル展示(県庁)
	10~12		10/3 現地研修(橋梁床版橋梁補修例) 10/18 山形県橋梁技術研修...県主催 11/7 道路メンテナンス研修(舗装点検・土工構造物点検編)	10月 パネル展示・点検体験(各道の駅・各自治体)
	1~3	2/25 山形鉄道連絡会議		
2019 (R1)	4~6	4/23 定期点検要領等改定説明会 6/12 事務局会議	5/14 現地研修(RC床版取替)	パネル展示・体験乗車(一般者) 4/28 寒河江市イベント 5/5 道の駅いいで 5/6 山形市イベント パネル展示・打音検査・体験乗車(高校生) 6/5 天童市イベント 橋梁点検・打音検査・体験乗車(小学生) 6/22 河北町イベント
	7~9	8/7 第1回道路メンテナンス会議	7/1 現地研修 橋梁補修(塗装塗替) 9/10 道路メンテナンス研修(橋梁点検編) 9/11 道路メンテナンス研修(橋梁点検編) 庄内会場	8/1~8/15 老朽化対策パネル展示(県庁)
	10~12		11/12~13 橋梁技術研修(主催者:山形県) 11/21 溝講講習会及び支援技術活用講習会	10/7 県版道路メンテナンス概要公表
	1~3	2/17 第2回道路メンテナンス会議 2/17 道路鉄道連絡会議		
2020 (R2)	4~6			
	7~9	7/7 事務局会議 9/3 第1回道路メンテナンス会議	9/10 道路メンテナンス研修(橋梁) 現地:天童大橋(天童市) 参加者:63名	8/1~17 老朽化対策パネル展示(県庁)
	10~12		10/20 橋梁技術研修 場所:山形市 参加者:101名 11/5 インフラメンテナンス見学会 現地:糸畔橋(米沢市) 参加者:78名	11/19 道路メンテナンス概要公表
	1~3	2/15 第2回道路メンテナンス会議 2/15 道路鉄道連絡会議		


## 7 参考資料（東北と県全体の比較）

(1) 建設年度別施設数・建設後 50 年経過した割合.....	44
(2) 道路管理者別施設数内訳.....	45
(3) 2 巡目（2019～2020 年度）道路管理者別点検結果内訳 .....	46
(4) 2 巡目（2019～2020 年度）点検実施施設における道路管理者別判定区分の遷移状況...	47
(5) 2 巡目（2019～2020 年度）点検実施施設における建設年数別の遷移状況 .....	48
(6) 直近 5 年間（2016～2020 年度）道路管理者別点検結果内訳 .....	49
(7) 直近 5 年間（2016～2020 年度）点検実施施設における建設年数別の遷移状況.....	50
(8) 部材ごとの点検結果内訳（橋梁） .....	51
(9) 判定区分Ⅲ・Ⅳの部材ごと内訳（橋梁） .....	53

### (1) 建設年度別施設数・建設後50年経過した割合

#### ■橋梁

##### 東北

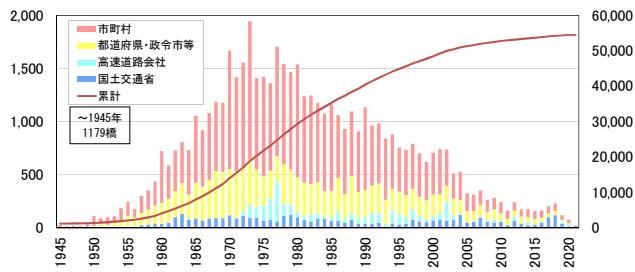

##### 山形県全体

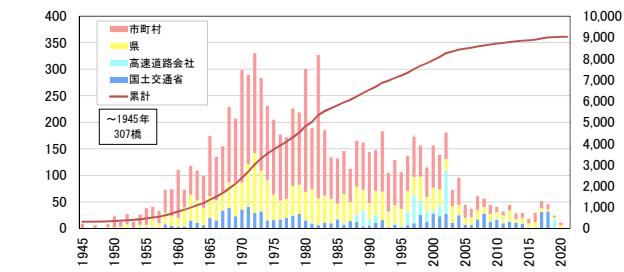


図7-1 建設年度別施設数





図7-2 建設後50年経過した割合

#### ■トンネル

##### 東北

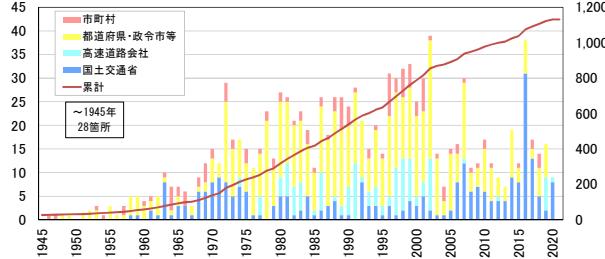

##### 山形県全体

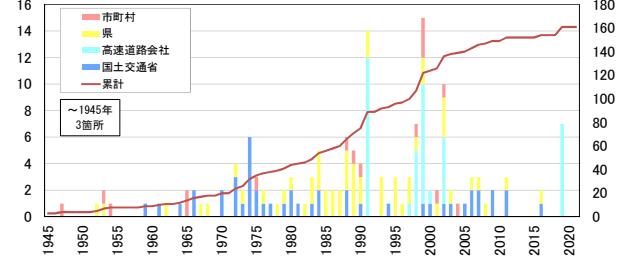


図7-3 建設年度別施設数





図7-4 建設後50年経過した割合

#### ■道路附属物等

##### 東北

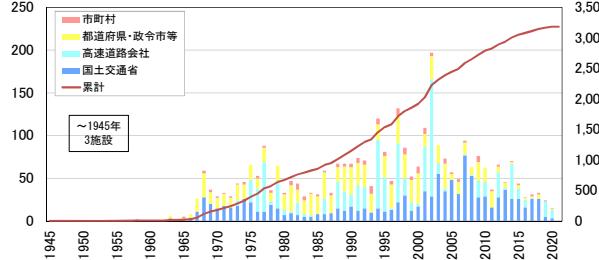

##### 山形県全体

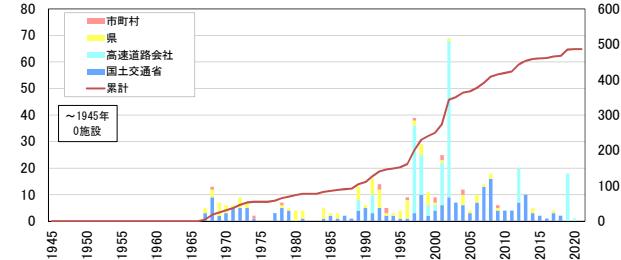


図7-5 建設年度別施設数




図7-6 建設後50年経過した割合

## (2) 道路管理者別施設数内訳

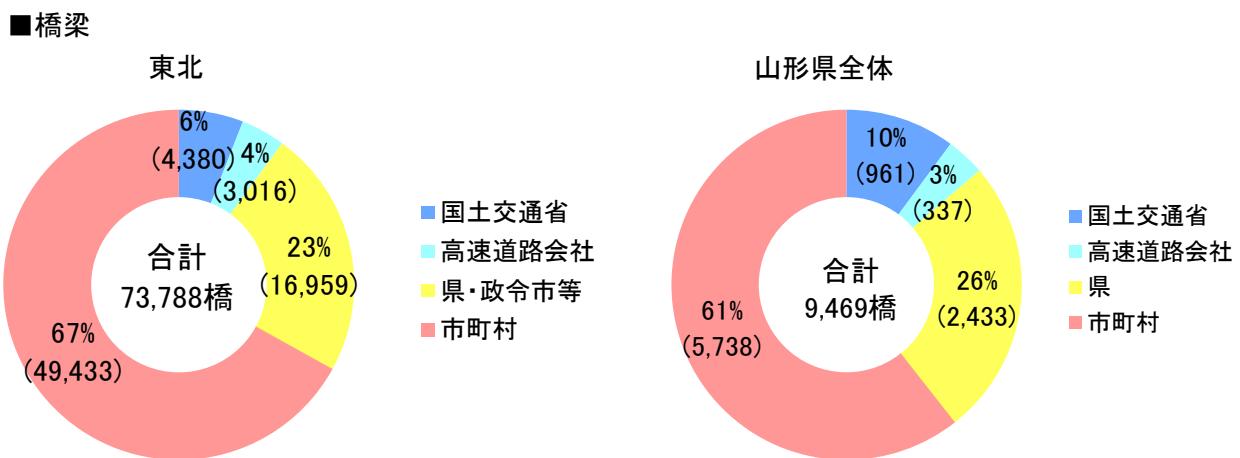


図7-7 道路管理者別施設数内訳

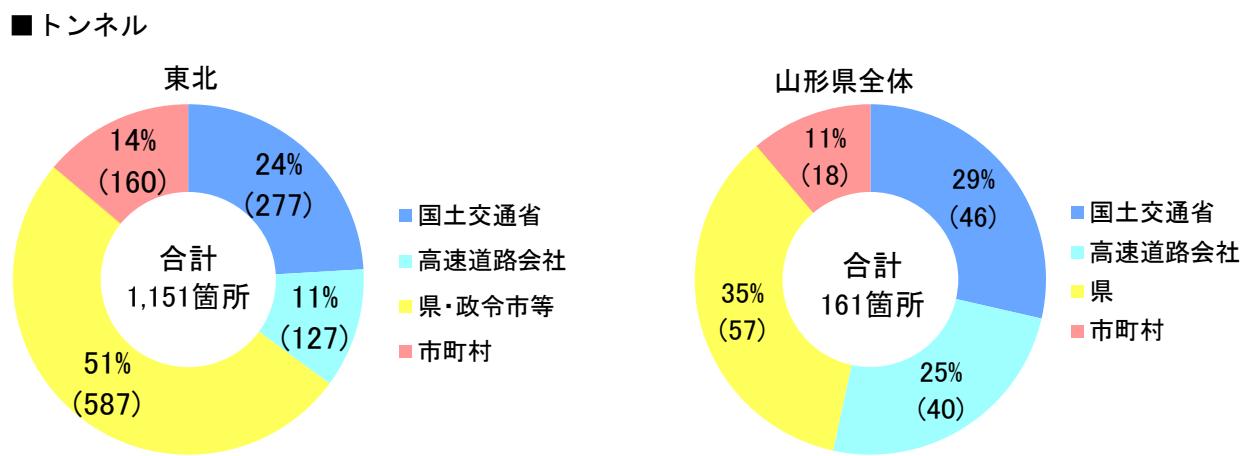


図7-8 道路管理者別施設数内訳

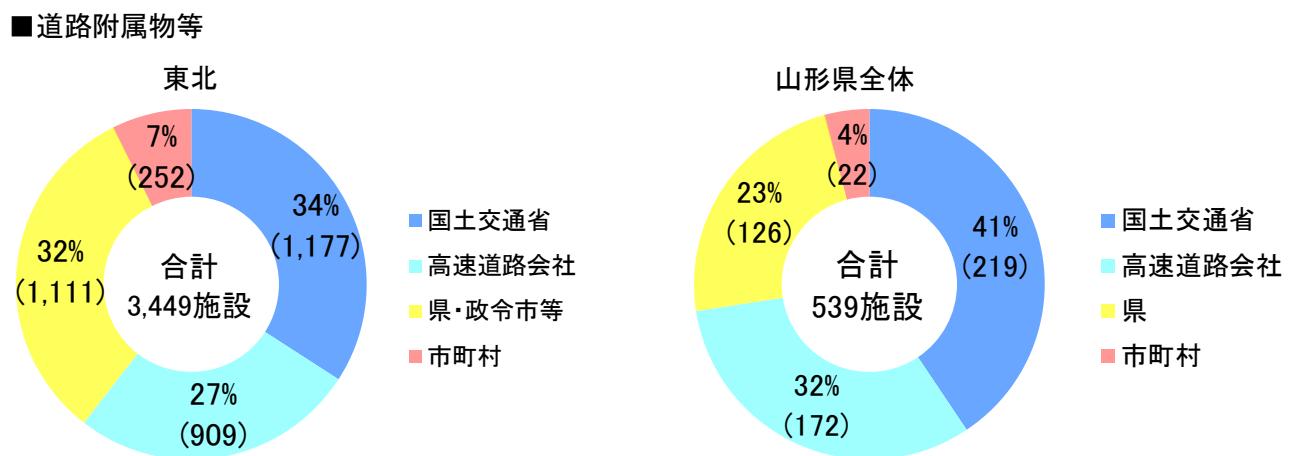


図7-9 道路管理者別施設数内訳

(3) 2巡目(2019～2020年度)道路管理者別点検結果内訳

■橋梁

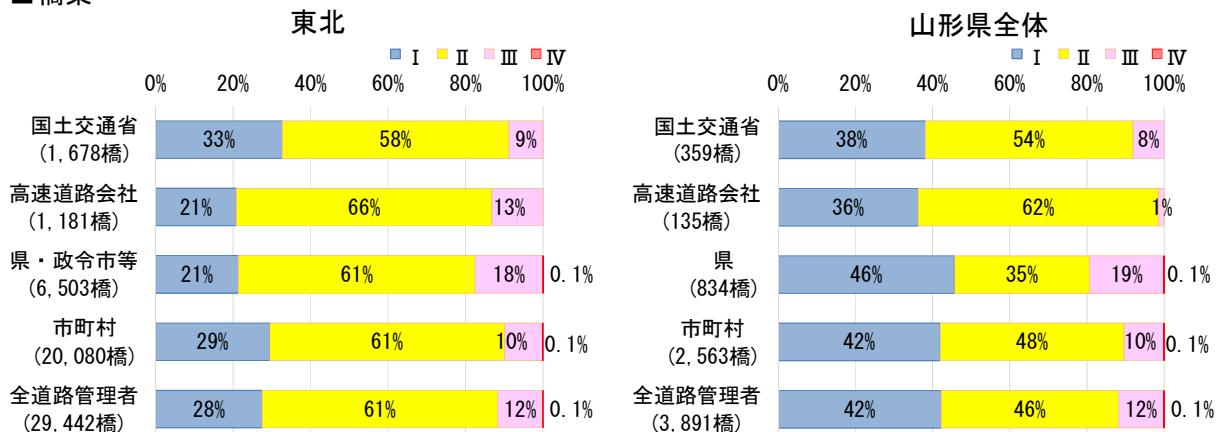


図7-10 2巡目(2019～2020年度)道路管理者別点検結果内訳

■トンネル

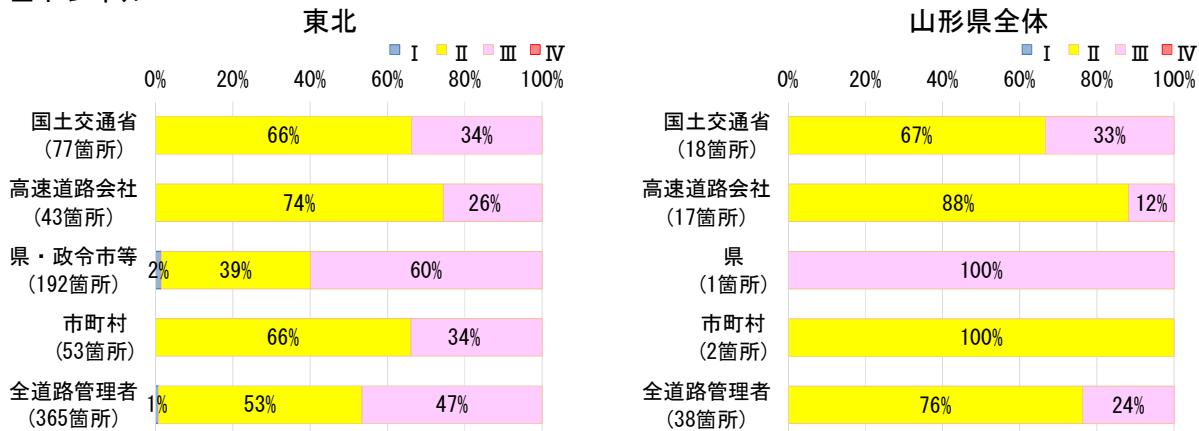


図7-11 2巡目(2019～2020年度)道路管理者別点検結果内訳

■道路附属物等

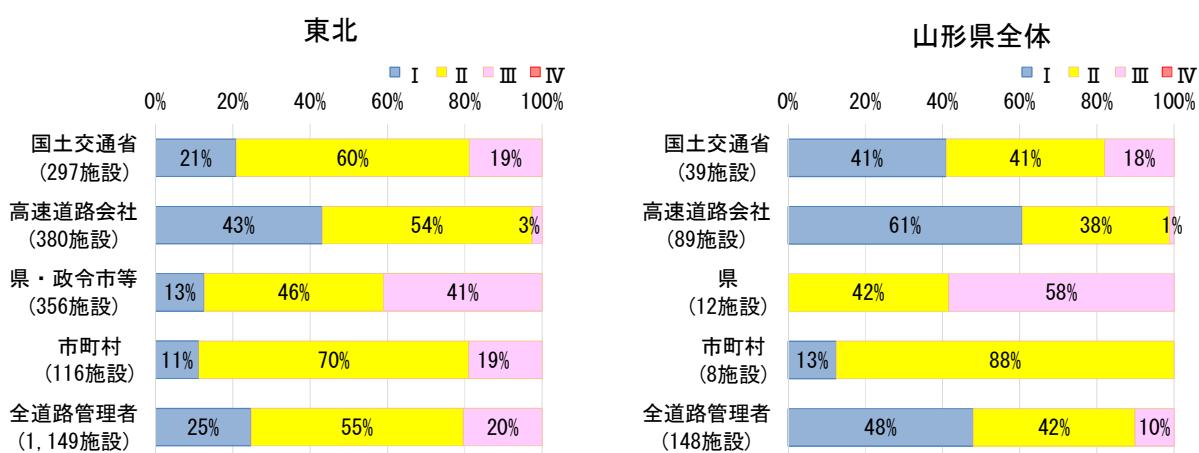


図7-12 2巡目(2019～2020年度)道路管理者別点検結果内訳

(4) 2巡目(2019～2020年度)点検実施施設における道路管理者別判定区分の遷移状況

■橋梁

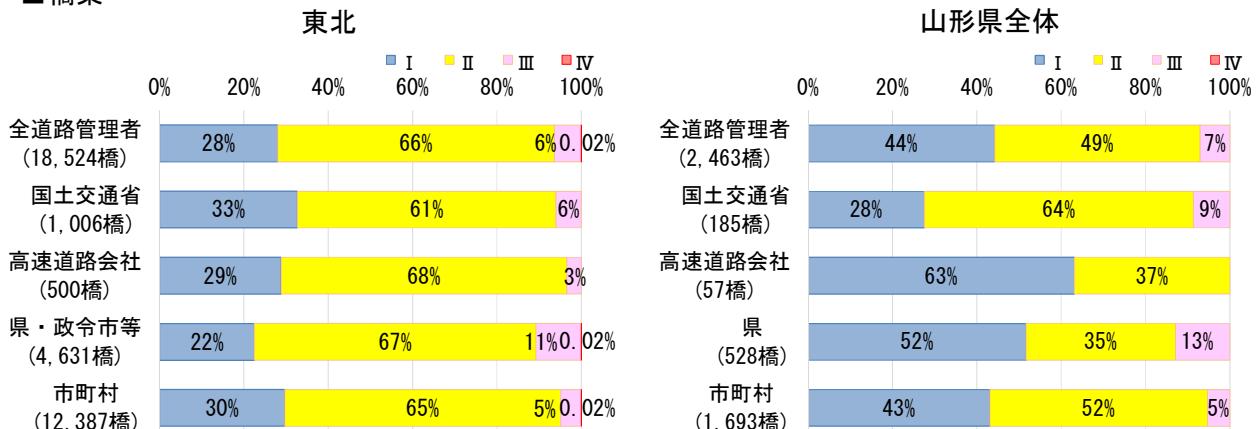


図7-13 道路管理者別判定区分の遷移状況

■トンネル

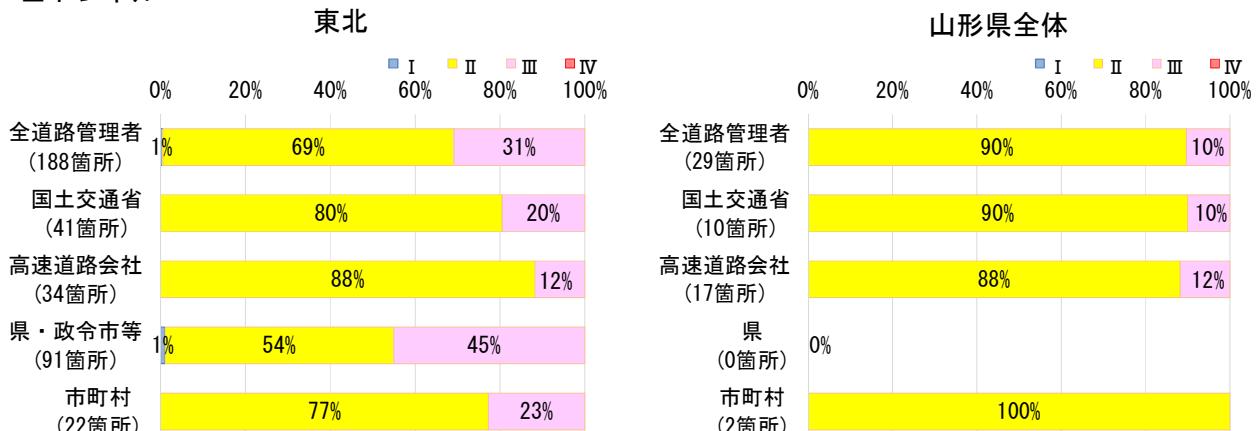


図7-14 道路管理者別判定区分の遷移状況

■道路附属物等

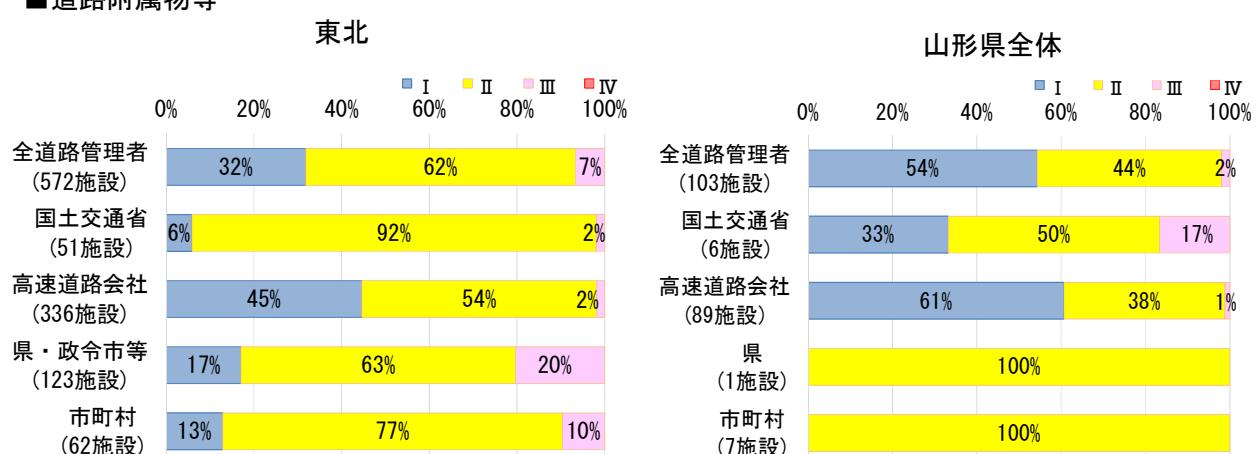


図7-15 道路管理者別判定区分の遷移状況

## (5) 2巡目(2019～2020年度)点検実施施設における建設年数別の遷移状況

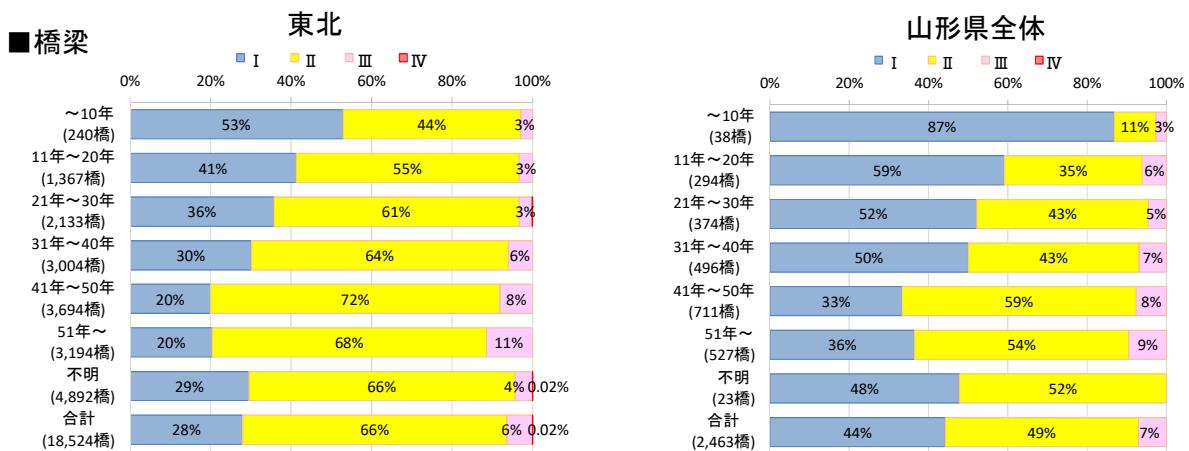


図7-16 2巡目(2019～2020年度)点検実施施設における建設年数別の遷移状況

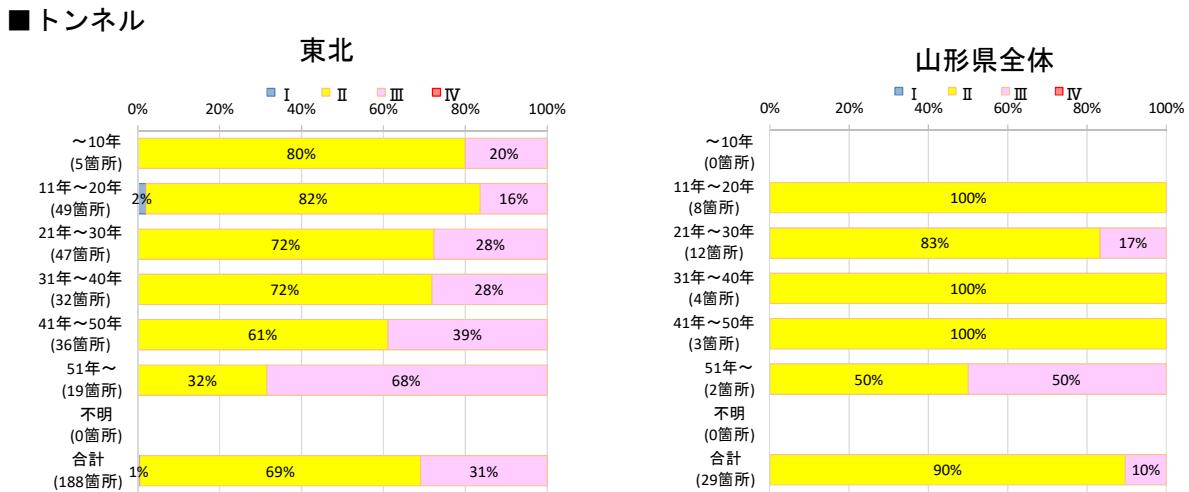


図7-17 2巡目(2019～2020年度)点検実施施設における建設年数別の遷移状況

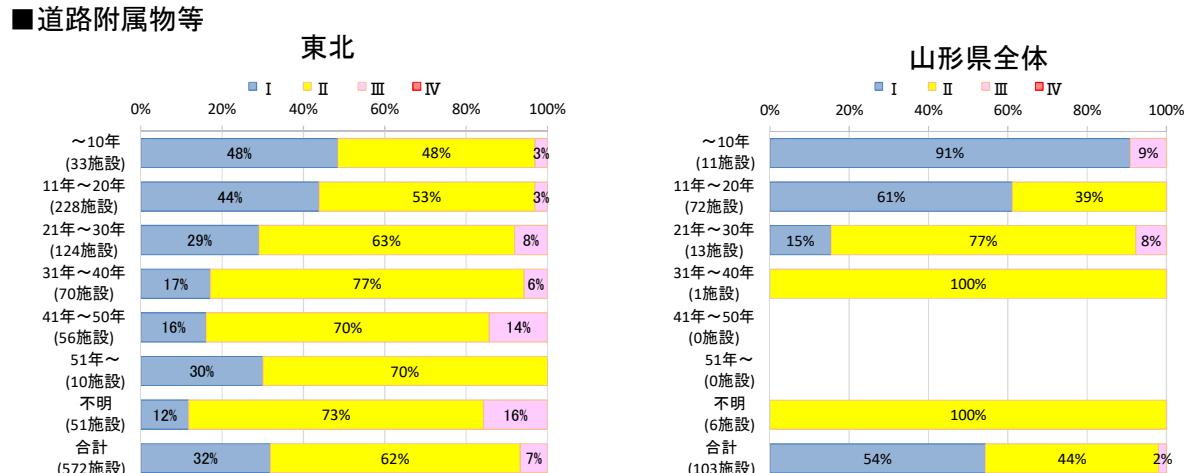


図7-18 2巡目(2019～2020年度)点検実施施設における建設年数別の遷移状況

## (6) 直近5年間（2016～2020年度）道路管理者別点検結果内訳

### ■橋梁

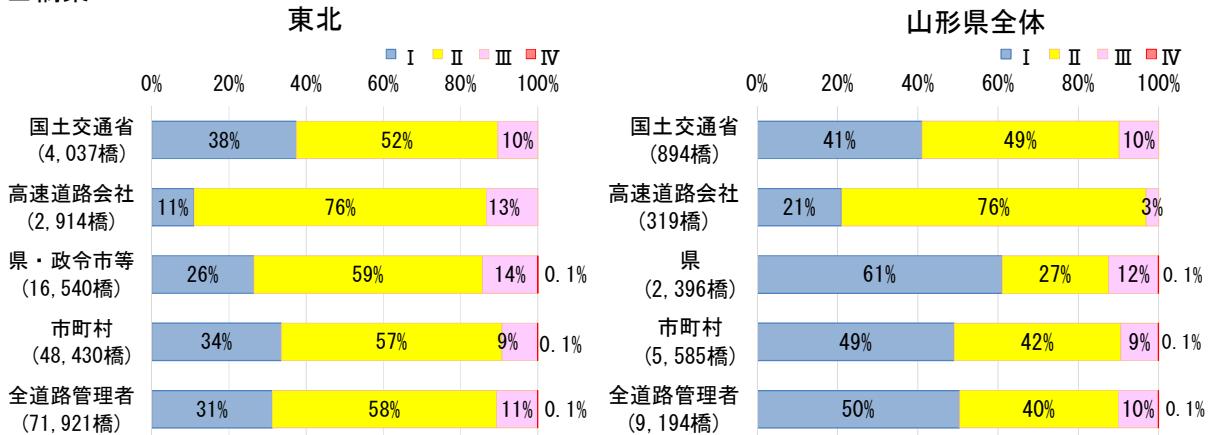


図7-19 直近5年間（2016～2020年度）道路管理者別点検結果内訳

### ■トンネル

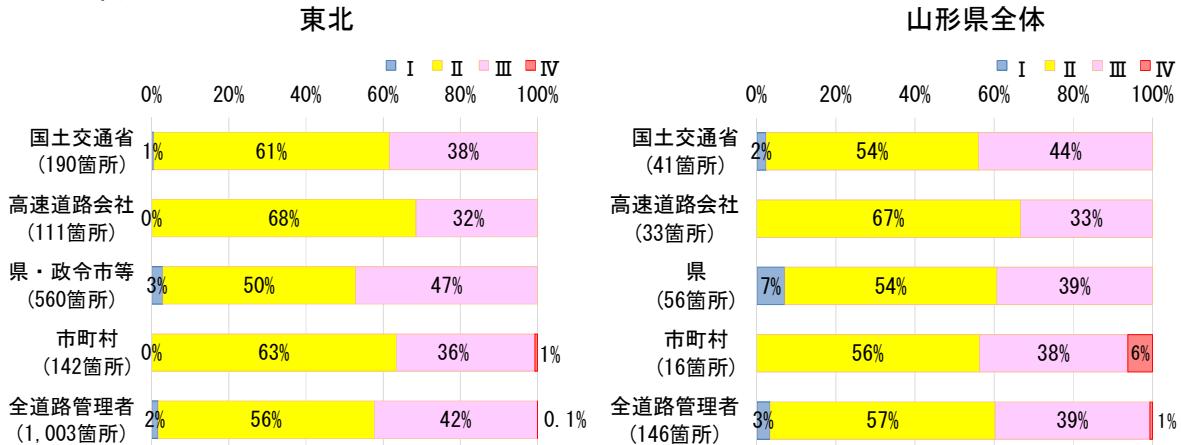


図7-20 直近5年間（2016～2020年度）道路管理者別点検結果内訳

### ■道路附属物等

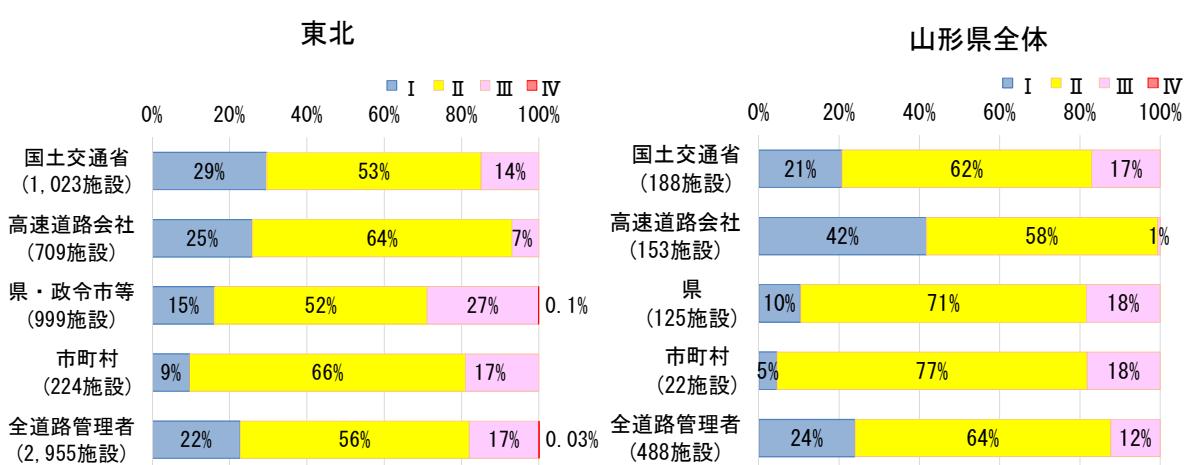


図7-21 直近5年間（2016～2020年度）道路管理者別点検結果内訳

(7) 直近5年間(2016～2020年度)点検実施施設における建設年数別の遷移状況



図7-22 直近5年間(2016～2020年度)点検実施施設における建設年数別の判定区分の遷移状況

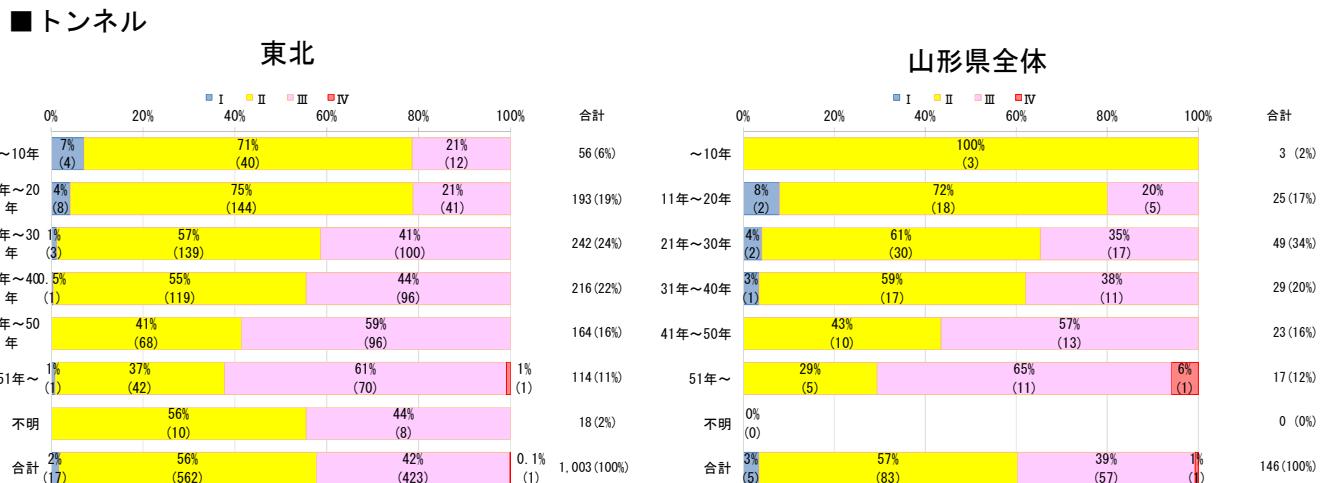


図7-23 直近5年間(2016～2020年度)点検実施施設における建設年数別の判定区分の遷移状況

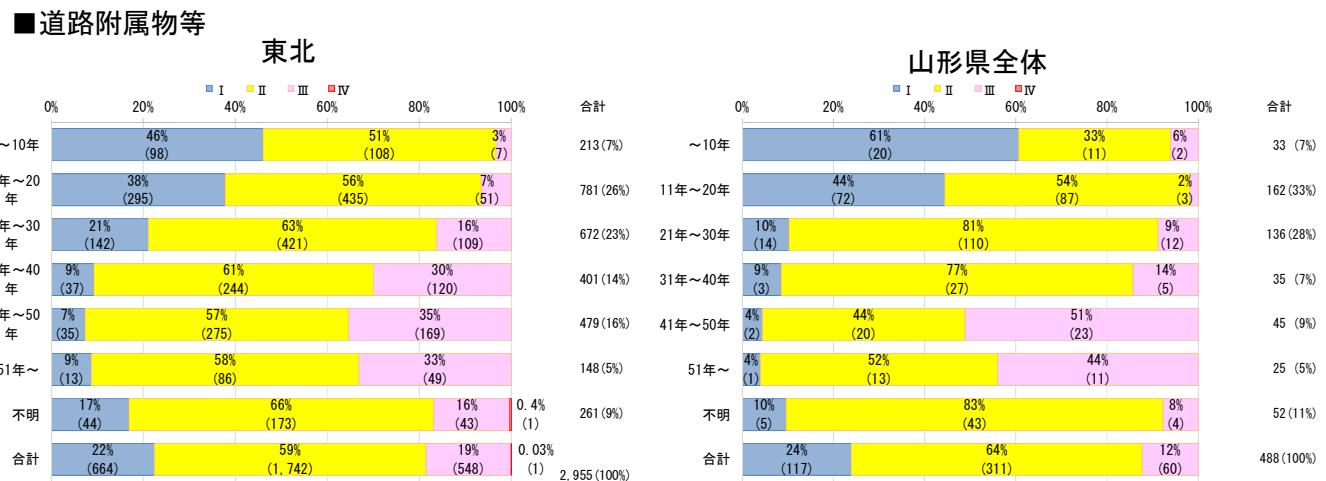


図7-24 直近5年間(2016～2020年度)点検実施施設における建設年数別の判定区分の遷移状況

## (8) 部材ごとの点検結果内訳（橋梁）

### 1) 凍結抑制剤による部材への影響

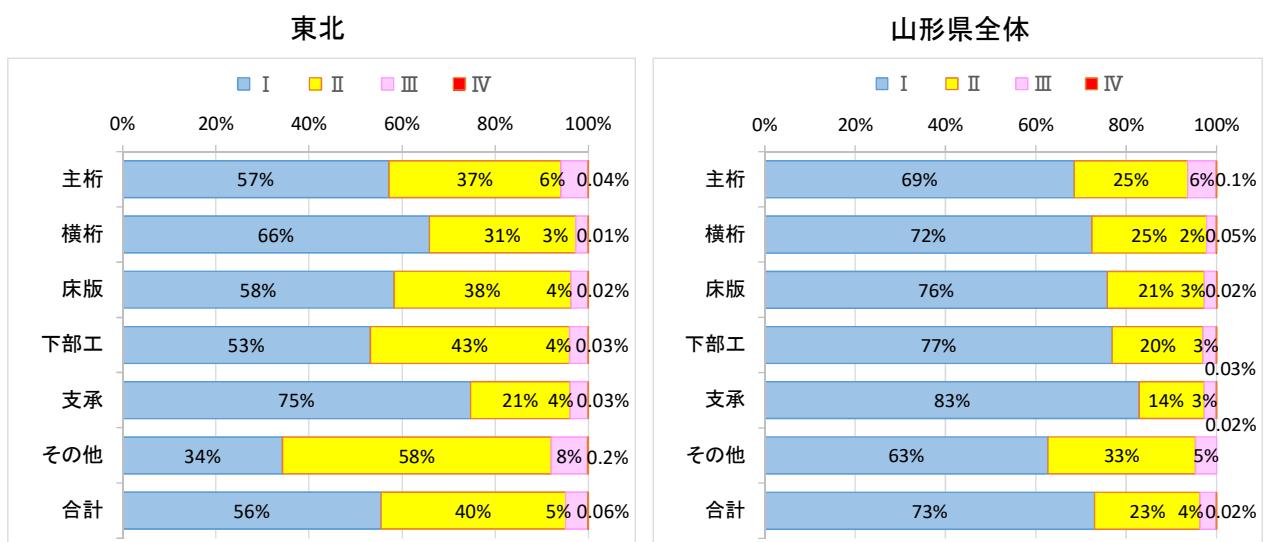


図 7-25 部材ごとの判定区分【散布量 20t/km/年未満】

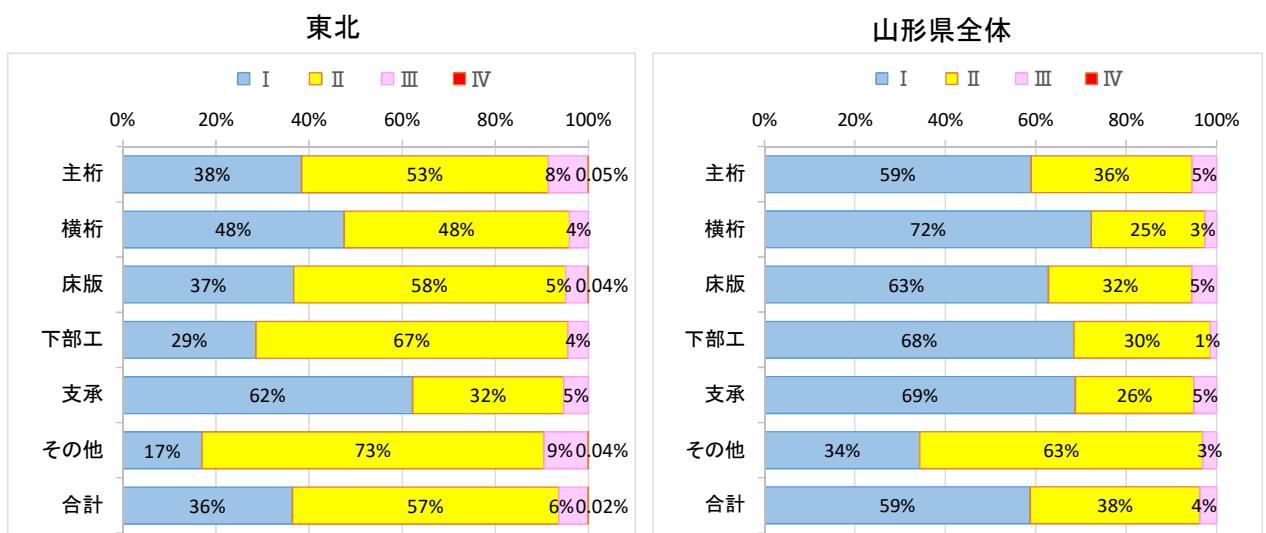


図 7-26 部材ごとの判定区分【散布量 20t/km/年以上】

※2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度データをもとに集計

※凍結抑制剤散布量は聞き取り調査の結果、散布量不明のデータを除外した集計値

※その他；伸縮装置、地覆、高欄等の付属物

## 2) 塩害による部材への影響

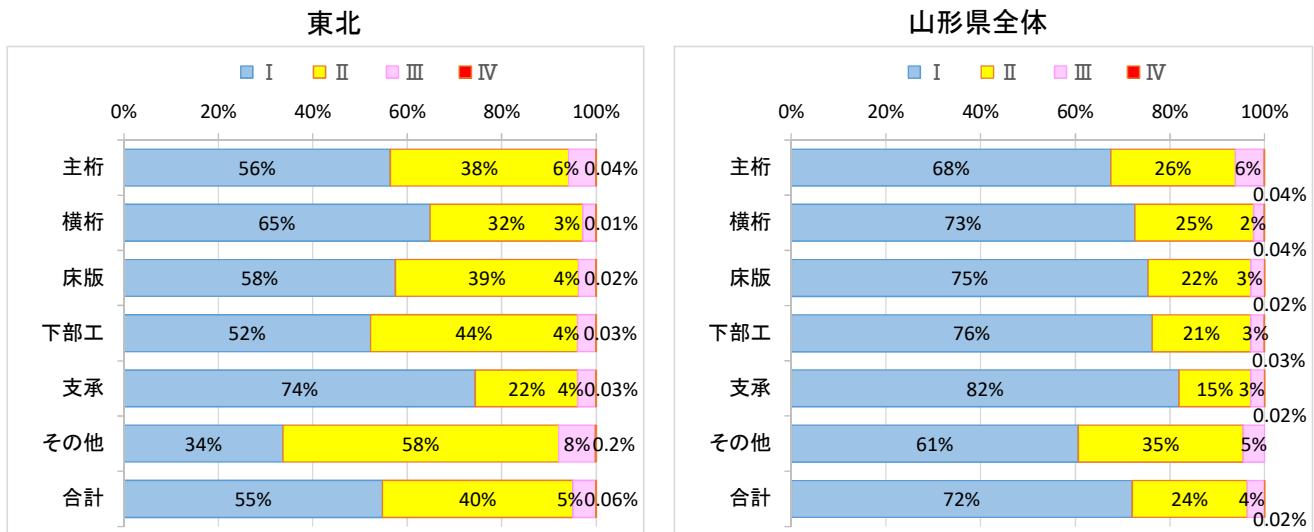


図 7-27 部材ごとの判定区分【非塩害地域】

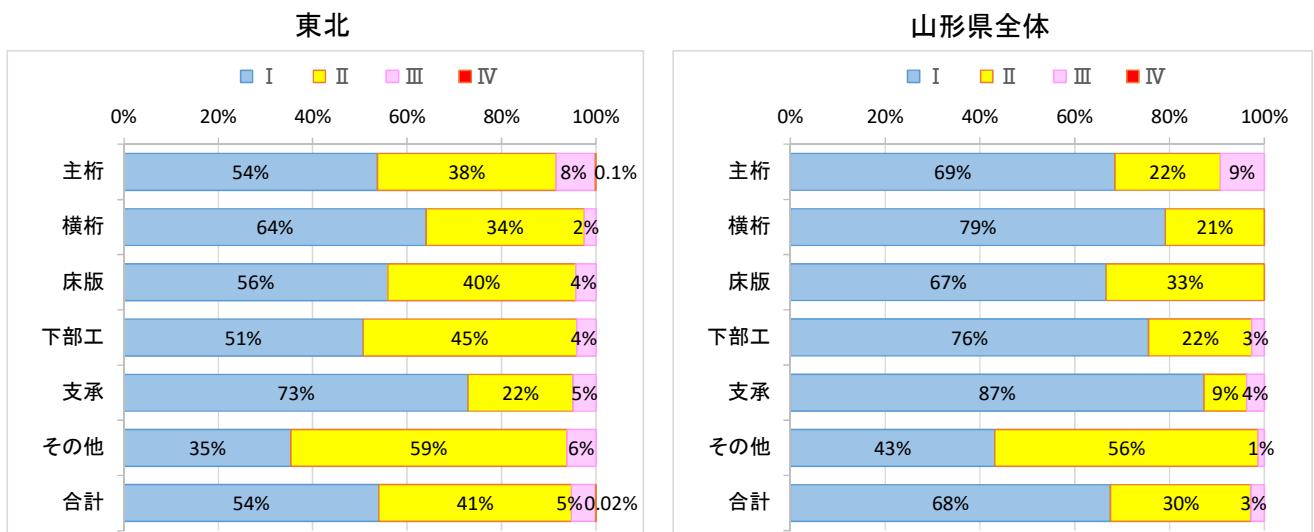


図 7-28 部材ごとの判定区分【塩害地域】

※部材ごと内訳は、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度データをもとに集計  
※塩害の影響地域の区分は「橋、高架の道路等の技術基準」Ⅲコンクリート部材編 表-6.2.3  
より以下のとおり分類する。

非塩害地域：対策区分S、I、II、IIIに該当しない地域

塩害地域：対策区分S、I、II、IIIに該当する地域

※その他：伸縮装置、地覆、高欄等の付属物

(9) 判定区分III・IVの部材ごと内訳（橋梁）

■橋梁

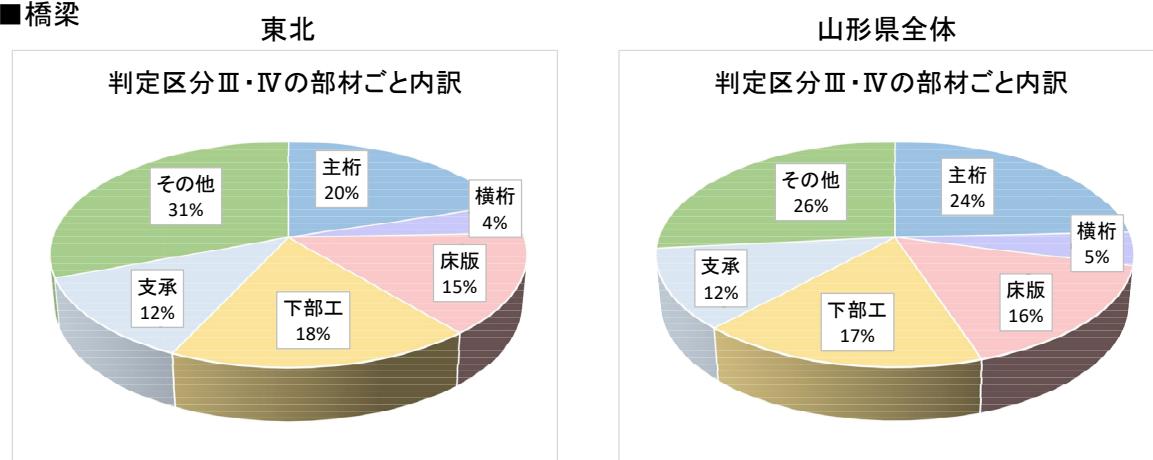


図7-29 判定区分III・IVの部材ごと内訳（全橋種）【橋梁】

東北

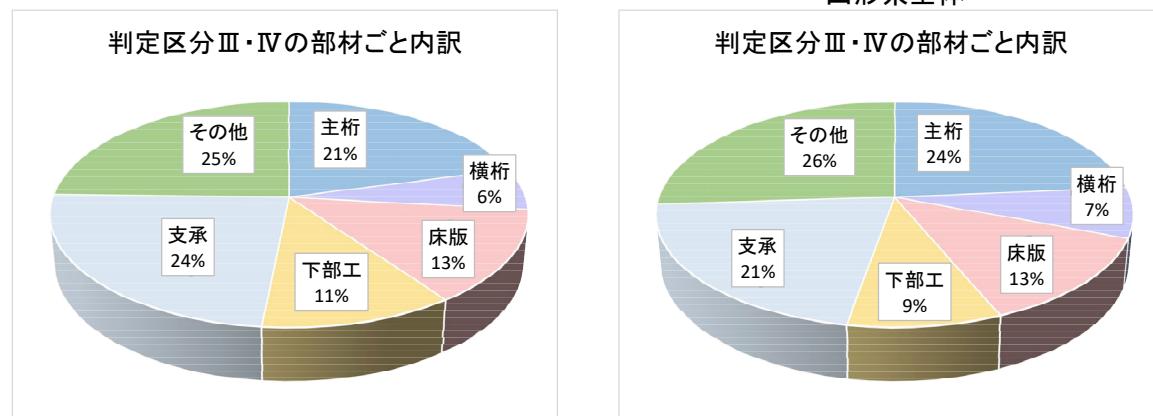


図7-30 判定区分III・IVの部材ごと内訳（鋼橋）【橋梁】

東北

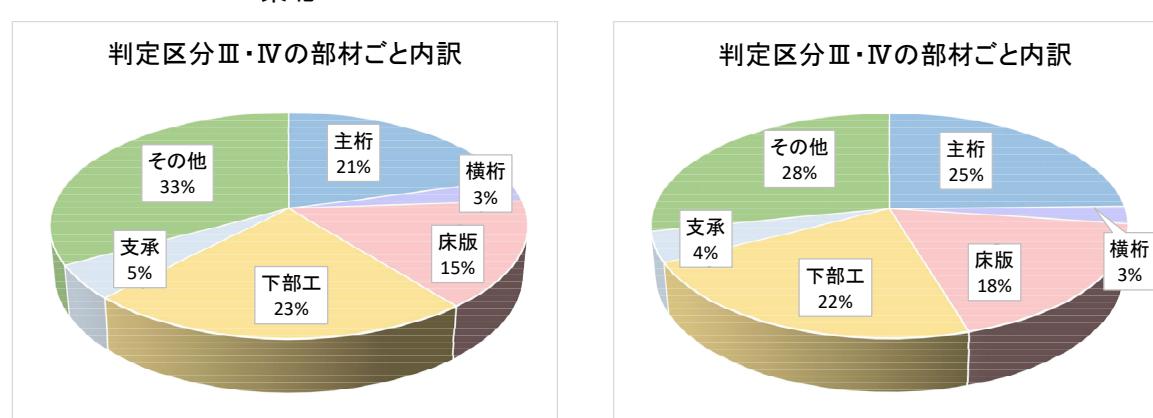


図7-31 判定区分III・IVの部材ごと内訳（コンクリート橋）【橋梁】

※2017年度、2018年度、2019年度、2020年度データをもとに集計  
※その他；伸縮装置、地覆、高欄等の付属物

## 8 巻末資料

(1) 道路管理者別の管理施設数 .....	55
(2) 2 巡目（2019～2020 年度）道路管理者別の点検結果 .....	56
(3) 直近 5 年間（2016～2020 年度）道路管理者別の点検結果 .....	59
(4) 道路管理者別の 1 巡目点検施設の修繕等措置の実施状況 .....	62
(5) 判定区分IVの施設リスト（2014 年度～2020 年度） .....	65
(6) 橋梁・トンネルの建設年度別施設数 .....	68
(7) 各都道府県における道路管理者毎の老朽化対策状況 .....	70
(8) 全国道路構造物情報マップ（損傷マップ） .....	71

(1) 道路管理者別の管理施設数

管理者	管理者名	管理施設数						
		橋梁	トンネル	道路附属物等	シェッド	大型カルバート	横断歩道橋	門型標識等
国土交通省	山形河川国道事務所	698	24	139	19	52	30	38
	酒田河川国道事務所	238	18	62	9	7	8	38
	湯沢河川国道事務所	0	1	0	0	0	0	0
	福島河川国道事務所	25	3	18	0	14	0	4
	国 小計	961	46	219	28	73	38	80
高速道路会社	NEXCO 東日本	337	40	172	14	124	0	34
県	山形県	2,433	56	126	26	24	24	52
	福島県	0	1	0	0	0	0	0
	県 小計	2,433	57	126	26	24	24	52
市町村	山形市	358	2	5	0	2	0	3
	米沢市	303	0	1	0	0	1	0
	鶴岡市	834	5	3	3	0	0	0
	酒田市	489	1	0	0	0	0	0
	新庄市	118	0	0	0	0	0	0
	寒河江市	142	0	0	0	0	0	0
	上山市	175	0	0	0	0	0	0
	村山市	130	0	0	0	0	0	0
	長井市	249	2	1	0	0	1	0
	天童市	137	0	4	0	4	0	0
	東根市	105	0	2	1	1	0	0
	尾花沢市	134	1	0	0	0	0	0
	南陽市	188	0	0	0	0	0	0
	山辺町	65	0	0	0	0	0	0
	中山町	54	0	0	0	0	0	0
	河北町	57	0	0	0	0	0	0
	西川町	91	0	2	2	0	0	0
	朝日町	57	0	0	0	0	0	0
	大江町	98	0	0	0	0	0	0
	大石田町	31	0	0	0	0	0	0
	金山町	81	1	0	0	0	0	0
	最上町	65	0	0	0	0	0	0
	舟形町	51	0	1	0	1	0	0
	真室川町	109	0	0	0	0	0	0
	大蔵村	43	1	0	0	0	0	0
	鮭川村	48	0	0	0	0	0	0
	戸沢村	58	0	0	0	0	0	0
	高畠町	307	1	3	0	3	0	0
	川西町	287	0	0	0	0	0	0
	小国町	163	3	0	0	0	0	0
	白鷹町	154	0	0	0	0	0	0
	飯豊町	168	0	0	0	0	0	0
	三川町	72	0	0	0	0	0	0
	庄内町	200	0	0	0	0	0	0
	遊佐町	117	1	0	0	0	0	0
	市町村 小計	5,738	18	22	6	11	2	3
	合計	9,469	161	539	74	232	64	169

2021.3 末時点

(2) 2巡目(2019~2020年度)道路管理者別の点検結果

■橋梁

表8-1 2巡目(2019~2020年度)道路管理者別の点検結果

管理者名	判定区分				
	I	II	III	IV	合計
山形河川国道事務所	100	150	23	0	273
酒田河川国道事務所	37	43	6	0	86
国土交通省	137	193	29	0	359
高速道路会社	49	84	2	0	135
山形県	381	292	160	1	834
山形市	43	101	26	0	170
米沢市	23	38	9	0	70
鶴岡市	206	118	31	0	355
酒田市	248	201	35	0	484
新庄市	0	0	0	0	0
寒河江市	20	25	2	1	48
上山市	46	64	9	0	119
村山市	65	27	4	0	96
長井市	15	9	2	0	26
天童市	35	27	8	0	70
東根市	10	18	2	0	30
尾花沢市	4	14	5	0	23
南陽市	18	46	6	0	70
山辺町	15	29	3	0	47
中山町	18	27	0	0	45
河北町	0	0	0	0	0
西川町	9	20	4	1	34
朝日町	13	30	9	0	52
大江町	6	13	0	0	19
大石田町	0	4	1	0	5
金山町	12	12	0	0	24
最上町	17	25	7	0	49
舟形町	22	19	8	0	49
真室川町	0	0	0	0	0
大蔵村	24	12	4	0	40
鮎川村	0	0	0	0	0
戸沢村	0	53	4	0	57
高畠町	32	26	2	0	60
川西町	6	19	31	0	56
小国町	4	15	12	0	31
白鷹町	37	32	1	0	70
飯豊町	25	72	19	0	116
三川町	7	52	13	0	72
庄内町	97	72	7	0	176
遊佐町	0	0	0	0	0
合計	1,644	1,789	455	3	3,891

2021.3末時点

■トンネル

表8－2 2巡目（2019～2020年度）道路管理者別の点検結果

管理者名	判定区分				
	I	II	III	IV	合計
山形河川国道事務所	0	7	3	0	10
酒田河川国道事務所	0	5	2	0	7
湯沢河川国道事務所	0	0	0	0	0
福島河川国道事務所	0	0	1	0	1
国土交通省	0	12	6	0	18
高速道路会社	0	15	2	0	17
山形県	0	0	0	0	0
福島県	0	0	1	0	1
山形市	0	2	0	0	2
米沢市	0	0	0	0	0
鶴岡市	0	0	0	0	0
酒田市	0	0	0	0	0
新庄市	0	0	0	0	0
寒河江市	0	0	0	0	0
上山市	0	0	0	0	0
村山市	0	0	0	0	0
長井市	0	0	0	0	0
天童市	0	0	0	0	0
東根市	0	0	0	0	0
尾花沢市	0	0	0	0	0
南陽市	0	0	0	0	0
山辺町	0	0	0	0	0
中山町	0	0	0	0	0
河北町	0	0	0	0	0
西川町	0	0	0	0	0
朝日町	0	0	0	0	0
大江町	0	0	0	0	0
大石田町	0	0	0	0	0
金山町	0	0	0	0	0
最上町	0	0	0	0	0
舟形町	0	0	0	0	0
真室川町	0	0	0	0	0
大蔵村	0	0	0	0	0
鮭川村	0	0	0	0	0
戸沢村	0	0	0	0	0
高畠町	0	0	0	0	0
川西町	0	0	0	0	0
小国町	0	0	0	0	0
白鷹町	0	0	0	0	0
飯豊町	0	0	0	0	0
三川町	0	0	0	0	0
庄内町	0	0	0	0	0
遊佐町	0	0	0	0	0
合計	0	29	9	0	38

2021.3末時点

## ■道路附属物等

表8－3 2巡目（2019～2020年度）道路管理者別の点検結果

管理者名	判定区分				
	I	II	III	IV	合計
山形河川国道事務所	7	2	0	0	9
酒田河川国道事務所	9	13	7	0	29
福島河川国道事務所	0	1	0	0	1
国土交通省	16	16	7	0	39
高速道路会社	54	34	1	0	89
山形県	0	5	7	0	12
山形市	0	3	0	0	3
米沢市	0	0	0	0	0
鶴岡市	1	2	0	0	3
酒田市	0	0	0	0	0
新庄市	0	0	0	0	0
寒河江市	0	0	0	0	0
上山市	0	0	0	0	0
村山市	0	0	0	0	0
長井市	0	0	0	0	0
天童市	0	0	0	0	0
東根市	0	0	0	0	0
尾花沢市	0	0	0	0	0
南陽市	0	0	0	0	0
山辺町	0	0	0	0	0
中山町	0	0	0	0	0
河北町	0	0	0	0	0
西川町	0	2	0	0	2
朝日町	0	0	0	0	0
大江町	0	0	0	0	0
大石田町	0	0	0	0	0
金山町	0	0	0	0	0
最上町	0	0	0	0	0
舟形町	0	0	0	0	0
真室川町	0	0	0	0	0
大蔵村	0	0	0	0	0
鮭川村	0	0	0	0	0
戸沢村	0	0	0	0	0
高畠町	0	0	0	0	0
川西町	0	0	0	0	0
小国町	0	0	0	0	0
白鷹町	0	0	0	0	0
飯豊町	0	0	0	0	0
三川町	0	0	0	0	0
庄内町	0	0	0	0	0
遊佐町	0	0	0	0	0
合計	71	62	15	0	148

2021.3末時点

(3) 直近5年間(2016～2020年度)道路管理者別の点検結果

■橋梁

表8-4 直近5年間(2016～2020年度)道路管理者別の点検結果

管理者名	判定区分				
	I	II	III	IV	合計
山形河川国道事務所	251	340	71	0	662
酒田河川国道事務所	116	99	17	0	232
国土交通省	367	439	88	0	894
高速道路会社	67	242	10	0	319
山形県	1,462	635	297	2	2,396
山形市	128	151	69	0	348
米沢市	127	156	17	0	300
鶴岡市	522	238	66	0	826
酒田市	248	201	35	0	484
新庄市	53	61	4	0	118
寒河江市	54	77	8	1	140
上山市	79	83	12	0	174
村山市	68	29	7	0	104
長井市	127	106	14	0	247
天童市	52	32	8	0	92
東根市	38	47	16	0	101
尾花沢市	74	45	12	2	133
南陽市	71	86	27	0	184
山辺町	25	33	4	0	62
中山町	25	29	0	0	54
河北町	30	25	2	0	57
西川町	38	43	6	1	88
朝日町	14	31	10	0	55
大江町	42	43	12	0	97
大石田町	20	7	2	0	29
金山町	43	32	6	0	81
最上町	29	28	8	0	65
舟形町	22	19	8	0	49
真室川町	45	52	10	0	107
大蔵村	24	12	4	0	40
鮎川村	21	17	8	0	46
戸沢村	0	53	4	0	57
高畠町	186	99	22	0	307
川西町	168	85	32	2	287
小国町	55	88	18	0	161
白鷹町	94	50	1	0	145
飯豊町	41	91	34	0	166
三川町	7	52	13	0	72
庄内町	102	79	11	0	192
遊佐町	69	39	8	1	117
合計	4,637	3,635	913	9	9,194

2021.3末時点

■ トンネル

表 8－5 直近 5 年間（2016～2020 年度）道路管理者別の点検結果

管理者名	判定区分				
	I	II	III	IV	合計
山形河川国道事務所	0	9	14	0	23
酒田河川国道事務所	1	13	2	0	16
湯沢河川国道事務所	0	0	1	0	1
福島河川国道事務所	0	0	1	0	1
国土交通省	1	22	18	0	41
高速道路会社	0	22	11	0	33
山形県	4	30	21	0	55
福島県	0	0	1	0	1
山形市	0	2	0	0	2
米沢市	0	0	0	0	0
鶴岡市	0	3	0	1	4
酒田市	0	0	0	0	0
新庄市	0	0	0	0	0
寒河江市	0	0	0	0	0
上山市	0	0	0	0	0
村山市	0	0	0	0	0
長井市	0	1	1	0	2
天童市	0	0	0	0	0
東根市	0	0	0	0	0
尾花沢市	0	1	0	0	1
南陽市	0	0	0	0	0
山辺町	0	0	0	0	0
中山町	0	0	0	0	0
河北町	0	0	0	0	0
西川町	0	0	0	0	0
朝日町	0	0	0	0	0
大江町	0	0	0	0	0
大石田町	0	0	0	0	0
金山町	0	0	1	0	1
最上町	0	0	0	0	0
舟形町	0	0	0	0	0
真室川町	0	0	0	0	0
大蔵村	0	1	0	0	1
鮎川村	0	0	0	0	0
戸沢村	0	0	0	0	0
高畠町	0	0	1	0	1
川西町	0	0	0	0	0
小国町	0	1	2	0	3
白鷹町	0	0	0	0	0
飯豊町	0	0	0	0	0
三川町	0	0	0	0	0
庄内町	0	0	0	0	0
遊佐町	0	0	1	0	1
合計	5	83	57	1	146

2021.3 末時点

■道路附属物等

表8－6 直近5年間（2016～2020年度）道路管理者別の点検結果

管理者名	判定区分				
	I	II	III	IV	合計
山形河川国道事務所	26	85	21	0	132
酒田河川国道事務所	13	30	9	0	52
福島河川国道事務所	0	2	2	0	4
国土交通省	39	117	32	0	188
高速道路会社	64	88	1	0	153
山形県	13	89	23	0	125
山形市	0	5	0	0	5
米沢市	0	0	1	0	1
鶴岡市	1	2	0	0	3
酒田市	0	0	0	0	0
新庄市	0	0	0	0	0
寒河江市	0	0	0	0	0
上山市	0	0	0	0	0
村山市	0	0	0	0	0
長井市	0	1	0	0	1
天童市	0	3	1	0	4
東根市	0	1	1	0	2
尾花沢市	0	0	0	0	0
南陽市	0	0	0	0	0
山辺町	0	0	0	0	0
中山町	0	0	0	0	0
河北町	0	0	0	0	0
西川町	0	2	0	0	2
朝日町	0	0	0	0	0
大江町	0	0	0	0	0
大石田町	0	0	0	0	0
金山町	0	0	0	0	0
最上町	0	0	0	0	0
舟形町	0	1	0	0	1
真室川町	0	0	0	0	0
大蔵村	0	0	0	0	0
鮭川村	0	0	0	0	0
戸沢村	0	0	0	0	0
高畠町	0	2	1	0	3
川西町	0	0	0	0	0
小国町	0	0	0	0	0
白鷹町	0	0	0	0	0
飯豊町	0	0	0	0	0
三川町	0	0	0	0	0
庄内町	0	0	0	0	0
遊佐町	0	0	0	0	0
合計	117	311	60	0	488

2021.3末時点







(5) 判定区分IVの施設リスト (2014年度～2020年度)

■橋梁

○判定区分IVの橋梁の措置状況（予定含む）

管理者	計	管理中				撤去・ 廃止等 ※2	計
		修繕・ 架替	撤去・ 廃止	機能転換 ※1	対応未定		
国土交通省	1	1	0	0	0	0	1
県	2	2	0	0	0	0	2
市町村	14	10	3	0	1	1	15
合計	17	13	3	0	1	1	18

※1：機能転換とは、既存の施設を、他の施設として利用すること。

※2：判定後、撤去・廃止により管理施設から除外されたもの。

※高速道路会社管理の橋梁は健全度IVの施設なし。

○国土交通省（1橋）

管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の具体的な内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置(2021.3月末時点)
東北地方整備局	さかいだこせんきょう 堺田跨線橋	国道47号	1970	2014	下フランジ及び支点上補剛材の一部が欠損。支承にも著しい腐食	仮受け材の設置	修繕済

○県（2橋）

管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の具体的な内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置(2021.3月末時点)
山形県	にだやまばし 仁田山橋	県道土内五日町線	1961	2017	主桁端部に一部欠損を伴うせん断ひびわれが発生した	全面通行止 迂回路設置	修繕済
山形県	ふくしませんきょう 福島跨線橋	県道比子八幡線	1981	2020	主桁、横桁、支承の腐食・欠損	仮受け材の設置（通行規制（車両））	修繕予定

○市町村（15橋）

管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の具体的な内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置(2021.3月末時点)
鶴岡市 (山形県)	むかいだはし 向田橋	市道木野俣線	1962	2014	主桁の剥離、鉄筋露出	通行規制（片側）	撤去済
酒田市 (山形県)	みやうちばし 宮内橋	市道官内3号線	1968	2014	主桁の腐食	全面通行止	修繕済
酒田市 (山形県)	はやつかばし 早塚橋	市道手蔵田久保田線	1969	2014	主桁の腐食	全面通行止	修繕済
寒河江市 (山形県)	しばや ごうきょう 柴屋2号橋	幸生4号線	1961	2020	パイルベントの欠損	全面通行止	撤去中

管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の具体的な内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置(2021.3月末時点)
尾花沢市 (山形県)	かじかはし 河恭橋	市道IV-705号線	1935	2016	床版の鉄筋露出	全面通行止	修繕済
尾花沢市 (山形県)	ごうばし 4-706-1号橋	市道IV-706号線	1964	2016	下部工の洗堀	全面通行止	修繕済
西川町 (山形県)	おおいりまがわばし 大入間川橋	月岡入間線	1965	2019	橋脚の洗堀による沈下・傾斜	全面通行止	架替中
朝日町 (山形県)	のぞくら橋	町道朝日線	1965	2015	支承の機能障害	全面通行止	修繕済
大蔵村 (山形県)	かみやまばし 上山橋	村道沼ノ台上山線	1977	2015	橋台の変状	全面通行止	修繕済
川西町 (山形県)	にしょこみちばし 西横道橋	町道西横道線	1980	2016	下部工の移動、鉄筋露出	全面通行止	修繕済
川西町 (山形県)	さかみずばし 坂水橋	町道道祖神坂水橋線	1968	2016	橋脚の鉄筋露出 支承の機能障害	全面通行止	未定
川西町 (山形県)	つづきばし 続橋	町道高橋七裏線	1978	2017	A1橋台が川側に傾斜。洗堀等があった場合、橋台転倒や落橋等の恐れあり	全面通行止	架替済
白鷹町 (山形県)	たなべばし 田辺橋	町道田辺寺前線	1980	2015	主桁、床版のひびわれ	全面通行止	架替済
白鷹町 (山形県)	たいへいばし 大平橋	町道大平橋線	1964	2015	高欄、床版の腐食及び断面欠損	全面通行止	撤去中
遊佐町 (山形県)	さかえばし 栄橋	町道白木宮海線	1956	2016	主桁の腐食、鉄筋露出、うき、支承の機能障害	全面通行止	撤去予定

■トンネル

○判定区分Ⅳのトンネルの措置状況（予定含む）

管理者	計	管理中			撤去・ 廃止等 ※1	計
		修繕	撤去・ 廃止	対応未定		
市町村	1	1	0	0	0	1

※1：判定後、撤去・廃止により管理施設から除外されたもの。

※国土交通省、高速道路会社、県管理のトンネルは健全度Ⅳの施設なし。

○市町村（1箇所）

管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の具体的な内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置(2021.3月末時点)
鶴岡市 (山形県)	釜谷坂隧道	市道温海釜谷坂線	1954	2018	アーチ部の材質劣化	全面通行止	修繕中

■道路附属物等（0施設）

(6) 橋梁・トンネルの建設年度別施設数

■橋梁

建設年度	国土 交通省	高速 道路会社	県	市町村
1920 以前	0	0	3	5
1921	0	0	0	1
1922	0	0	1	1
1923	0	0	0	4
1924	0	0	3	1
1925	0	0	0	2
1926	0	0	6	7
1927	0	0	7	3
1928	0	0	8	8
1929	0	0	4	5
1930	0	0	7	31
1931	1	0	11	19
1932	0	0	15	11
1933	0	0	7	18
1934	0	0	2	7
1935	0	0	12	18
1936	0	0	5	5
1937	0	0	7	5
1938	0	0	9	5
1939	0	0	8	8
1940	0	0	3	5
1941	1	0	4	5
1942	0	0	1	1
1943	0	0	0	6
1944	0	0	0	1
1945	0	0	0	9
1946	0	0	0	0
1947	0	0	1	5
1948	0	0	0	0
1949	0	0	2	6
1950	0	0	2	21
1951	0	0	3	9
1952	0	0	8	19
1953	0	0	1	12
1954	0	0	7	19
1955	2	0	5	31
1956	2	0	17	22
1957	0	0	10	23
1958	8	0	22	43
1959	5	0	18	51
1960	3	0	17	91
1961	4	0	36	33
1962	15	0	49	54
1963	11	0	42	56
1964	6	0	33	60
1965	20	0	41	113
1966	15	0	39	81
1967	34	0	33	88
1968	39	0	48	142
1969	23	0	64	120
1970	36	0	51	211
1971	41	0	81	167

建設年度	国土 交通省	高速 道路会社	県	市町村
1972	29	0	113	188
1973	32	0	77	174
1974	15	0	76	140
1975	16	0	48	141
1976	17	0	36	124
1977	20	0	36	116
1978	24	0	56	146
1979	28	0	55	136
1980	15	0	54	232
1981	9	2	63	115
1982	6	0	51	270
1983	11	0	51	123
1984	10	0	46	78
1985	17	1	29	85
1986	7	2	56	81
1987	14	0	36	63
1988	12	14	53	86
1989	4	30	39	89
1990	5	12	31	96
1991	11	14	46	77
1992	16	0	54	113
1993	2	0	30	73
1994	7	2	35	85
1995	2	3	32	69
1996	6	26	39	66
1997	10	54	33	76
1998	26	26	46	58
1999	12	20	28	55
2000	27	7	43	79
2001	23	20	31	65
2002	27	82	22	50
2003	11	0	31	31
2004	25	0	20	51
2005	7	0	13	25
2006	7	0	14	16
2007	17	0	18	26
2008	28	0	13	15
2009	13	1	13	18
2010	16	2	13	10
2011	10	0	15	7
2012	13	2	19	11
2013	11	0	7	10
2014	9	0	11	9
2015	1	0	9	8
2016	1	0	11	18
2017	31	0	7	14
2018	32	0	4	10
2019	0	17	4	3
2020	0	0	6	5
2021	0	0	0	0
不明	3	0	7	434
総計	961	337	2,433	5,738

2021.3末時点

■トンネル



建設年度	国土 交通省	高速 道路会社	県	市町村
1920 以前	0	0	0	0
1921	0	0	0	0
1922	0	0	0	0
1923	0	0	0	1
1924	0	0	0	0
1925	0	0	0	0
1926	0	0	0	0
1927	0	0	0	0
1928	0	0	0	1
1929	0	0	0	0
1930	0	0	0	0
1931	0	0	1	0
1932	0	0	0	0
1933	0	0	0	0
1934	0	0	0	0
1935	0	0	0	0
1936	0	0	0	0
1937	0	0	0	0
1938	0	0	0	0
1939	0	0	0	0
1940	0	0	0	0
1941	0	0	0	0
1942	0	0	0	0
1943	0	0	0	0
1944	0	0	0	0
1945	0	0	0	0
1946	0	0	0	0
1947	0	0	0	1
1948	0	0	0	0
1949	0	0	0	0
1950	0	0	0	0
1951	0	0	0	0
1952	0	0	1	0
1953	0	0	1	1
1954	0	0	0	1
1955	0	0	0	0
1956	0	0	0	0
1957	0	0	0	0
1958	0	0	0	0
1959	1	0	0	0
1960	0	0	0	0
1961	1	0	0	0
1962	0	0	1	0
1963	0	0	0	0
1964	1	0	0	0
1965	0	0	0	2
1966	2	0	0	0
1967	0	0	1	0
1968	0	0	1	0
1969	0	0	0	0
1970	2	0	0	0
1971	0	0	0	0

建設年度	国土 交通省	高速 道路会社	県	市町村
1972	3	0	1	0
1973	1	0	1	0
1974	6	0	0	0
1975	2	0	0	1
1976	1	0	1	0
1977	1	0	0	0
1978	0	0	1	0
1979	1	0	1	0
1980	2	0	1	0
1981	1	0	0	0
1982	0	0	1	0
1983	1	0	2	0
1984	2	0	3	0
1985	0	0	2	0
1986	0	0	2	0
1987	0	0	2	0
1988	2	0	3	1
1989	0	0	4	1
1990	1	0	2	1
1991	0	12	2	0
1992	0	0	0	0
1993	0	0	3	0
1994	1	0	0	0
1995	0	0	3	0
1996	0	0	1	0
1997	0	1	2	0
1998	0	5	1	1
1999	1	9	2	3
2000	1	1	0	0
2001	0	0	1	1
2002	1	5	3	1
2003	1	0	1	0
2004	0	0	0	1
2005	1	0	0	0
2006	2	0	1	0
2007	2	0	1	0
2008	0	0	1	0
2009	2	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	2	0	1	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	1	0	1	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	7	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
不明	0	0	0	0
総計	46	40	57	18

2021.3 末時点

## (7) 各都道府県における道路管理者毎の老朽化対策状況

山形県における道路管理者毎（国土交通省、高速道路会社、都道府県、市町村）の老朽化対策状況（橋梁、トンネル、道路附属物等の判定区分や措置状況等）を視覚化した情報を初公開。

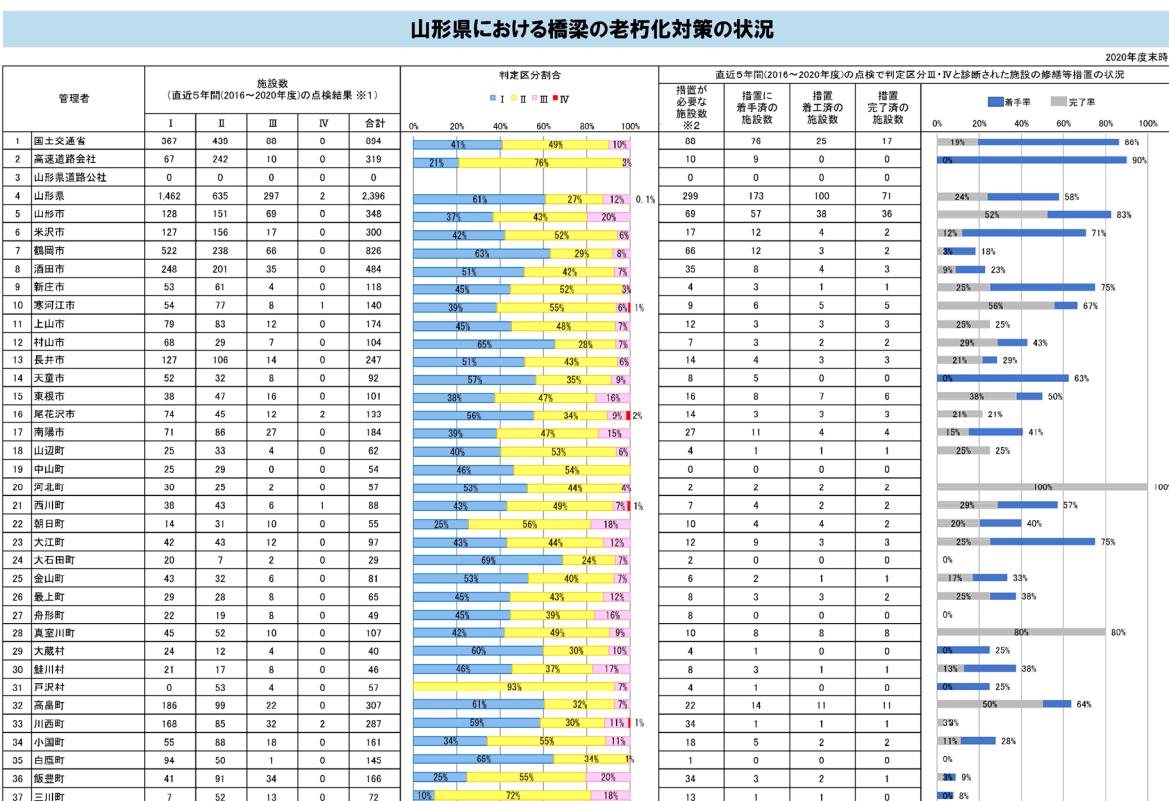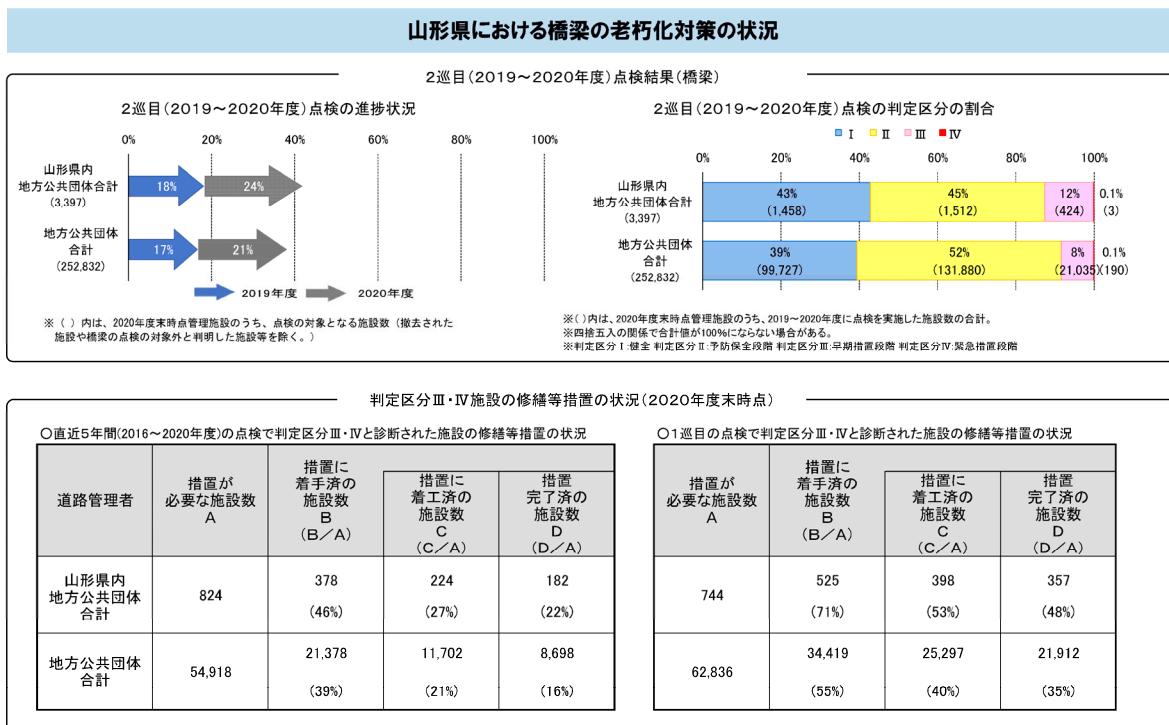

## (8) 全国道路構造物情報マップ（損傷マップ）

直近5年間（2016～2020年度）の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された橋梁、トンネル、道路附属物等の諸元や点検結果、措置状況等を地図上で閲覧できる「全国道路構造物情報マップ（損傷マップ）」を初公開。

施設アイコンをクリックで  
諸元・点検データ等の表示が可能

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査  
の重ね合わせ・区間属性の表示が可能

全国道路構造物情報マップ～損傷マップ～
利用規約

背景地図 (地理院タイル)
背景地図

※ 淡色地図
標準地図
白地図
写真

◆ 平成27年度全国道路・街路交通情勢調査  
ズームレベル12以降で表示可能

高速自動車国道
都市高速道路
一般国道 道路
一般国道 补助国

主要地方道(都道府県道・指定市道)
一般都道府県道・指定市の一般市道
重要物流道路(R2.4時点)

うち、直轄機関(太線表示)(R2.4時点)
代替・補完路(R2.4時点)

主要沿岸道路(R1.12時点)

施設・管理者ごとの表示  
や対策状況・判定区分で  
色分け表示が可能

全国
詳細

500m
1km

Copyright © 2021 MLIT Japan. All Rights Reserved.
国土地理院

地図に戻る

549件該当

施設名:  を含む
路線名:  を含む
管理者名:  を含む
取り込み表示

架設年度: 西暦～西暦
橋長(m):  ～ 
点検実施年度: 西暦～西暦

橋梁の諸元に関する検索項目

位置確認 | 種類 | 施設名 | 路線 | 管理者 | 行政区域 ||  | 種類 | 橋名 | (アリカナ) | 路線名 | 区分 | 管理者名 | 管理者事務所名 (地公室は任意) | 都道府県名 | 市区町村名 |  |

位置確認	種類	施設名	路線	管理者	行政区域					
MAP	橋梁	南浜橋	(ミミハシ)	一般国道130号線	都道府県	東京都	第一建設事務所	東京都	港区	35.6
MAP	橋梁	大和橋	(ヤハハシ)	新宿両国線(都道302号線)	都道府県	東京都	第一建設事務所	東京都	千代田区	35.6
MAP	橋梁	大井北郷陸橋(ランプ部4)	(オイノヒヨウリキョウ(ランプ部4))	日本橋芝浦大森線(都道3…	都道府県	東京都	第二建設事務所	東京都	品川区	35.6
MAP	橋梁	大井町跨線橋	(オイマチカセキヨウ)	駒沢大山線(都道420号線)	都道府県	東京都	第二建設事務所	東京都	品川区	35.6
MAP	橋梁	蒲田陸橋	(カタリカキヨウ)	環状八号線(都道311号線)	都道府県	東京都	第二建設事務所	東京都	大田区	35.5
MAP	橋梁	上野毛大橋	(ウミノオオハシ)	一般国道466号線	都道府県	東京都	第二建設事務所	東京都	世田谷区	35.6
MAP	橋梁	五輪橋	(ゴリハシ)	赤坂杉並線(都道413号線)	都道府県	東京都	第二建設事務所	東京都	渋谷区	35.6

一覧表形式での表示や検索が可能

## 山形県道路メンテナンス会議(構成機関)

山形県国土整備部道路保全課	真室川町建設課
山形県村山総合支庁建設部道路課	大蔵村地域整備課
山形県村山総合支庁建設部西村山道路計画課	鮎川村農村整備課
山形県村山総合支庁建設部北村山道路計画課	戸沢村建設水道課
山形県最上総合支庁建設部道路計画課	米沢市建設部土木課
山形県置賜総合支庁建設部道路計画課	南陽市建設課
山形県置賜総合支庁建設部西置賜道路計画課	高畠町建設課
山形県庄内総合支庁建設部道路計画課	川西町地域整備課
山形市都市整備部道路整備課・道路維持課	長井市建設課
上山市建設課	小国町地域整備課
天童市建設部建設課	白鷹町建設水道課
山辺町建設課	飯豊町地域整備課
中山町建設課	鶴岡市建設部土木課
寒河江市建設管理課	酒田市建設部土木課
河北町都市整備課	三川町建設環境課
西川町建設水道課	庄内町建設課
朝日町建設水道課	遊佐町地域生活課
大江町建設水道課	東日本高速道路(株)東北支社
村山市建設課	東北地方整備局道路部
東根市建設部建設課	東北地方整備局山形河川国道事務所
尾花沢市建設課	東北地方整備局酒田河川国道事務所
大石田町建設課	東北地方整備局福島河川国道事務所
新庄市都市整備課	(オブザーバー)
金山町環境整備課	(公財)山形県建設技術センター
最上町建設課	東北大大学院工学研究科
舟形町地域整備課	インフラマネジメント研究センター

会長 東北地方整備局山形河川国道事務所長

副会長 山形県国土整備部道路保全課長

事務局 山形県国土整備部道路保全課

東北地方整備局道路部

東北地方整備局山形河川国道事務所

東北地方整備局東北技術事務所

### 問い合わせ窓口（事務局）

○山形県国土整備部道路保全課 メンテナンス担当

電話 023-630-2608

○東北地方整備局山形河川国道事務所 メンテナンス担当

電話 023-688-8944 (内403)
