

雄物川上流河川激甚災害対策特別緊急事業

～2017年7月豪雨の治水対策～

湯沢河川国道事務所

2022.10.1現在

事業進捗率 (※事業費以外は、激特事業以前からの継続内容を含みます)

総事業費(約109億円)	100%	湯沢河川国道事務所分
堤防・構造物設計	100%	7地区設計完了
用地調査	100%	7地区調査完了
用地補償	99%	2022年度1地区実施中
堤防・構造物工事	93%	2022年度6地区実施中



第17回推進室調整会議 (2021.5.24開催)

秋田県




激特事業 概略工程

2022.10

	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
福部羅地区 連続堤(HWL-1m)L=6,800m	堤防・構造物						
正手沢地区 連続堤(HWL-1m)L=160m		治水対策検討中		用地調査	用地補償		堤防・堤防構造物
強首地区 連続堤(HWL-1m)L=3,750m	堤防・構造物設計	用地調査		用地補償		堤防・構造物	
寺館大巻地区 連続堤(HWL-1m)L=6,730m		用地補償			堤防・構造物		
岩瀬湯野沢地区 輪中堤(HWL)L=1,300m		用地調査		用地補償		堤防・構造物	
中村芦沢地区 連続堤(HWL-1m)L=3,650m		用地補償			堤防・構造物		
間倉地区 連続堤(完成堤)L=430m		堤防・構造物	★2019.11完成				
		用地補償					

※現時点での予定であり、今後の状況により随時更新します。

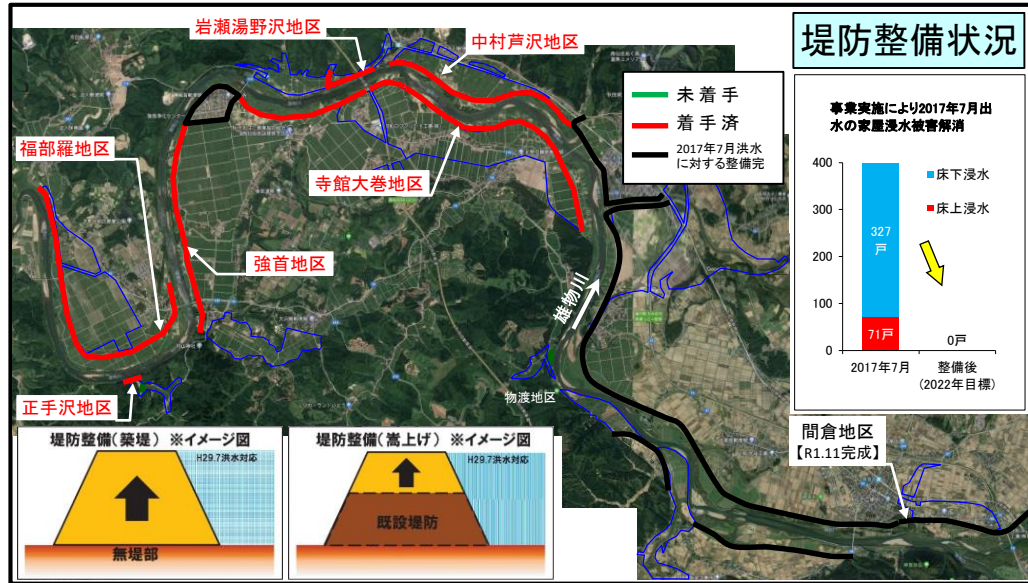

堤防整備状況

事業実施により2017年7月出水の家屋浸水被害解消

