

# 宮古箱石道路通信 No.16



発行：宮古箱石道路安全協議会  
三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）  
編集・監修：国土交通省三陸国道事務所 庄司建設監督官

## ゲリラ豪雨に迅速対応！早期復旧

### ～三好建設(株)、大成建設(株)が活躍～

6月20日(土)昼過ぎに川井地区で発生したゲリラ豪雨により、付近の山から国道106号へ土砂等が流出し車線がふさがり、通行が困難な状況に陥りました。

災害現場付近で工事を行っていた三好建設、大成建設が自主的に復旧作業にあたり、夕方17時過ぎには全面復旧させる事が出来ました。



流出物撤去状況



道路清掃状況



三好建設(株)現場代理人  
小川司さん

当社の現場付近で発生した災害であり、地域に貢献したいとの思いで、交通安全確保のため復旧作業を行いました。最近の気象状況を見ると今後も今回のような災害が発生する恐れがありうと思います。引き続き注意し、一般の方々の力になればと思っています。

国道106号 腹帯地区道路工事(大豊・佐田JV)

### 宮守貞夫さん、安全標語表彰される

三陸国道事務所主催の事故防止対策委員会総会が6月16日(火)浄土ヶ浜パークホテルにおいて開催されました。事故防止対策委員会事業の一つである安全標語の部門で宮古箱石工区からは、宮守貞夫さんの標語が表彰されました。



大豊・佐田JV  
宮守貞夫さん

この度は、栄えある賞を頂きまして、誠にありがとうございました。この標語にあるように、一人、一人が危険の芽を見逃さずに摘み取り、安全に対する意識を高めて、全工期無災害の達成に向けて尽力して参ります。



危険箇所 或づいた人が責任者  
その場で摘み取る 危険の芽  
宮守貞夫

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石工区 事業管理班  
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 三陸国道事務所 東庁舎103号 (TEL) 0193-77-4733



## 工事現場紹介

国道106号 箱石地区道路工事



現在、川井箱石地区では(仮称)新箱石トンネル工事を行うため閑伊川を横断する工事用仮橋の工事を行っています。現場代理人の佐々木照夫さんに作業上の安全管理等についてお話を伺いました。



現場で指揮を執る  
佐々木さん

工事を安全に進めるにあたり、最も注意している事は、作業が川の近くである事から、河川の増水に気を付けています。対策として携帯電話を利用した気象モバイルを導入しゲリラ豪雨などの急激な気象変化に対応できるようにしております。



仮橋工事中



仮橋工事を対岸から望む

## 宮古箱石道路安全協議会が道路清掃



6月25日(木)午前10時から47名が参加して、使用させて頂いている国道106号・千徳大橋・小山田橋に感謝し清掃活動を行いました。

約2時間の清掃活動で多くのゴミが回収され道路が綺麗になりました。特に多かったのは、飲料水のペットボトル、たばこの吸い殻でした。




道路清掃に活躍した皆さん

大成建設職員 閑伊川釣り大会に参加

## ファミリー賞を受賞

6月21日(日)に行われた閑伊川釣り大会に、下川井トンネル工事を担当している大成建設の職員3名が参加しました。参加した3人の最高位は中里さんの19位。ヤマメの部ではファミリー賞をいただきました。地域の皆様方や釣り好きの皆様方と大いに楽しめた1日となりました。

最も大きなヤマメは  
18.9cm



受賞の喜び!

## 交通規制情報 安全通行をお願いします



番号	規制場所	期間	規制時間	施工業者：連絡先
①	宮古市川井第4地割 地内 規制延長約300m	1.H27.6月下旬～H27.8月中旬 2.H27.8月中旬～H27.11月下旬	1.片側交互通行(8:30～18:00) 2.片側交互通行(終日)	大成建設(株) TEL 0193-77-5653
②	宮古市箱石第5地割 地内 規制延長約230m	H27.4月6日～H27.9月下旬	片側交互通行 (8:30～17:00)	㈱安藤・間 TEL 0193-85-1525

平成27年度 宮古箱石道路 工事一覧表

No.	工事名	工期	請負業者	現場事務所TEL	No.	工事名	工期	請負業者	現場事務所TEL
①	磯鶏石崎地区道路工事	H26.9.25~H27.9.30	(株)森本組	77-4008	⑥	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16~H31.3.15	大成建設(株)	77-5653
②	国道45号外 千徳小山田道路工事	H26.3.7~H28.3.30	前田建設工業(株)	62-3162	⑦	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17~H30.2.28	(株)安藤・間	85-1525
③	松山千徳地区道路改良工事	H27.4.2~H27.10.30	刈屋建設(株)	77-4104	⑧	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19~H31.2.28	戸田・岩田地崎JV	77-4463
④	川井地区道路改良工事	H26.4.2~H27.10.30	三好建設(株)	76-2020					
⑤	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3~H29.6.30	大豊・佐田JV	79-1855					

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況

平成27年7月1日現在

⑦施工：安藤・間



閉伊川を横断するための仮橋を作っています。

仮橋を作る為に国道を迂回させました。

⑧施工：戸田・岩田地崎JV



現場事務所、宿舎の建築工事を行っています。

③施工：刈屋建設



道路を作るため山を削って田老地区に運んでいます。

②施工：前田建設工業




トンネル坑口部  
(宮古浄化センター側)

コンクリート巻立完了

宮古浄化センターの南側から、東に向かって(仮)小山田トンネルを掘っています。6月末時点で、トンネル(全長1,100m)の掘削は480m、コンクリート巻立(覆工)は、160mまで進んでいます。

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）延長約33km

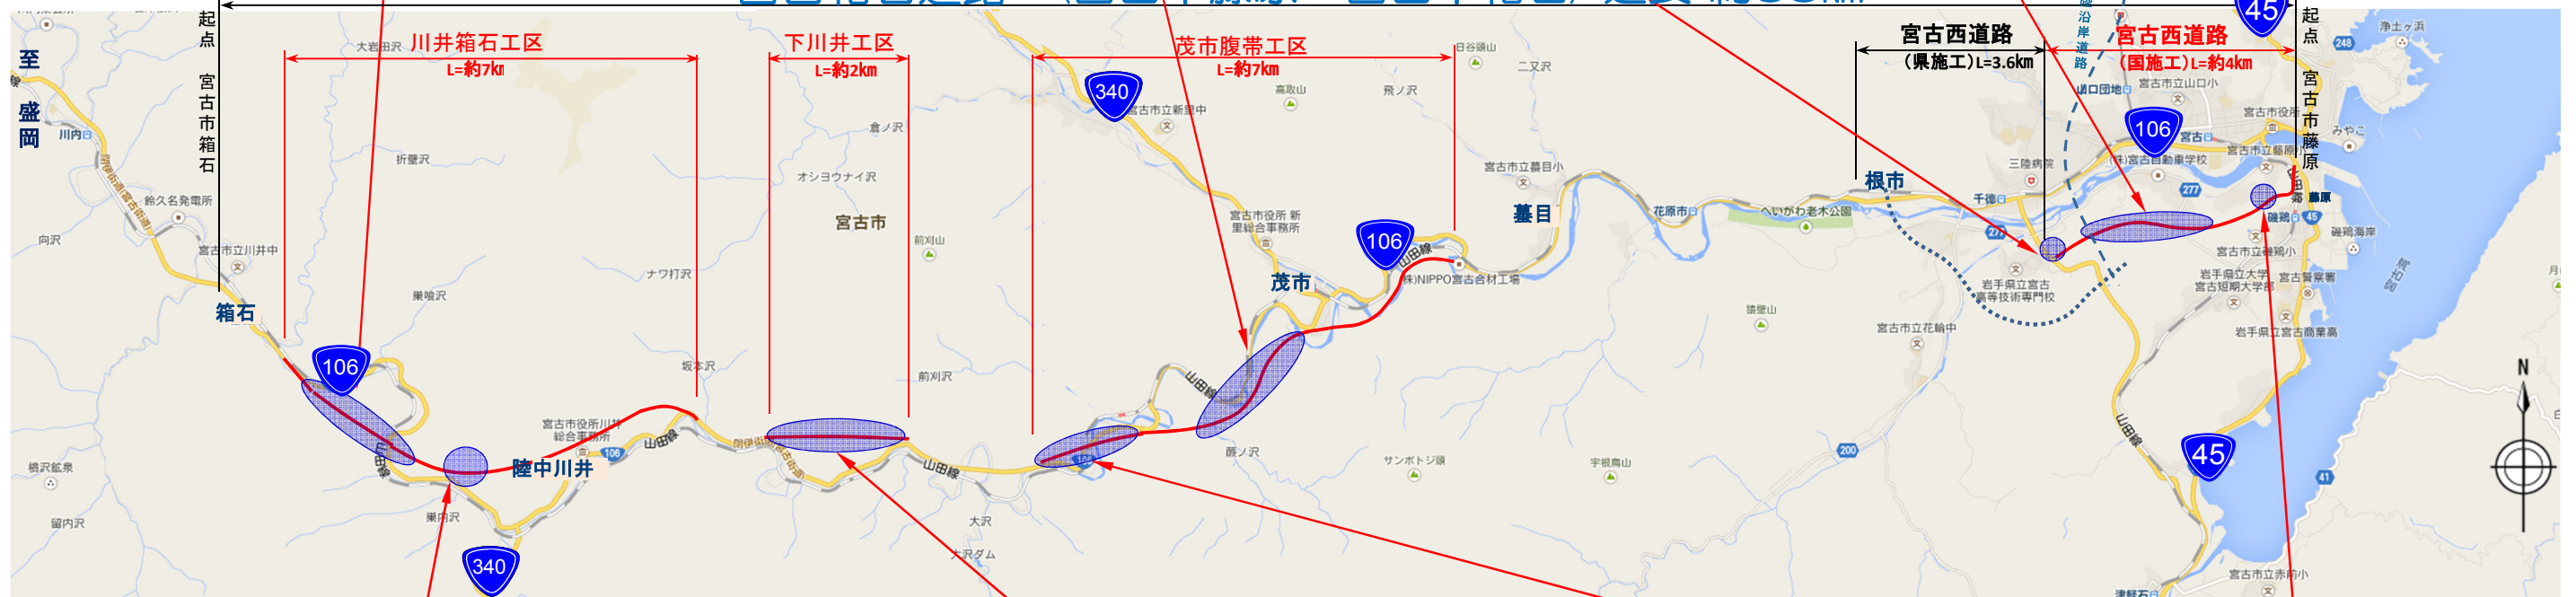

④施工：三好建設



掘削した面が崩れないように、掘削面を押さえるための工事を行っています。

(仮称)下片巣接続橋の橋台2基が出来上がりました。

⑥施工：大成建設



国道106号を拡幅するための大型ブロックを積んで擁壁を造っています。

⑤施工：大豊・佐田JV



橋台ができる範囲を掘削するにあたり国道を守るための仮設工事(土留め)を行っています。

掘削した土を場内運搬し、(仮称)腹帯第2トンネル側の盛土を行っています。

①施工：森本組



JR山田線との交差する箇所のボックスカルバート(箱形トンネル)を作っています。
