

宮古箱石道路通信 No.6



発行：宮古箱石道路安全協議会
 代表：佐田建設株式会社
 編集・監修：国土交通省 三陸国道事務所
 建設監督官：宮林（宮古箱石道路担当）

【第2回道路クリーン作戦実施】

8月22日(金)午後、2班に分かれて第2回の道路クリーン作戦を実施しました。今回はゴミ拾いだけでなく、スコップを使用しての草取り、ほうきでの掃き掃除も一部ですが実施しました。

- ◆参加人数：28名
- ◆実施範囲：千徳大橋⇄小山田トンネル間(約6km)



道路クリーン作戦メンバー集合



【豪雨災害復旧作業】

8月22日(金)夕方に発生した局所的な集中豪雨(時間当たり40mm以上)により藤原地区において泥水が一部の地域へ流出しました。この事態に安全協議会メンバーが駆けつけ事態の収拾に一致団結して取り組みました。今後も地域の皆さんが安全・安心していただけるよう、安全協議会全員が協力・連携して工事を進めていきます。



【ゆるキャラグランプリ2014】

当紙の紙面でもおなじみの宮古市公認ゆるキャラ【サーモンくん・みやこちゃん】がゆるキャラグランプリに今年もエントリーしました。宮古箱石道路安全協議会では全力で応援します。投票期間は9月2日(火)～10月20日(月)投票は(<http://www.yurugp.jp>)のウェブサイトから1日1票で毎日投票できます。

応援してね!!



【閉伊川川下りにチャレンジ!!!】

9月7日(日)に開催された閉伊川川下り大会に当安全協議会メンバーから2チームが参加しました。また、メッセージ花火にも協賛させていただきました。メッセージ内容は「虹の架け橋 宮古箱石道路の早期完成に向け工事を進めます」安全協議会一丸となって、安全に工事を完成させたいと思います。



★ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石道路施工監理分室
 〒027-0083 宮古市金浜第4地割612-1 金浜事務所102 (TEL) 0193-77-5720 (FAX) 0193-77-5721



★工事紹介のコーナー



こちらの現場で頑張ってます!





千徳・松山地区の工事状況について

工事概要

千徳・松山地区の工事は、宮古箱石道路のうちの宮古西道路(L=4.0km)の最も盛岡側となり、三陸沿岸道路との交差点に位置します。現在、この地区においては3工事が発注され、構造物工事、道路改良工事、トンネル工事が行われております。千徳大橋より東の方角に、大きく削られた山が見られますが、その付近の山が今後新しい道路へと変化していきます。

- 【千徳・松山地区の工事】
- ①千徳地区構造物工事：佐田建設(株)
 - ④国道45号外千徳小山田道路工事：前田建設工業(株)
 - ⑦松山地区道路改良工事：樋下建設(株)

工事位置図

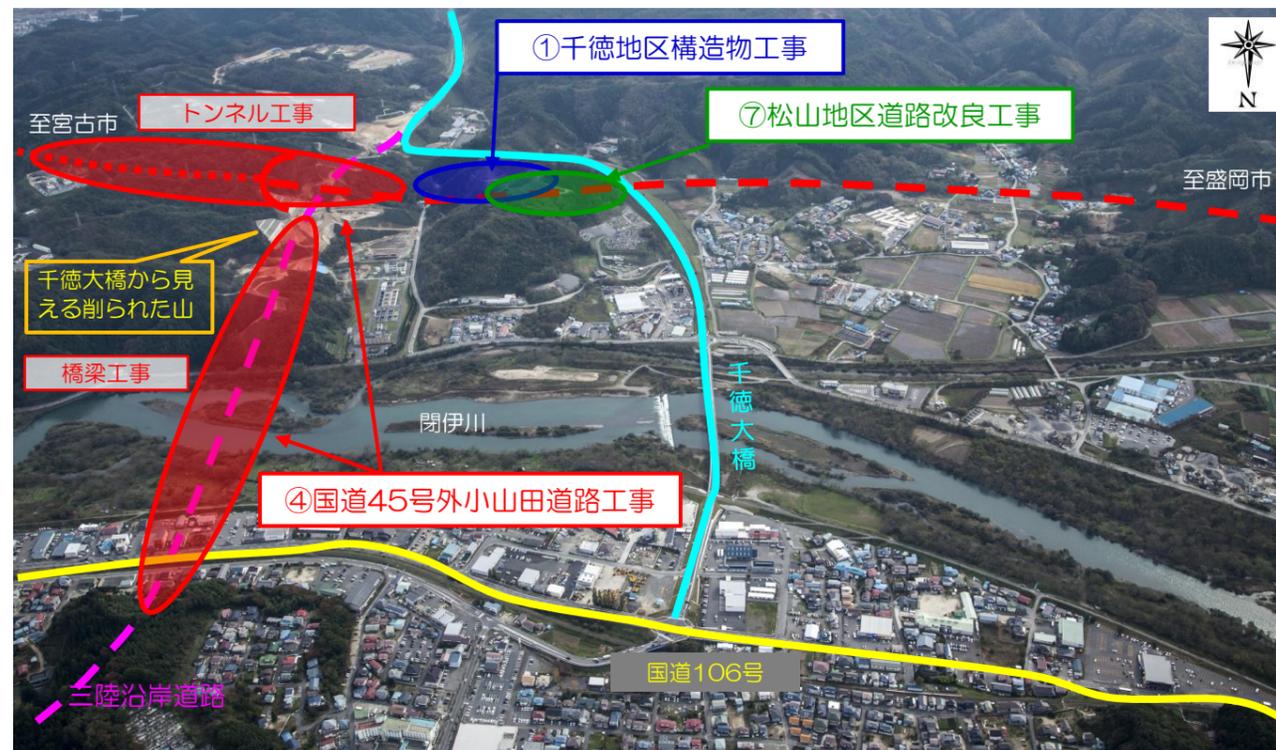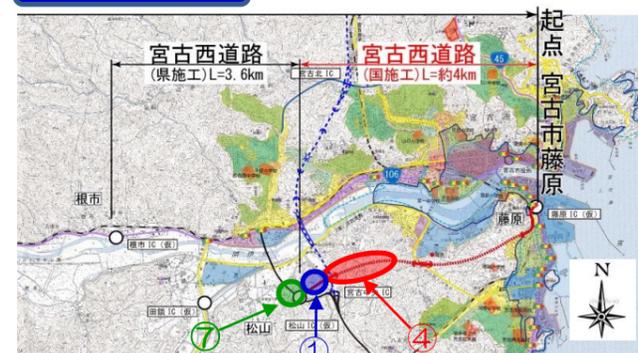

工事現場からのお知らせ

市道木戸井内隠里線は、2月末より切回し道路へ迂回をお願いしてきました。8月末には設置工事が概ね完了し、今後はボックスカルバート内の新設道路への切替えに向けた工事を進めてまいります。工事の都合上、日によって迂回路と新設道路を切替えることがあります。皆様におかれては、付近を通行の際は引続き注意していただくようお願いいたします。完全な切替えまでにはもうしばらくかかりますので、御協力をお願いいたします。



工事の状況により切替え

No.	工事名	工期	請負業者	本社所在地	現場事務所TEL	No.	工事名	工期	請負業者	本社所在地	現場事務所TEL
①	千徳地区構造物工事	H25. 9.28 ~ H27. 1.30	佐田建設(株)	群馬県前橋市	77-5601	⑤	藤原地区道路改良工事	H26. 4. 2 ~ H26.10.31	松尾建設(株)	佐賀県佐賀市	62-6756
②	腹帯地区道路改良工事	H25.10.17 ~ H26.12.19	刈屋建設(株)	岩手県宮古市	77-4104	⑥	川井地区道路改良工事	H26. 4. 2 ~ H26.10.24	三好建設(株)	岩手県宮古市	76-2020
③	磯鶏小山田地区道路改良工事	H25.11.26 ~ H26.12.19	(株)森本組	大阪府大阪市	77-4008	⑦	松山地区道路改良工事	H26. 7. 3 ~ H27. 2. 10	樋下建設(株)	岩手県盛岡市	77-5536
④	国道45号外 千徳小山田道路工事	H26. 3. 7 ~ H28. 3. 30	前田建設工業(株)	東京都千代田区	62-3162	⑧	山田宮古地区伐採作業	H26. 4. 22 ~ H27. 1. 30	宮古地方森林組合	岩手県宮古市	62-1954

宮古箱石道路 (宮古市藤原~宮古市箱石) 工事状況

平成26年8月31日現在
宮古箱石道路安全協議会



④施工：前田建設工業

小山田トンネル 坑口部



⑧ 宮古地方森林組合



⑤施工：松尾建設



小山田トンネル工事終点側坑口部で掘削作業を進めています。10月上旬からトンネル掘削に着手する予定です。

閑伊川橋下部工工事の作業ヤードを造っています。


写真は松山地区です。斜面で切り倒した木は重機のウインチを使って引っ張り上げます。

大型ダンプに土砂を積み込み、他工事へ運搬しています。

8月から「松尾建設(株)東北地区」のホームページを開設しました。
<http://www.kasanokaigan.com/>

宮古箱石道路 (宮古市藤原~宮古市箱石)

L=33km

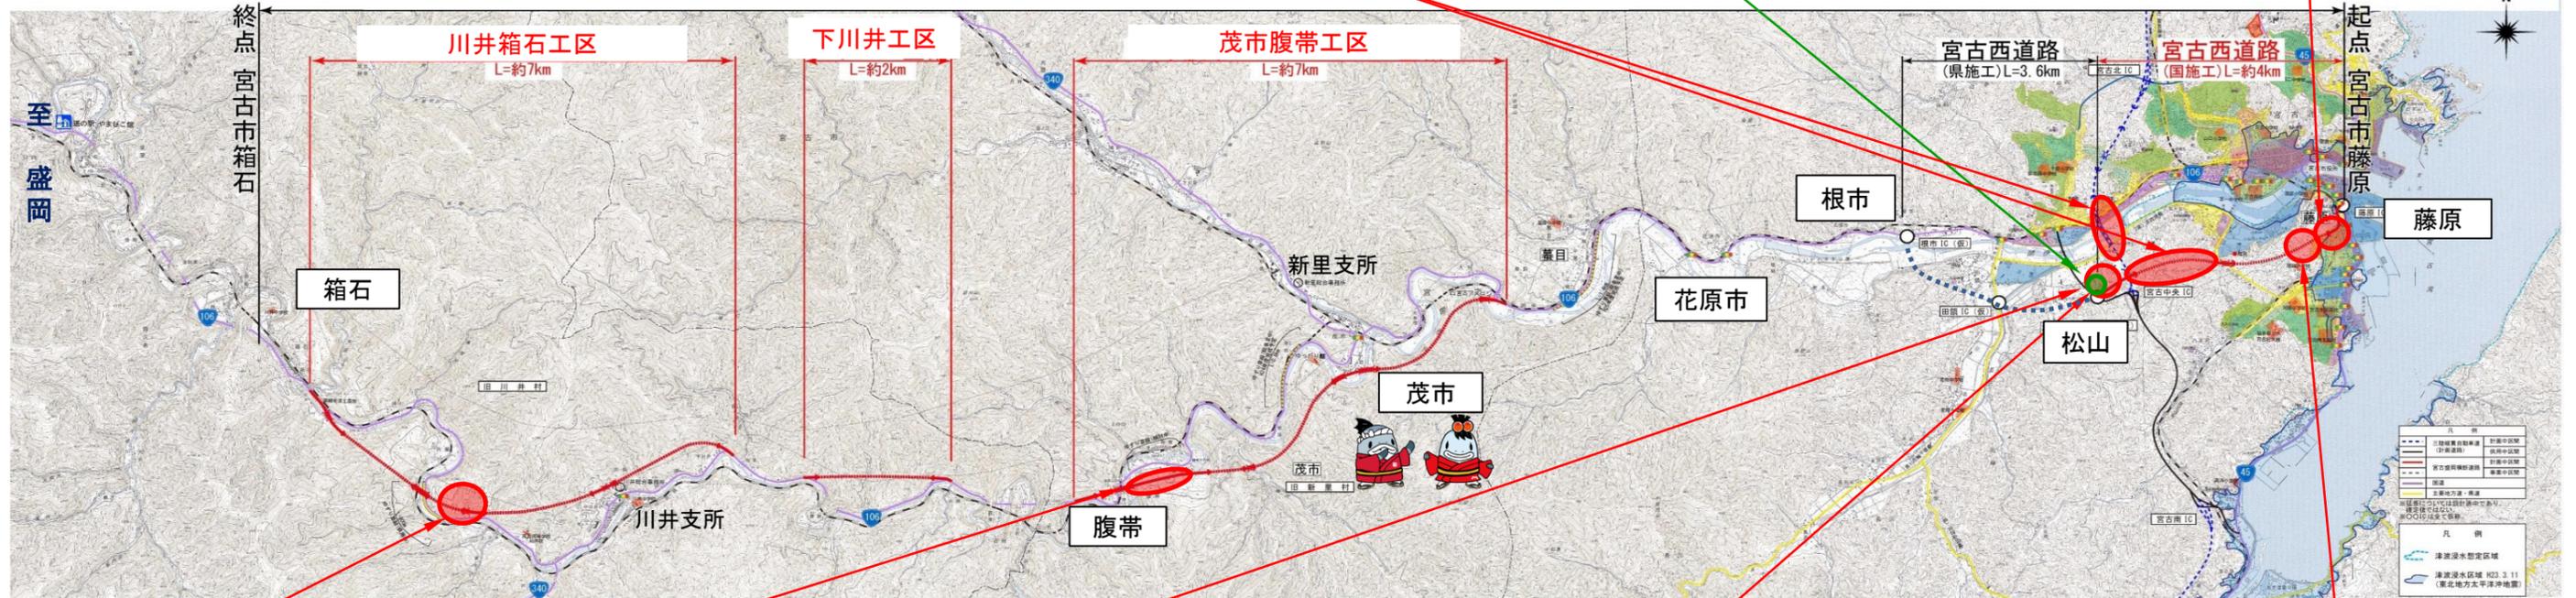

⑥施工：三好建設



②施工：刈屋建設



⑦施工：樋下建設



①施工：佐田建設



水路ボックスカルバート



③施工：森本組

工事用道路の出入口の位置です。付近を走行の際は、注意願います。

現場で発生する土は水分の多い粘土質のため、石灰を混ぜて土質改良を行い盛土に利用しています。

伐採作業が終わり、貯木場に搬出中です。この後起工測量を行います。

各ボックスカルバートの仕上げを行っています。市道部は電気、水道等のライフラインの埋設、水路部は管理用通路の設置を進めています。9月末に市道部は新設の道路へ切替える予定です。

ボックスカルバートを設置する範囲の岩盤を掘削しています。
