


宮古箱石道路通信 No.48



発行：宮古箱石道路安全協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP宮古箱石)
編集・監修：国土交通省三陸国道事務所

工事現場紹介 腹帯上川井地区道路改良工事 ～ 着実に進む (仮) 腹帯橋のP1橋脚工事～



【全景写真】



下部工(H鋼杭)掘削状況



上部工(桁)架設状況

腹帯上川井地区道路改良工事(大豊建設)は、平成29年11月に着手し、仮橋の施工を終え現在仮締切の施工を行っています。

仮橋の施工には、硬い岩盤を掘削するダウンザホールハンマー工法、150tクローラークレーンにて施工しました。(写真参照)

引き続き、地域の皆様方にはご迷惑をかけないよう、早期完成をめざして頑張っています。

宮古箱石道路安全協議会の会長交代 ～ 協議会活動の前進を図ります!～

国道106号磯鶏地区道路工事を施工している大成建設(株)の山下です。今年1月より宮古箱石道路安全協議会の会長職を拝命致しました。

宮古箱石道路は、震災復興のリーディングプロジェクトとして1日も早い完成が望まれており、当協議会への期待も年々大きくなっています。今年1年間、微力ながら協議会活動の前進を図って参りますのでよろしくお願いいたします。



1年間
よろしくお願
いします!

「宮古箱石道路安全協議会」は、宮古箱石道路管内で工事を請け負っている企業で構成されています。

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石工区 事業管理班
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 三陸国道事務所 東庁舎103号 (TEL) 0193-77-4733

工事現場紹介 片巣地区道路工事

～ 株式会社 奥村組 ～




徳永現場代理人 友瀧監理技術者

このたび宮古箱石道路のうち、川井～箱石地区において片巣地区道路工事を担当することとなりました(株)奥村組です。本工事では、片巣トンネル(延長559m)と下片巣橋上部工、新箱石大橋橋台1基を施工します。3月より川井地区では仮設工事、箱石地区では道路切廻準備工事を進めていく予定です。

工事中は、安全に十分注意しながら、一日も早い開通に向けて工事を進めてまいりますので、皆様のご理解、ご協力の程お願いいたします。

- 工事名称
国道106号 片巣地区道路工事
- 工事場所
宮古市川井～箱石地内
- 工事期間
平成29年12月14日から
平成31年10月24日まで

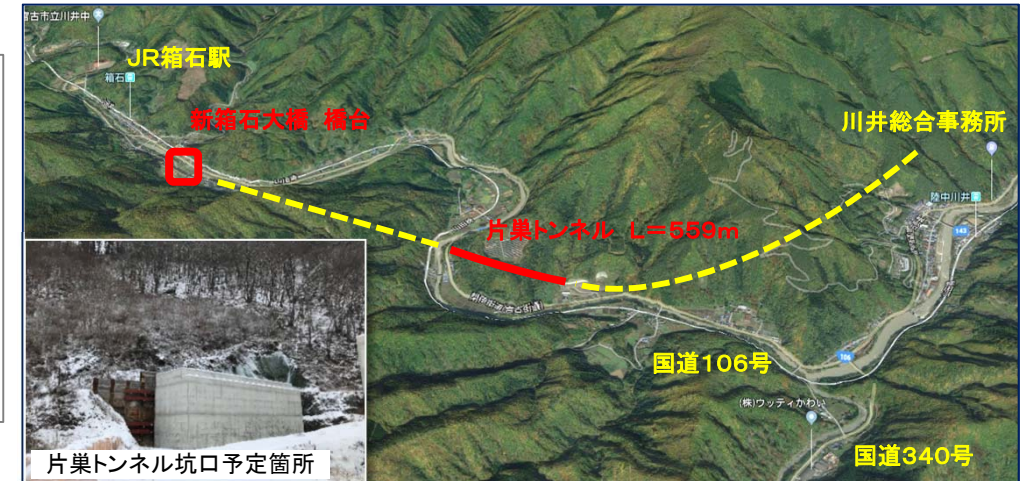

工事現場紹介 茂市腹帯地区道路改良工事 ～ (仮) 茂市橋の橋脚工事を進めています～



【全景写真】



使用機械(ダウンザホールハンマー)



土留・仮締切工施工状況

茂市腹帯地区道路改良工事(株)森本組は10月に着手し、現在、土留・仮締切工の施工を行っています。

仮締切の施工には岩盤を掘削するダウンザホールハンマーを使用して施工しております。

その際、騒音、振動が伴うことがございますが、地域の皆様方にはご迷惑をおかけしないよう、頑張っていきます。今後とも、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

平成29年度 宮古箱石道路 工事一覧

No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL	No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL
①	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19~H31.3.29	戸田・岩田地崎JV	65-7007	⑨	腹帯上川井地区道路改良工事	H29.7.19~H31.3.25	大豊建設(株)	72-2001
②	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3~H30.3.30	大豊・佐田JV	79-1855	⑩	茂市腹帯地区道路改良工事	H29.7.19~H31.3.27	(株)森本組	65-6316
③	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16~H31.3.29	大成建設(株)	77-5653	⑪	国道106号 川井地区トンネル工事	H29.11.15~H32.5.29	西松建設(株)	77-3777
④	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17~H30.9.28	(株)安藤・間	85-1525	⑫	国道106号 片巢地区道路工事	H29.12.14~H31.10.24	(株)奥村組	65-8751
⑤	国道106号 磯鶏地区道路工事	H28.4.1~H31.9.27	大成建設(株)	77-5162	⑬	小山田こ道橋上部工工事	H30.1.23~H31.2.14	(株)富士ビー・エス	-
⑥	国道106号 茂市トンネル工事	H28.11.26~H31.3.15	前田建設工業(株)	79-1685	⑭	松山地区道路改良工事	H30.3.1~H30.12.21	(株)テラ	-
⑦	国道106号 小山田地区道路工事	H29.4.1~H31.8.15	飛鳥建設(株)	77-5322	⑮	上片巢橋上部工工事	H30.1.30~H31.1.31	日本ファブテック(株)	-
⑧	川井腹帯地区道路改良工事	H29.4.3~H30.3.20	大豊建設(株)	77-3750					

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況

平成30年2月15日現在

④施工：安藤・間



(仮)新箱石大橋P1橋脚の掘削作業を行っています。

⑪施工：西松建設



(仮)川井第1トンネル（宮古側）でトンネル掘削のための準備工に着手しました。

⑨施工：大豊建設



(仮)腹帯橋P1橋脚で、仮橋の施工を行っています。

①施工：戸田・岩田地崎



(仮)腹帯第1トンネルの掘削を行っています。全長1,774mのうち447mまで進んでいます。

⑥施工：前田建設工業



(仮)茂市トンネルの掘削を行っています。全長1,885mのうち37mまで進んでいます。

⑤施工：大成建設




(仮)磯鶏トンネルの掘削を行っています。全長1,554m（844mは大豊建設で施工）のうち81mまで進んでいます。



(仮)下川井トンネルの掘削を行っています。全長2,050mのうち775mまで進んでいます。



(仮)下川井トンネル（宮古側）古田地区の国道切り廻し完了に伴い、河川区域内の工事用道路の撤去作業を行っています。

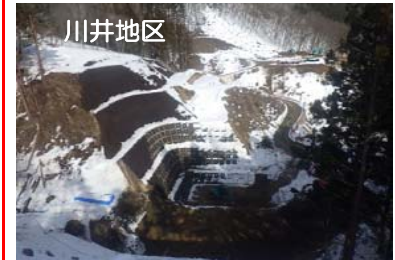

(仮)上川井橋下部工施工のための掘削を行っています。



(仮)腹帯第3トンネル（盛岡側）は落石防護柵が完了し、法面工の準備を進めています。



(仮)茂市橋P2橋脚では、矢板の打ち込み作業を行っています。



松山地区で、函渠工の施工を行っています。
