

【防災情報】北上川下流河川事務所 地震災害情報(第20報)

北上川下流河川事務所では、東北地方太平洋沖地震により、災害対策支部(非常体制)を設置し対応しております。  
現在、被害箇所において緊急復旧工事、応急対策を実施中です。  
また、市街地の浸水解消のため石巻市長及び東松島市長の要請により排水ポンプ車による排水を行っています。  
3月18日10時現在の状況についてお知らせします。

下線箇所が前回からの更新情報です

### 1. 被害の概要

管内の河川において、278箇所(3月17日12時現在)で堤防決壊、堤防の亀裂、沈下や樋門・樋管の損傷、護岸の崩壊等の被害を受けました。  
被災箇所のうち堤防決壊など損傷の激しい箇所では緊急復旧工事を実施しています。


北上川 :被災84箇所 うち2箇所が緊急復旧工実施。  
二股川 :被災 2箇所  
旧北上川 :被災56箇所  
江合川 :被災45箇所 うち3箇所が緊急復旧工実施。  
新江合川 :被災 3箇所  
鳴瀬川 :被災51箇所 うち1箇所が緊急復旧工実施  
鞍坪川 :被災 6箇所  
多田川 :被災 4箇所  
吉田川 :被災27箇所

また、緊急復旧工事以外の箇所についても必要に応じてシート張り等の応急対策を実施しています。

### 2. 緊急復旧箇所の状況

堤防が決壊した北上川の石巻市針岡地先及び石巻市北上町十三浜地先で緊急復旧工事を実施中。  
堤防の沈下や亀裂など、被害が激しい大崎市古川淵尻地先、大崎市古川福沼地先及び大崎市古川下中ノ目地先で緊急復旧工事を実施中。

番号	箇所	河川名	延長・被災状況	復旧状況
①	石巻市針岡地先 右岸4.0k~4.6k	北上川	L=500m 堤防決壊	14日6時着手 22時工事用道路完成 堤防決壊箇所の荒締め切り作業中
②	石巻市北上町十三 浜 左岸-0.4k~3.0k	北上川	L=3,400m 堤防決壊・堤防斜面の崩れ	15日7時着手 堤防決壊箇所の荒締め切り作業中
③	大崎市古川淵尻 左岸27.5~27.7k	江合川	L=200m 堤防亀裂・堤防沈下	16日17時30分着手 現在作業中
④	大崎市古川下中ノ目 左岸30.0k~30.5k	鳴瀬川	L=300m 堤防沈下	16日18時30分着手 現在作業中
⑤	大崎市古川淵尻 左岸26.1k~26.9k	江合川	L=550m 堤防亀裂・堤防沈下	17日8時着手 現在作業中
⑥	大崎市古川福沼 右岸26.6k~26.8k	江合川	L=200m 堤防亀裂・堤防沈下	17日18時着手 現在作業中

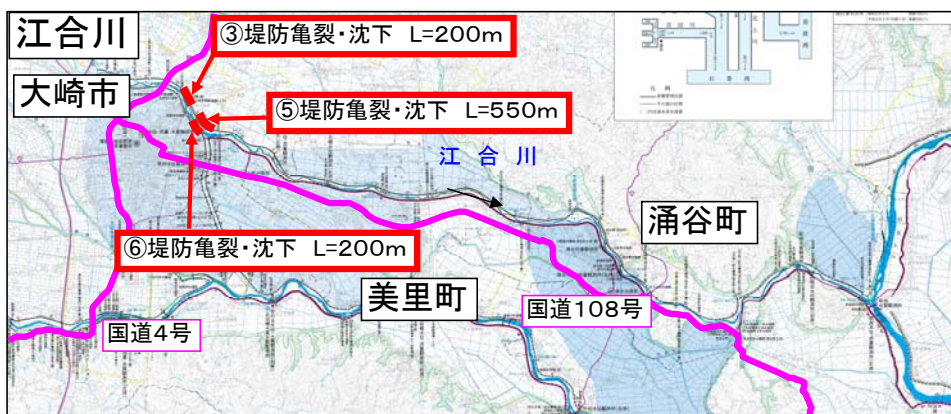

### 3. 災害対策車の出動状況

石巻市長、東松島市長の要請により、各所において浸水解消のため排水作業中。

場所	機種	台数	活動状況
石巻市住吉	排水ポンプ車	—	作業終了
石巻市住吉	照明車	—	作業終了
石巻市釜蘭門	排水ポンプ車	2台	12日 9時35分出動、16時55分排水開始
石巻市釜蘭門	照明車	1台	12日 13時30分出動、16時55分設置
東松島市赤井	排水ポンプ車	5台	13日 12時00分出動、15時15分排水開始
東松島市赤井	照明車	2台	14日 2時00分出動、6時00分設置
石巻工業高	排水ポンプ車	1台	14日 7時00分排水開始
石巻市針岡	照明車	1台	14日 設置（緊急復旧工事）
石巻市北上町十三浜	排水ポンプ車	4台	14日 21時05分排水開始
石巻市北上町十三浜	照明車	3台	14日 21時05分排水開始
石巻市蛇田	排水ポンプ車	1台	15日 7時50分排水開始
石巻市北上町十三浜	照明車	1台	15日 21時00分設置（緊急復旧工事）
東松島市赤井（赤井排水機場）	排水ポンプ車	2台	15日 17時30分排水開始
東松島市赤井（調整池）	排水ポンプ車	1台	15日 19時00分排水開始
石巻市役所	衛星通信車	1台	15日 20時30分設置
東松島市役所	衛星通信車	1台	16日 10時00分設置
東松島市赤井公民館	排水ポンプ車	2台	17日 9時25分排水開始
石巻市月浜	衛星通信車	1台	17日 14時15分設置
東松島市赤井公民館	照明車	1台	17日 設置

排水ポンプ車	18台
照明車	9台
衛星通信車	3台

北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。  
ホームページアドレス【 [http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/index\\_2.html](http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/index_2.html) 】

発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

問い合わせ先
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 宮城県石巻市蛇田字新下沼80 電話：0225-95-0194(代表) 技術副所長 柴田 富士男 (内線205) 工務第二課長 齊藤 喜浩 (内線321)

②石巻市北上町十三浜地先の堤防決壊箇所での緊急復旧状況



3月17日18時頃 荒締め切り作業状況

②石巻市北上町十三浜地先の堤防決壊箇所での緊急復旧状況



3月18日6時頃 荒締め切り作業状況
