

台風99号による大雨に伴う洪水【河川防災情報】(第6報)

雄物川堤防の緊急復旧作業に着手

台風99号により、6月4日13時10分に秋田市豊岩地先の雄物川堤防が決壊し、近隣に甚大な浸水被害が発生しました。秋田河川国道事務所では、堤防決壊箇所の緊急復旧作業を6月4日14時50分より着手しました。緊急復旧作業の完了は6月14日(月)の予定です。

【緊急対策工事の実施内容】

- 日時：令和3年6月4日(金) 14時50分工事着手
- 現場位置：秋田県秋田市豊岩地先(雄物川左岸4.9k)
- 復旧工法
 - (1) 根固めブロック+岩ずりにて堤防盛立を実施
 - (2) 大型連節ブロックにて堤防補強を実施
 - (3) 鋼矢板による二重締切を実施
- 完成予定日時：令和3年6月14日(月) 予定

<記者発表先 秋田県政記者会>

問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

TEL 018(823)4167

副所長(河川担当) : 猿田 ^{さるた} 誠 ^{まこと} (内線204)

工務第一課長 : 山中 ^{やまなか} 匠 ^{たくみ} (内線311)

決壊箇所周辺の浸水状況 ①




演習

様式-5. 4 <緊急>

災害緊急復旧添付図面（令和3年6月4日発生）
秋田県秋田市豊岩石田坂地先（雄物川左岸4.9k）

東北地方整備局

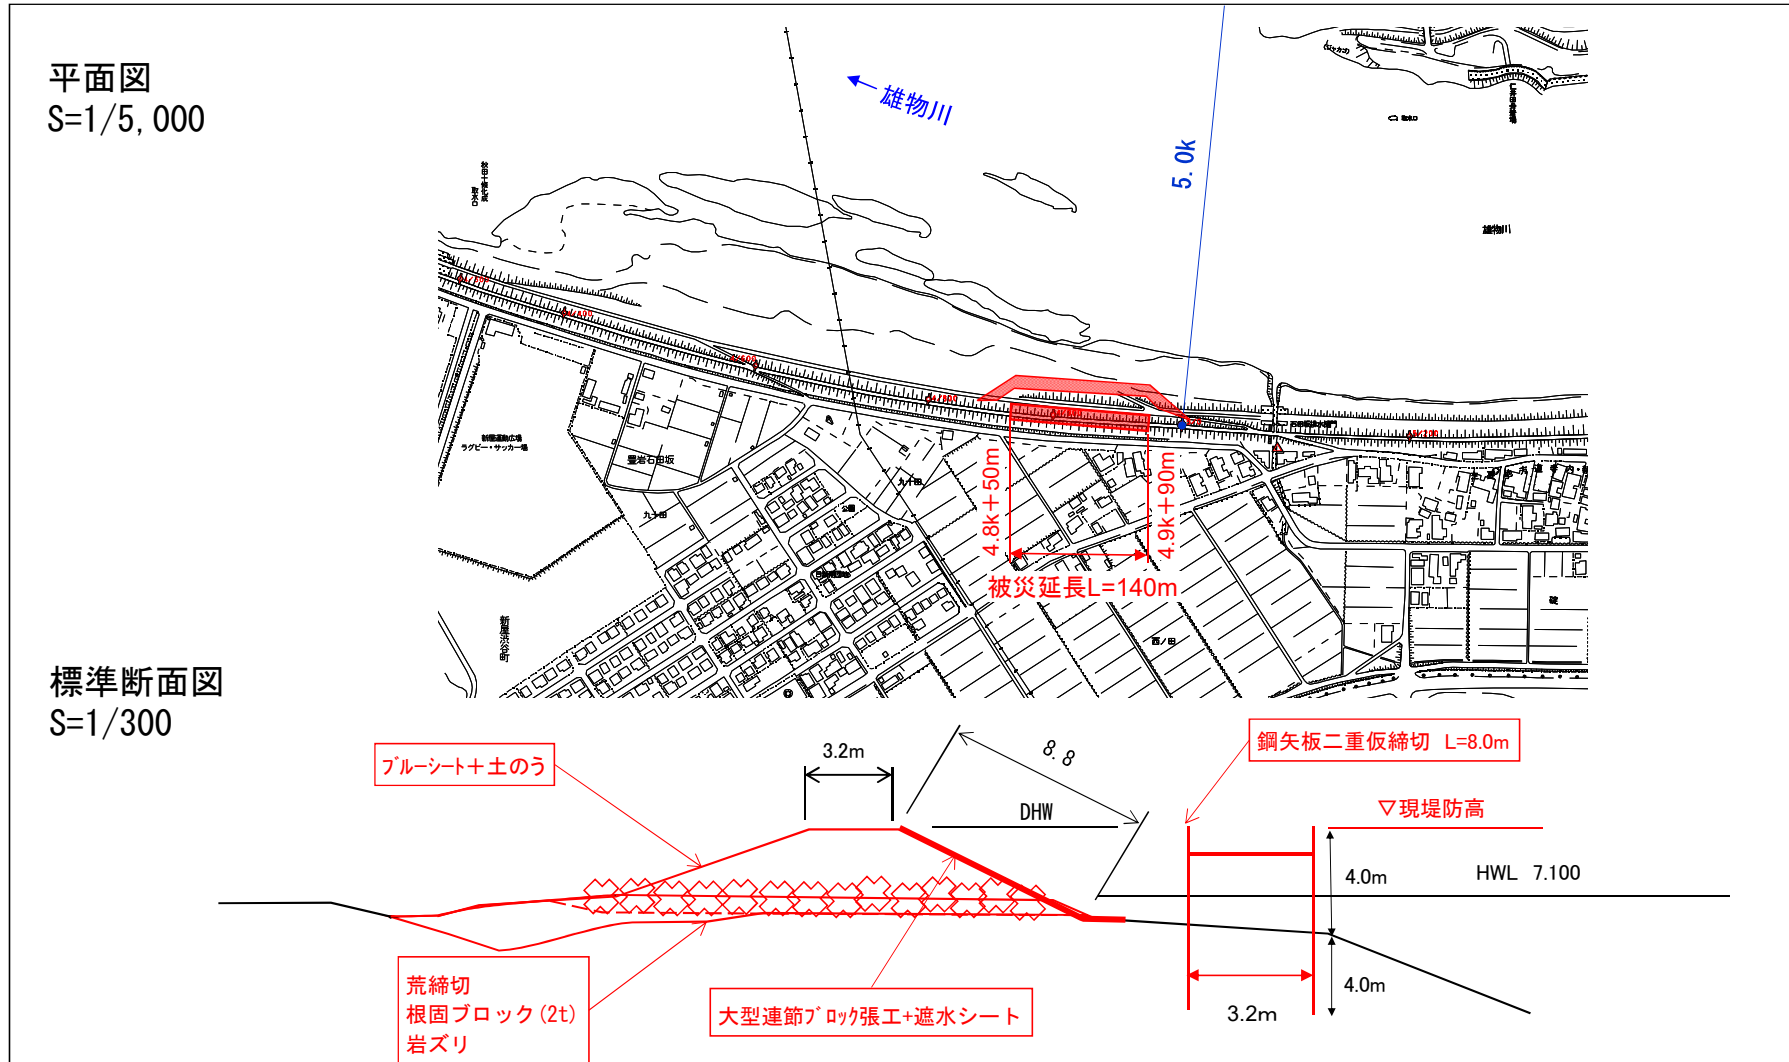

演習

予定工程

※演習工程は、時間の関係から圧縮した工程とする。

予定工程表

