

平出張所NOW!

工事概要・工事進捗状況
常磐バイパス 平バイパス

No. 96
平成23年11月30日


平出張所は「一般国道6号常磐バイパス」と「一般国道49号平バイパス」の4車線化工事を担当しています。

橋梁上部工工事が動き始めました

国道6号常磐バイパスの泉～勿来地区の道路を4車線に拡幅するための橋梁上部工工事をスタートしていきます。上部工工事が完成し、その他の橋の工事と舗装工事を施工した後、供用することになります。

現在5ヶ所の上部工工事（六枚内高架橋上部工工事、宮ノ下高架橋上部工工事、佐糠こ道橋上部工工事、鮫川大橋上部工工事、中田川橋上部工工事）が稼働中で、それぞれの施工業者の工場（大阪府堺市、三重県津市、千葉県船橋市など）で橋桁が製作され、その後陸路を使用して現地まで運び、橋脚に乗せることにより工事を進めていきます。

工事が完成して4車線化することにより、朝夕の渋滞が解消されることが期待されます。

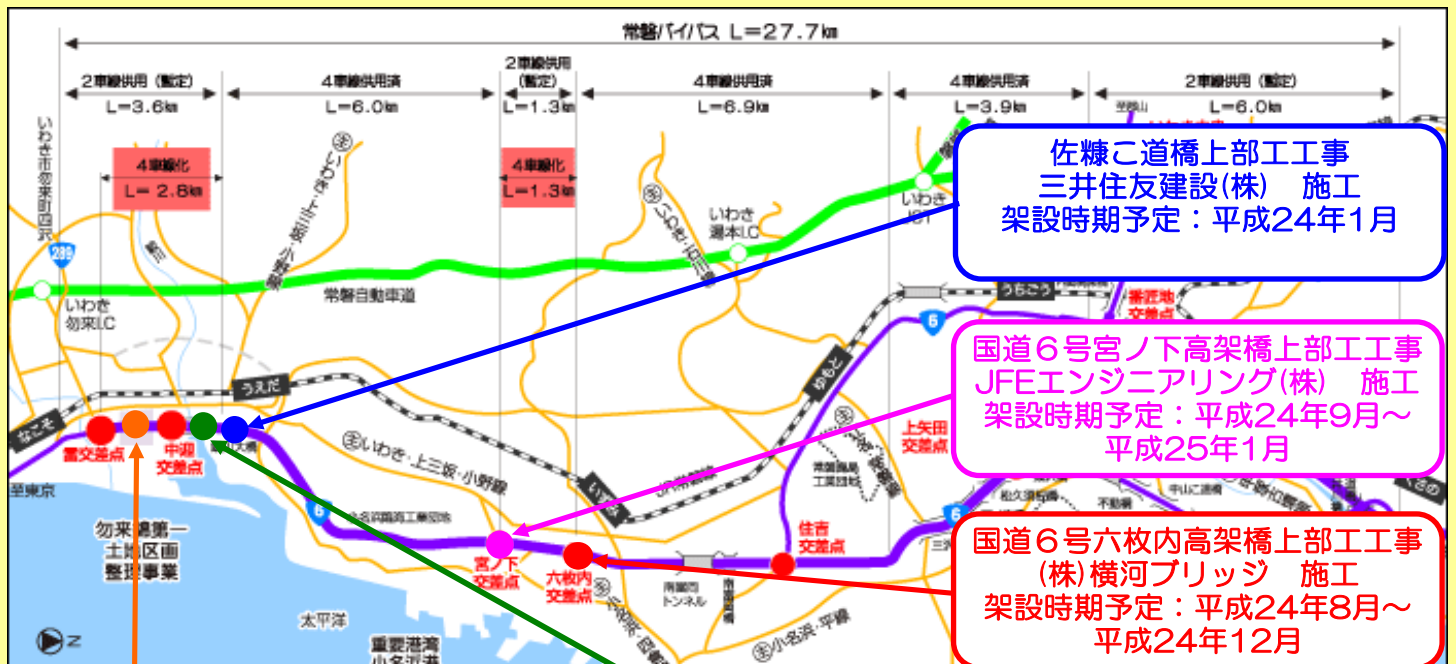

佐糠こ道橋上部工工事
三井住友建設(株) 施工
架設時期予定：平成24年1月

国道6号宮ノ下高架橋上部工工事
JFEエンジニアリング(株) 施工
架設時期予定：平成24年9月～
平成25年1月

国道6号六枚内高架橋上部工工事
(株)横河ブリッジ 施工
架設時期予定：平成24年8月～
平成24年12月

中田川橋上部工工事
川田建設(株) 施工
架設時期予定：平成24年2月

国道6号鮫川大橋上部工工事
(株)II-IIIインフラシステム 施工
架設時期予定：平成24年10月～
平成25年5月



この部分
をJR
東日本
で施工
します

国道49号 内郷高架橋工事

国道49号平バイパスで施工中の「内郷高架橋上部工工事」ですが、常磐線の線路上の部分については、JR東日本で施工を行います。先日、JR東日本と施工業者のユニオン建設(株)との契約締結が行われ、橋梁の架設については、来年2月下旬～3月中旬に行う予定になっております。

(発行元)
国土交通省 東北地方整備局
磐城国道事務所 平出張所
〒970-8021
いわき市平中神谷字六本榎20
TEL 0246-34-8394
