

宮古箱石道路通信 No.4



サーモンくん
と
みやこちゃん

発行：宮古箱石道路安全協議会
代表：佐田建設株式会社
編集・監修：国土交通省 三陸国道事務所
宮林建設監督官（宮古箱石道路担当）

【埋蔵文化財発掘調査】

宮古西道路において2箇所目の遺跡調査が藤原地区の「磯鶏石崎遺跡」で行われました。遺構として炭窯跡を検出しましたが、土器等の遺物が出土しなかったため、何時代の遺構なのか特定できませんでした。今回の調査はこれで終了となり、宮古西道路における埋蔵文化財発掘調査は全て終了しました。宮古箱石道路起点部である藤原地区は、早期開通に向けた本格的な道路工事へ移行します。

調査場所



磯鶏石崎遺跡の発掘調査

遺構発掘状況



炭窯跡出土状況



【道路クリーン作戦】

宮古箱石道路安全協議会では、工事が本格的に稼働し、土砂を運搬する大型ダンプ車の市街地への通行が増えることから、道路美化の推進と安全を守ることを目的として6月27日(金)午後、2班に分かれて実施しました。

- ◆参加人数：29名
- ◆実施範囲：国道106号千徳大橋⇄市役所(約6km)
主に両側の歩道部(延べ約12km)
- ◆清掃成果：ゴミ袋約10袋
今後は定期的に活動する予定です。



R106清掃状況

【R106虹の架け橋デザイン】

宮古箱石道路安全協議会では宮古市職員の方がデザインされた「おらほの希望！虹の架け橋R106」と連携し、現場展開します。デザインの趣旨は「宮古盛岡横断道路の早期開通と、横断道路が宮古市と盛岡市の『希望をつなぐ虹の架け橋』となることを願い、デザインされました。現場で働く全員が一丸となって、安全に早期開通を目標に工事を進めることを、地域と連携して取り組みます。今後も工事へのご理解とご協力を、何卒よろしくお願ひいたします。



道路クリーン作戦メンバー集合



回収したゴミの一部



★ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石道路施工監理分室
〒027-0083 宮古市金浜第4地割612-1 金浜事務所102 (TEL) 0193-77-5720 (FAX) 0193-77-5721



★工事紹介のコーナー

こちらの現場で頑張ってます!




国道45号外 千徳小山田道路工事 施工：前田建設工業(株)

工事概要

本工事は、宮古盛岡横断道路の一部である小山田トンネルと、三陸沿岸道路の一部である閑伊川橋下部工(橋脚)をつくる工事です。



久慈方面

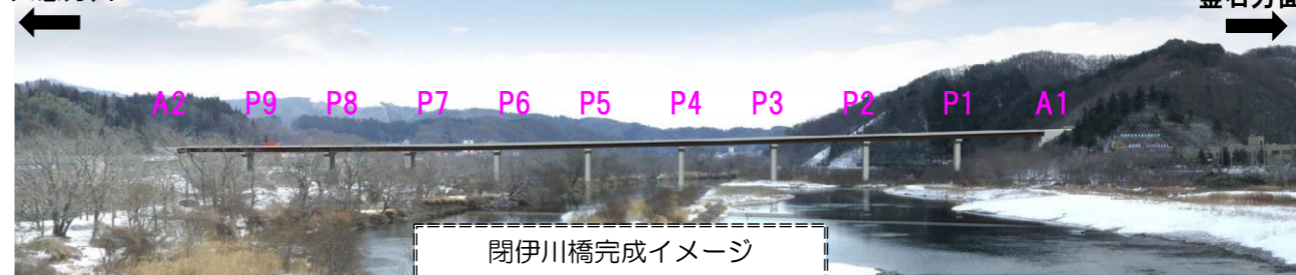


閑伊川橋完成イメージ

釜石方面

至 久慈

至 釜石

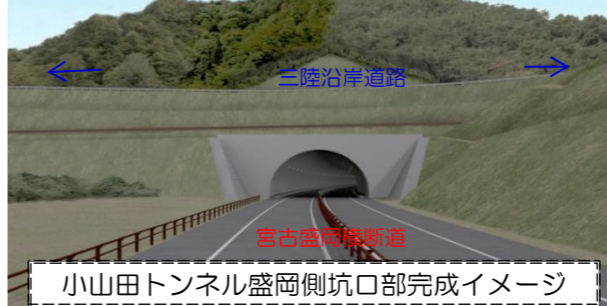

小山田トンネル盛岡側坑口部完成イメージ

前田建設工業(株)メンバー紹介



【進捗状況】

- ・トンネル工事：盛岡側坑口部の切土・土砂運搬を行っています。(トンネル工事着手：10月予定)
 - ・橋下部工工事：閑伊川北側河川敷部(P4~P6)にて工事用道路の伐採や造成等の準備作業を行っています。
- ※各構造物の名称(小山田トンネル、閑伊川橋)は仮称です。

工事進捗状況の発信、現場見学会の開催、地域行事への参加等を活発に行い、沿道の皆様との交流を深めながら、復興道路・復興支援道路の早期完成に向けて、工事を進めて参ります。今後とも、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
(現場代理人：北村、監理技術者：青柳、亀田)

No.	工事名	工期	請負業者	現場事務所
①	千徳地区構造物工事	H25. 9.28 ~ H27. 1.30	佐田建設(株)	0193-77-5601
②	腹帯地区道路改良工事	H25.10.17 ~ H26.12.19	刈屋建設(株)	0193-77-4104
③	磯鶏小山田地区道路改良工事	H25.11.26 ~ H26.12.19	(株)森本組	0193-77-4008
④	国道45号外 千徳小山田道路工事	H26. 3. 7 ~ H28. 3.18	前田建設工業(株)	0193-62-3162
⑤	藤原地区道路改良工事	H26. 4. 2 ~ H26.10.31	松尾建設(株)	0193-62-6756
⑥	川井地区道路改良工事	H26. 4. 2 ~ H26.10.24	三好建設(株)	0193-76-2020



平成26年7月1日現在

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所
宮古箱石道路安全協議会

宮古箱石道路 (宮古市藤原～宮古市箱石) 工事状況



④施工：前田建設工業

小山田トンネル箱石側坑口部の切土工事を進めています。施工開始前のトンネル直上から箱石側を望んだ景色です。



ゼッケン

上記のゼッケンを付けたダンプ車が、千徳から田老まで土砂を運搬しています。



⑤施工：松尾建設

ダンプ車出入口

R45号

道路が出来る範囲の木を切り倒し、集めて運び出しています。7月中旬より国道45号歩道部を出入口として土砂を運び出します。通行の際はご注意ください。




R106虹の架け橋看板設置

ここはどこでしょう。ヒント：地図

道路の計画位置がわかる道路中心標示板(通称トンポ)にR106虹の架け橋看板を取り付けました。

宮古箱石道路 (宮古市藤原～宮古市箱石)

L=33km

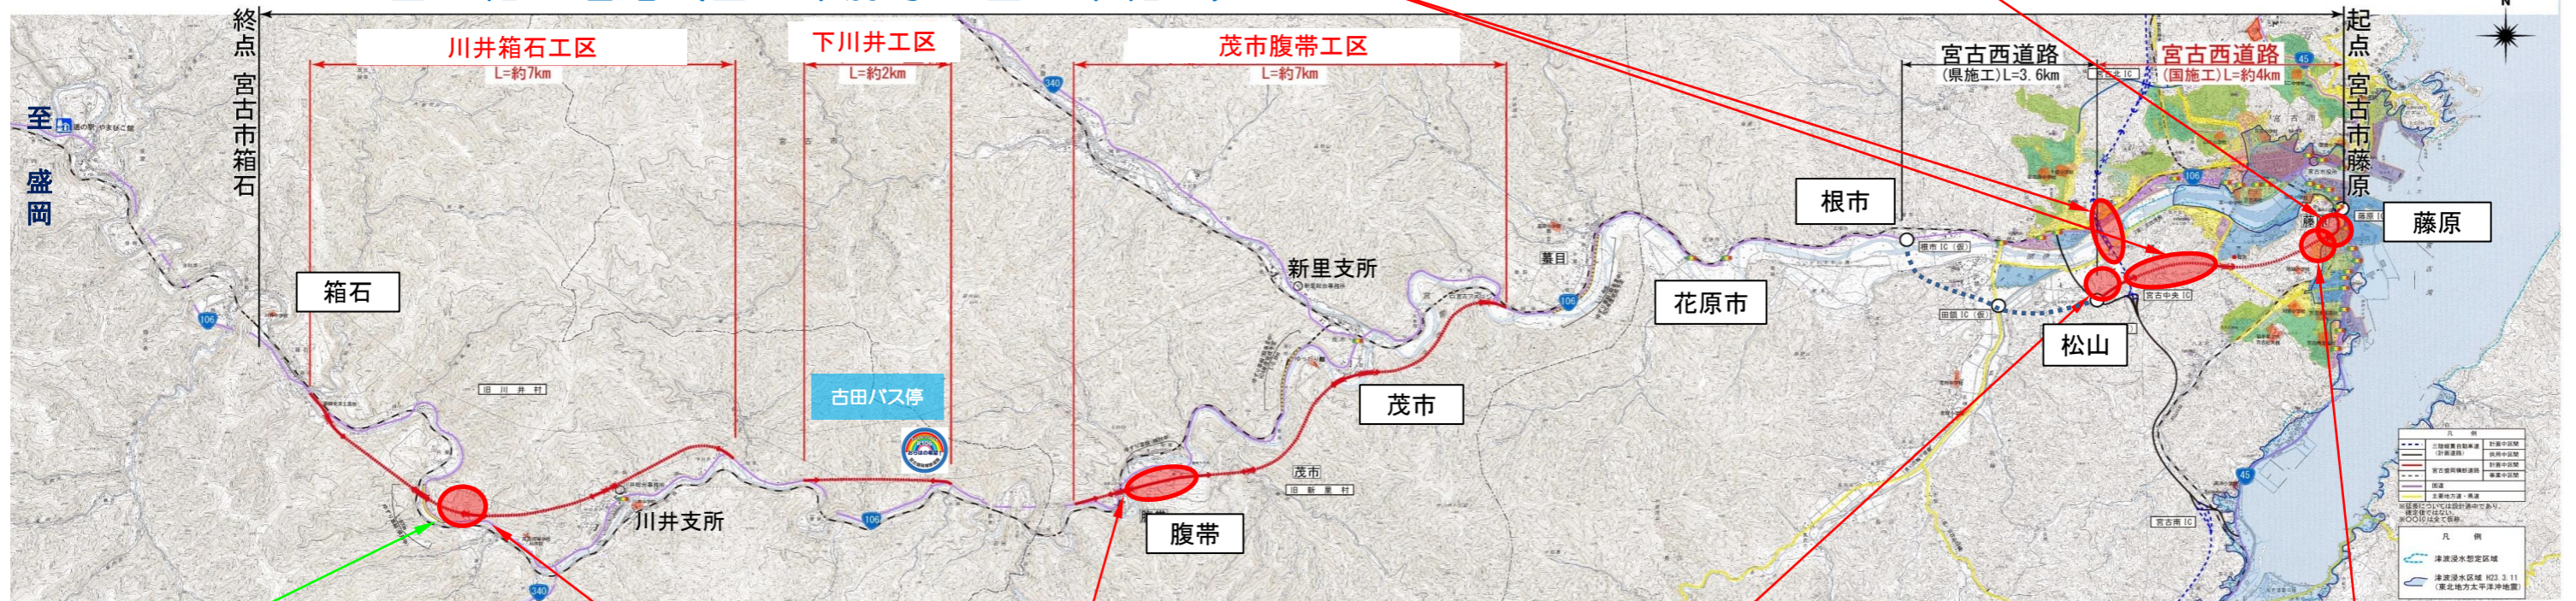

宮古森林組合

工事用道路部の木を切り倒し、集めて運び出しています。



⑥施工：三好建設

工事用道路を造っています。国道106号を道路規制しておりますので、通行の際はご注意ください。



②施工：刈屋建設

土工事と水路工事及び工事用道路部の木を切り倒し、土工事を行っています。



①施工：佐田建設

市道ボックスカルバート据付完了

大型クレーン(120t吊り)により水路部のボックスカルバート据付を行っています。引き続き、市道木戸井内隠里線を切り廻して仮設道路としておりますので、通行の際はご注意ください。



③施工：森本組

ボックスカルバート据付部の土砂崩落対策用H型鋼材設置が完了し、次の作業に向けて計画、調整中です。
