

伊達市の堤防決壊による緊急情報

台風99号に伴う大雨による 防災情報 (第 8 報)

福島河川国道事務所では、台風99号に伴う大雨により、災害対策支部を(非常体制:河川)を設置して警戒にあたっています。

13時20分頃に発生した「阿武隈川右岸8.4k付近の堤防決壊」は、延長が100m、浸水区域は約192haとなっています。

現場では、緊急復旧作業を実施しています。

1. 災害の発生内容

阿武隈川右岸8.4k付近(伊達市梁川町やながわ工業団地地先)において堤防が決壊。

2. 被災状況

14時 20分現在

被災箇所 : 阿武隈川右岸8.4k付近
被災数量 : 堤防決壊幅=100m
浸水面積 : 192ha
人的被害 : 無し
家屋被害 : 床上浸水 156戸、床下浸水 175戸 (伊達市梁川町)
その他 : 国道349号は通行止め

3. 復旧状況

※別紙

15時 10分現在

5月12日14時より、決壊した堤防の緊急復旧作業に着手。
(復旧工法:荒締切+二重鋼矢板仮締切)

【復旧作業完了の見込み】

・荒締切作業 5月12日 15:00作業完了予定
・二重鋼矢板仮締切作業 5月12日 16:10作業完了予定
・中詰め盛土作業 5月12日 16:10作業完了予定

4. 事務所体制

【最新の体制】

河川 : 5月12日 10時10分 阿武隈川上流 非常体制

5. 河川水位情報

5月12日

15時 00分現在

水系名	観測所名	水位	状況
阿武隈川	阿久津(阿武隈川)	7.05 m	下降中
阿武隈川	伏黒 (阿武隈川)	4.98 m	下降中

基準水位			
水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位
4.0m	5.5m	6.8m	7.9m
3.0m	4.0m	4.5m	5.0m

6. 洪水予報発令情報 (福島河川国道事務所・福島地方气象台 共同発表)

5月12日 15時20分

阿武隈川上流

「氾濫警戒情報」発表にきりかわりました。

7. 排水施設の稼働状況

・伏黒管内

排水機場 稼働停止。(南町排水機場)

排水ポンプ車 2箇所稼働中。(福島第1樋管、堀切川樋門)

・郡山管内

排水機場 再稼働中。(愛宕川緊急内水排水施設、舘下排水機場、南川排水機場)

排水ポンプ車 再稼働中。(落合堀樋管)

8. 現地情報連絡員(リエゾン)の派遣状況

派遣先	派遣人数
伊達市	2人

リエゾン出発(10:45) 現地到着(11:30)

9. 今後の見通し

・今後、新たな情報が入り次第お知らせします。今後の気象情報にご注意下さい。

《事務所管内の情報は、右記のURLからご覧下さい》 <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

< 記者発表会 : 福島建政記者クラブ、福島市政記者クラブ >

お問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所


TEL 024-546-4331 (代)

副所長(河川) 佐藤 勝美 内線(204)

調査第一課長 奥中 智行 内線(351)

(阿武隈川上流 R 8.4k、福島県伊達市梁川町やながわ工業団地 地先)

東北地方整備局

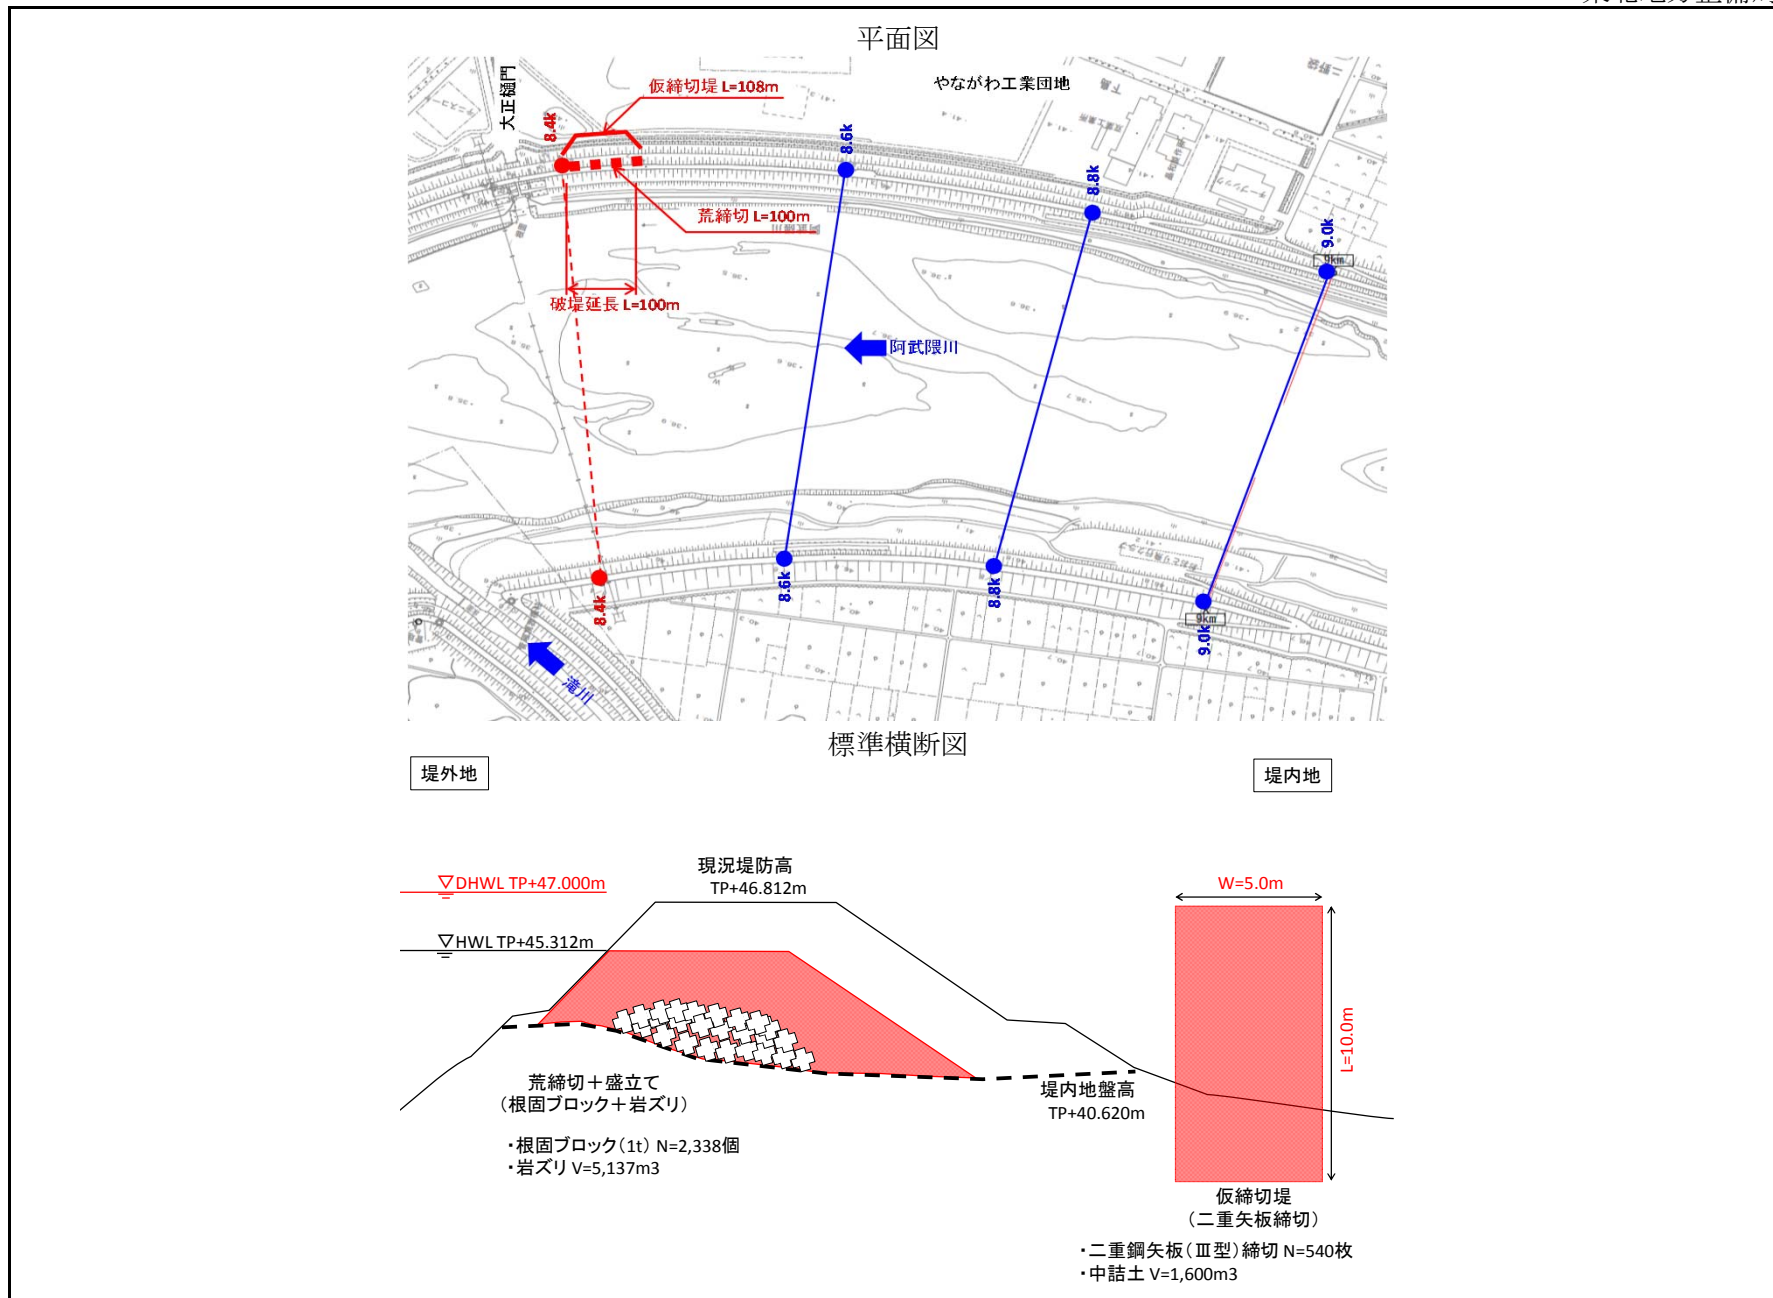

演 習

実施工程表(阿武隈川上流 やながわ工業団地地区 阿武隈川右岸 8.4k)

工種	種別	数量	5月12日																								
			PM14時						PM15時						PM16時												
			60	10	20	30	40	50	60	10	20	30	40	50	60	10	20	30	40	50	60	10	20	30	40	50	60
仮復旧 堤防	(荒締切) 根固ブロック	2,338個		▼着手				▼完了																			
	(荒締切) 岩ズリ盛土	5137m ³		▼着手				▼完了																			
	二重鋼矢板仮締切	540枚							▼着手															▼完了			
	中詰め盛り土	1,600m ³												▼着手										▼完了			
