安全で安心できる地域づくり　あらゆる災害に強い安全な地域づくり

事業名　摺上川ダム建設事業（直轄）
（福島県福島市）

事業着手：昭和６０年度　　**完成・供用の目標年度：平成１７年度完成予定**

事業の必要性・事業の概要

摺上川ダムは、阿武隈川の左支川摺上川の上流福島市飯坂町茂庭地内に建設中の多目的ダムです。


摺上川ダムは、阿武隈川本川と摺上川の洪水調節、渇水時における正常な流水機能の維持、水道用水及び工業用水の供給、かんがい用水の補給、発電の６つの役割を持っている総貯水容量15,300万m³、高さ105m、堤頂長718.6m、堤体積830万m³のロックフィルダムです。

これまでの事業経緯

平成７～９年度　堤体基礎掘削
平成10～14年度　堤体盛立及び洪水吐コンクリート打設
平成16年２月～　試験湛水を実施

総事業費：1,955億円
（平成10年２月23日：基本計画変更告示）

福島県

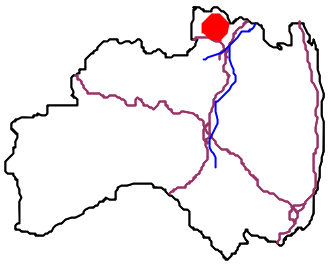

ダム完成１年前倒し
平成１８年度完成予定を、平成１７年度完成に！

摺上川ダムは、阿武隈川の度重なる洪水や、福島地方水道用水供給企業団の平成15年４月からの暫定取水の実態を踏まえ、ダム効果の早期発現を図るために工事工程を見直し、試験湛水を平成16年２月に実施しており、完成年度を１年早め、平成17年度完成を目指しています。

摺上川ダム計画概要図



試験湛水中の摺上川ダム＜上空から＞



昭和61年8月洪水（梁川町広瀬川合流点）




平成１７年度事業費及び事業内容

○事業費：3，100百万円
○試験湛水を完了させるとともに、ダム周辺整備等の完成を図ります。

事　業　効　果

○阿武隈川本川及び摺上川の洪水被害の軽減
昭和61年8月洪水時において、摺上川ダムがあれば伊達町伏黒地点にて阿武隈川の水位を３２ｃｍ低減することができ、下流の梁川町では破堤実績水位まで達しなかったと推定されます。

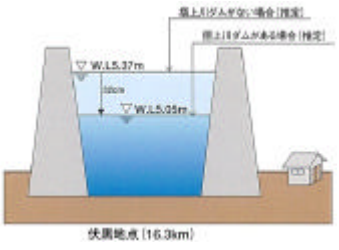

○福島市水道用水供給をはじめとする各種用水の安定的な確保
