がんばろう！東北　復興支援道路　発　行　日：　平成27年 3月15日

宮古箱石道路通信 №12



発　　行：　宮古箱石道路安全協議会
代表：前田建設工業株式会社
編集・監修：　国土交通省　三陸国道事務所
建設監督官：宮林（宮古箱石道路担当）

新規工事：国道106号　下川井トンネル工事

地図に残る仕事。 大成建設株式会社 TAISEI For a Lively World

宮古箱石道路に新しい工事が加わりました。受注した施工会社は、大成建設株式会社です。
工事の概要は下記のとおりです。なお、本作業は４月頃から盛岡側の護岸工より開始します。
安全第一で工事を進めていきますので、皆様のご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

【工事場所】 宮古市古田～川井地内
【工　　期】 自：平成26年12月16日
　　至：平成31年　3月15日
【工事内容】
・下川井トンネル　延長2,036m
・護岸工、道路切回し、法面切土他1式






新規工事：国道106号 箱石地区道路工事

安藤ハザマ

宮古箱石道路に新しい工事が加わりました。受注した施工会社は、株式会社 安藤・間です。
工事の概要は下記のとおりです。なお、3月中旬より、現場事務所、宿舎の建設の予定です。
また、4月頃より工事用道路①、国道106号切廻し工、仮桟橋①を開始する予定です。
安全には充分配慮し工事を進めていきますので、皆様のご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

【工事場所】 宮古市川井～箱石地内
【工　　期】 自：平成26年12月17日
　　至：平成30年　2月28日
【工事内容】
・新箱石トンネル　：延長1,493m
・上片巣橋下部工　：橋台1基（A1），橋脚1基（P2）
・道路改良　　：道路切回し、法面切土他1式

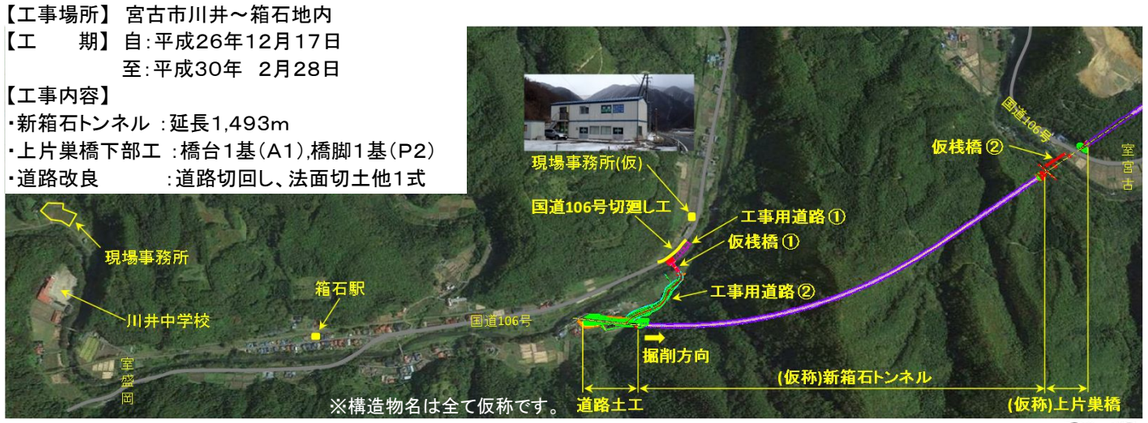

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省　東北地方整備局　三陸国道事務所　PPP宮古箱石道路施工監理
〒027-0029　宮古市藤の川4番1号　三陸国道事務所　東庁舎103号　（TEL）0193-77-4733



工事完了のお知らせ



宮古市腹帯地区で実施していた下記の工事が終了しました。

腹帯地区道路改良工事　施工：刈屋建設

盛土区間全景



宮古市腹帯地区で実施していました腹帯地区道路改良工事が終了しました。
この工事は、宮古箱石道路の土工事、市道交差部のボックスカルバート工及び工事用道路工を主体としました。
工事期間中は近隣の皆様や工事区間の市道を利用される方々には多大なご不便をお掛けしました。
今回の工事では道路全体が完成しておりませんが、次工事において継続されることとなります。

刈屋建設㈱
現場代理人：杉枝さん




腹帯地区をはじめ近隣地域の皆様、1年５ヵ月にわたりご協力いただき誠にありがとうございました。
宮古箱石道路の工事は早期完成へ向けて今後も行われていきます。
引き続きご理解、ご協力をお願い申し上げます。

★工事に協力いただいた皆さん
- 排水構造物工……三浦重機㈱
- ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置……㈱大伸産業
- ｸﾚｰﾝ工事……(有)熊谷ｸﾚｰﾝ

腹帯地区では刈屋建設さんに引き続き、
大豊・佐田特定建設工事共同企業体で工事を実施します。





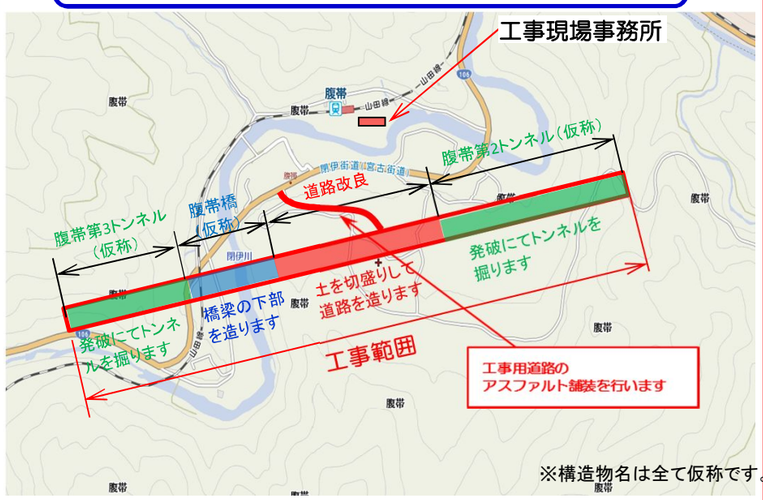

宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号

平成26年度　宮古箱石道路　工事一覧表

No.	工　事　名	工　期	請　負　業　者	本 社 所 在 地	現場事務所TEL	No.	工　事　名	工　期	請　負　業　者	本 社 所 在 地	現場事務所TEL
①	腹帯地区道路改良工事（完了）	H25.10.17～H27.2.27	刈屋建設㈱	岩手県宮古市	77−4104	⑦	山田宮古地区伐採作業	H26.4.22～H27.3.20	宮古地方森林組合	岩手県宮古市	62−1954
②	磯鶏小山田地区道路改良工事	H25.11.26～H27.3.20	㈱森本組	大阪府大阪市	77−4008	⑧	磯鶏石崎地区道路工事	H26.9.25～H27.3.31	㈱森本組	大阪府大阪市	77−4008
③	国道45号外 千徳小山田道路工事	H26.3.7～H28.3.30	前田建設工業㈱	東京都千代田区	62−3162	⑨	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3～H29.6.30	大豊・佐田JV	東京都中央区	79−1855
④	藤原地区道路改良工事	H26.4.2～H27.3.20	松尾建設㈱	佐賀県佐賀市	62−6756	⑩	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16～H31.3.15	大成建設㈱	東京都新宿区	77−5653
⑤	川井地区道路改良工事	H26.4.2～H27.3.31	三好建設㈱	岩手県宮古市	76−2020	⑪	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17～H30.2.28	㈱安藤・間	東京都港区	85−1525
⑥	松山地区道路改良工事	H26.7.3～H27.3.31	樋下建設㈱	岩手県盛岡市	77−5536	⑫	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19～H31.2.28	戸田・岩田地崎JV	東京都中央区	未定

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況

平成27年 3月 1日現在

③施工：前田建設工業



発破で砕いた岩塊をタイヤショベルとダンプで坑外まで搬出します。



地山からの湧水を下部に導水するため、トンネル面にシートを設置しています。

千徳14地割(宮古浄化センター南)から小山田トンネル(仮)を東側に向かって掘り進んでいます。1100mの内２００mほど進みました。
※左上写真「発破」:堅い岩をダイナマイトでほぐすこと。

道路汚損対策としてこのような取組をおこなっています

※各現場条件により内容等が異なります。



大型ダンプのタイヤに土が付着しないように鉄板を敷詰めています。



大型ダンプ専用のタイヤ洗浄機で洗い空転させてから現場を出発しています。



道路に出る前にタイヤを洗っています。



人手により道路を清掃しています。

宮古箱石道路　(宮古市藤原～宮古市箱石)延長 約33km







国道106号がら見える急傾斜な岩盤の切土に着手しました。
これから法面を安全に保つための特殊な法面工を施工します。



茂市腹帯工区の起点で伐採作業をしました。



道路が出来る範囲を削って、大型ダンプで土を搬出しています。



ボックスカルバートを設置するための基礎となるコンクリートの打設が完了しました。



山の斜面を植生で保護する為、吹付け作業を行っています。

※宮古箱石道路安全協議会の各工事は、土運搬作業（大型ダンプ）において視認性、安全走行のため昼間に前照灯を点灯させる「デイライト」を励行しています。

宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号
