がんばろう！東北　復興支援道路

発　行　日：　平成29年6月15日

宮古箱石道路通信　№39



サーモンくん　みやこちゃん

発　　行：　宮古箱石道路安全協議会
　　三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）
編集・監修：　国土交通省三陸国道事務所


工事現場紹介　小山田地区道路工事

TOBISHIMA CORPORATION
飛島建設株式会社

この工事は、宮古盛岡横断道路である宮古市藤原～宮古市箱石を結ぶ宮古箱石道路において、下図に示すように、主に４箇所を施工する工事であります。

① 磯鶏トンネルの終点側より709.1ｍを施工するトンネル工事。
② 現在開通している自動車専用道路である国道45号宮古道路を横断交差するボックスカルバートを施工する構造物工事。
③ 磯鶏トンネル終点坑口側において、橋台:1基、橋脚:1基の橋梁下部工を施工する構造物工事。
④ ボックスカルバート～既存の小山田トンネル間の切土(V=215,000m^3)を施工する土工事。

この工事を行うため、全国より経験のある職員を集め、この復興支援道路を安全且つ、早期完成を目指し頑張って参りますので、皆様の御理解と御協力を下さいますよう宜しくお願い致します。

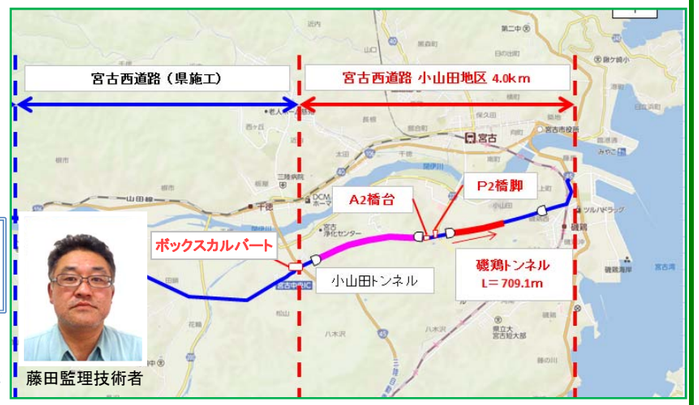

藤田監理技術者

◆工事名称:国道106号　小山田地区道路工事
◆工事場所:岩手県宮古市小山田～宮古市松山　地内
◆工事期間:平成29年４月１日～平成31年６月28日(予定)

施工者:　飛島建設株式会社　　宮古磯鶏トンネル作業所
　　宮古市崎鍬ヶ崎　第16地割3-1　　TEL　0193-77-5322

安全パトロールを実施 ～下川井トンネル工事～

５月18日（木）に国道106号 下川井トンネル工事（大成建設(株)）の安全パトロールを実施しました。このトンネルは2,050mと宮古箱石工区で最も長いトンネルです。危険な箇所がないか、工事関係者一同で重点的に見回りを行いました。現場内での改善点を取り入れ、大きな事故や怪我の起こらないよう、安全への配慮を忘れずに行っていくこととしました。





二級河川閉伊川～鮎の稚魚放流～

５月１７日（水）箱石地区道路工事（（株）安藤・間）では、現場近くの閉伊川に河川愛護の一環として鮎の稚魚１万匹を放流しました。閉伊川の苔をたくさん食べて大きく育ってくれるといいですね。

大きくなるのが待ち遠しいです。



ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省　東北地方整備局　三陸国道事務所　PPP宮古箱石工区　事業管理班
〒027-0029　宮古市藤の川4番1号　三陸国道事務所　東庁舎103号　（TEL）0193-77-4733

工事現場紹介　川井腹帯地区道路改良工事

大豊建設株式会社
大豊建設株式会社

宮古箱石道路の川井総合事務所北側において上川井橋の橋台2基構築と本線176m掘削盛土工事、市道TV中継所線の付替え工事、腹帯バス停の南側において本線1,020mの掘削盛土工事を行う大豊建設株式会社です。

現場は川井工区において、平成29年7月頃より仮設道路から施工を始める予定です。その際には、大型車の通行があるため地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事概要】
川井工区　　腹帯工区
本線L=176m　　本線L=1,020m
市道TV中継所線付替:1式
上川井橋下部工:1式



空から見た宮古箱石道路

【第2回】　茂市腹帯工区　上腹帯橋付近

今回で２回目となります「空から見た宮古箱石道路」は、**茂市腹帯工区**（L=7.0km）を紹介します。

撮影は国道１０６号上腹帯橋付近でドローンを使って撮影しました。現在この付近では、（仮）腹帯第２トンネル、（仮）腹帯第３トンネル、（仮）腹帯橋の工事が進められています。

写真①は盛岡方向から宮古方向を見た写真で土工工事が進められており、奥の方に（仮）腹帯第２トンネル坑口が確認できます。

写真④は宮古方向から盛岡方向を見た写真で（仮）腹帯橋の橋台、橋脚の工事が進められており、奥の方には（仮）腹帯第３トンネル坑口が確認できます。

空から見てみると、どんなふうに道路が出来るのかわかりやすいですね。

今後も工事が進む様子をこのコーナーにてお伝えしていきます。



宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号

平成29年度　宮古箱石道路　工事一覧

No.	工　　事　　名	工　　期	受　注　者	現場事務所TEL
①	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19～H31.3.29	戸田・岩田地崎JV	65-7007
②	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3～H29.6.30	大豊・佐田JV	79-1855
③	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16～H31.3.29	大成建設㈱	77-5653
④	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17～H30.2.28	㈱安藤・間	85-1525
⑤	国道106号 磯鶏地区道路工事	H28.4.1～H31.9.27	大成建設㈱	77-5162

No.	工　　事　　名	工　　期	受　注　者	現場事務所TEL
⑥	小山田松山地区道路改良工事	H28.8.3～H29.8.10	㈱淺沼組	77-5356
⑦	国道106号　茂市トンネル工事	H28.11.26～H31.3.15	前田建設工業㈱	79-1685
⑧	国道106号　小山田地区道路工事	H29.4.1～H31.6.28	飛島建設㈱	77-5322
⑨	川井腹帯地区道路改良工事	H29.4.3～H30.3.20	大豊建設㈱	77-3750

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況

平成29年5月15日現在

④施工：安藤・間



(仮)新箱石トンネルの掘削を行っています。全長1493mのうち989mまで進んでいます。



(仮)上片巣橋A1橋台の床堀り、P1橋脚梁部の型枠組立を行っています。

①施工：戸田・岩田地崎JV



P1橋脚の床掘を、ブレーカーを使用して施工しています。



仮設桟橋を設置するための150tクレーンを組み立てています。

⑥施工：淺沼組



(仮)小山田こ道橋P1橋脚では、柱部のコンクリート養生を行っています。

宮古箱石道路　（宮古市藤原～宮古市箱石）　延長 約33km



③施工：大成建設



(仮)下川井トンネルの掘削を行っています。全長2050mのうち155mまで進んでいます。



トンネル出口側の古田地区で、国道を切り回すために護岸工事を行っています。

②施工：大豊・佐田JV



P2橋脚は足場解体を始めます。P3橋脚については引続き鉄筋組立、コンクリート打設を進めていきます。

⑦施工：前田建設工業



(仮)茂市トンネル・(仮)下茂市橋A2橋台を施工するための仮設桟橋をつくっています。

⑤施工：大成建設



藤原・磯鶏地区で山を掘削して土砂を搬出しています。

宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号
