がんばろう！東北　復興支援道路　発　行　日：　平成29年9月15日

宮古箱石道路通信　№42





発　　行：　宮古箱石道路安全協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）
編集・監修：　国土交通省三陸国道事務所

宮古箱石道路の工事進捗を実感！
～宮古商工会議所（１５名）が茂市腹帯工区の工事進捗状況を見学～

平成２９年８月２２日（火）、宮古商工会議所（１５名）による「宮古箱石道路」の現場見学会が行われました。現場は茂市トンネル工事と茂市地区道路工事で、宮古箱石道路の整備効果と茂市トンネル工事の概要について説明を受け見学しました。見学者からは「トンネルの掘削は一日どのくらいですか？」との質問があり「３～４m/日です。」と回答しました。茂市地区道路工事では掘削中のトンネルに入り、工事の進捗について説明を受けました。直接現場に触れることにより、より工事の進捗状況が実感出来たことと思います。


宮古箱石道路の整備効果について説明を受けました。


茂市トンネル工事の概要を熱心に聞いてます。


現在掘削中のトンネル内を見学しました。

工事現場紹介　腹帯地区道路工事
～着実に進む　（仮）腹帯橋　～

大豊建設株式会社
佐田建設株式会社


【H28.6の工事状況】


【H28.9.4 台風10号の被害状況】


【H29.2 順調に進むＰ２、Ｐ３橋脚】



【H29.8 完成したＰ２、Ｐ３橋脚】

腹帯地区道路工事（大豊・佐田JV）の（仮）腹帯橋は宮古箱石道路で最も長い橋で、橋長が232m有ります。Ｐ２橋脚は高さ32mもあり、平成27年12月に着工し平成29年８月に完成しました。平成28年8月末に台風10号の被害を受け大幅に工事が遅れたものの、作業員の努力により無事完成することが出来ました。

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省　東北地方整備局　三陸国道事務所　PPP宮古箱石工区　事業管理班
〒027-0029　宮古市藤の川4番1号　三陸国道事務所　東庁舎103号　（TEL）0193-77-4733

工事完了報告　小山田松山地区道路改良工事
～株式会社 淺沼組～　工期：H28.8.3～H29.8.10

Asanuma

平成28年8月3日からのスタートであった「小山田松山地区道路改良工事」が、平成29年8月10日をもちまして工事が完了いたしました。本工事は、小山田地区においてはＰ１橋脚1基と道路掘削及び土砂搬出（11,920m³）、松山地区においては道路掘削及び土砂搬出（36,010m³）の工事を携わりました。
思い出といたしましては、本工事を施工する前に台風10号（平成28年8月30日）の影響により閉伊川の氾濫により甚大なる災害が発生し、当現場としては蟇目地区の流木の撤去を含め他の施工会社さんと国道106号の啓開作業に携わったことを思い出されます。
最後に当現場も関係各位様のおかげを持ちまして無事故・無災害で完了したことをお礼申し上げます。



【松山地区、小山田地区　位置図】


【小山田地区】


【松山地区】


遠藤 忠 監理技術者

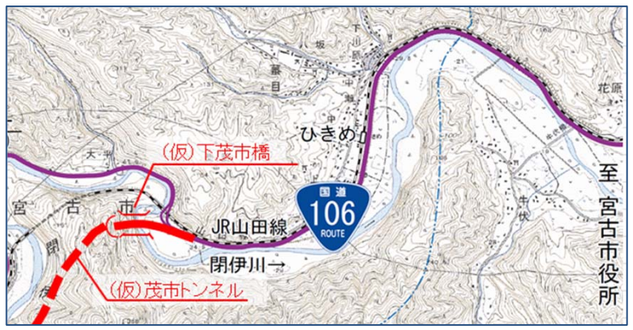

坂川 良彦 現場代理人

空から見た宮古箱石道路

【第４回】　茂市腹帯工区
最も宮古市側の蟇目地区の状況

今回の「空から見た宮古箱石道路」は、**茂市腹帯工区の蟇目地区**の状況を紹介します。

蟇目地区は当工区で最も宮古よりで、（仮）下茂市橋を渡り茂市トンネルを抜けて盛岡方面へと行くことになります。
写真①は台風10号の被害直後の状況で流木等に覆われました。
写真②は台風の被害も漸く片付け、次なる工事の準備に取りかかりました。
写真③は漸く工事の準備が進められ、茂市トンネル工事のための仮桟橋、（仮）下茂市橋の下部工工事の為の仮締め切りの工事を進めています。




①H28．9．６の状況


②H29．2．３　の状況


③H29．8．１　の状況

宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号

平成29年度　宮古箱石道路　工事一覧

No.	工　事　名	工　期	受 注 者	現場事務所TEL
①	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19～H31.3.29	戸田・岩田地崎JV	65-7007
②	国道106号 腹帯地区道路工事	H26.12.3～H30.3.30	大豊・佐田JV	79-1855
③	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16～H31.3.29	大成建設㈱	77-5653
④	国道106号 箱石地区道路工事	H26.12.17～H30.2.28	㈱安藤・間	85-1525
⑤	国道106号 磯鶏地区道路工事	H28.4.1～H31.9.27	大成建設㈱	77-5162

No.	工　事　名	工　期	受 注 者	現場事務所TEL
⑥	小山田松山地区道路改良工事（完了）	H28.8.3～H29.8.10	㈱淺沼組	77-5356
⑦	国道106号　茂市トンネル工事	H28.11.26～H31.3.15	前田建設工業㈱	79-1685
⑧	国道106号　小山田地区道路工事	H29.4.1～H31.6.28	飛島建設㈱	77-5322
⑨	川井腹帯地区道路改良工事	H29.4.3～H30.3.20	大豊建設㈱	77-3750
⑩	腹帯上川井地区道路改良工事	H29.7.19～H31.3.25	大豊建設㈱	72-2001
⑪	茂市腹帯地区道路改良工事	H29.7.19～H31.3.27	㈱森本組	―

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況

平成29年8月15日現在

④施工：安藤・間



(仮)新箱石トンネルの掘削を行っています。全長1,493mのうち1227mまで進んでいます。



(仮)上片巣橋A1橋台の鉄筋組立を行っています。

①施工：戸田・岩田地崎JV



(仮)腹帯第1トンネルの掘削を行っています。全長1,774mのうち44mまで進んでいます。



急斜面に落石防護柵を設置するための足場を組んでいます。

⑥施工：淺沼組



(仮)小山田こ道橋P1橋脚は、8/10をもって完成いたしました。

⑤施工：大成建設



藤原・磯鶏地区で山を掘削して土砂を搬出しています。

宮古箱石道路　（宮古市藤原～宮古市箱石）　延長 約33㎞



③施工：大成建設



(仮)下川井トンネルの掘削を行っています。全長2,050mのうち245mまで進んでいます。



トンネル出口側の古田地区で、国道を切り回すために護岸の拡幅工事を行っています。

⑨施工：大豊建設



川井腹帯地区道路改良工事では、準備工の伐採が完了しました。

②施工：大豊・佐田JV



(仮)腹帯第3トンネルの覆工コンクリート打設準備を進めています。

⑦施工：前田建設工業



(仮)茂市トンネルを施工するための工事用道路を施工しています。

⑧施工：飛島建設



一般国道45号「宮古道路」を掘削し、函渠工の掘削を行っています。

宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号
