がんばろう!東北　復興支援道路

発　行　日：　令和元年８月15日

宮古箱石道路通信　№65



発　　行：　宮古箱石道路安全協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）
編集・監修：　国土交通省三陸国道事務所

磯鶏トンネル（仮）が貫通しました！！

令和元年６月25日(火)磯鶏トンネル（仮）延長1,554m（大成建設(株)施工845m、飛島建設(株)施工709m）がこの度貫通しました。宮古箱石道路で計画されている11箇所のトンネルのなかで、７箇所目の貫通となります。

本トンネルは、平成29年12月に国道45号側（東側）から大成建設(株)がトンネル掘削に着手し、その後飛島建設(株)が盛岡市側（西側）から掘削を開始し、約１年６ヶ月で貫通しました。トンネルの両坑口から大成建設(株)と飛島建設(株)が力を合わせて掘削し、無事に貫通することができました。関係者の皆様ありがとうございます。

地域の皆様、引き続き復興・支援事業のご理解と、ご協力よろしくお願いいたします。









ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省　東北地方整備局　三陸国道事務所　PPP宮古箱石工区　事業管理班
〒027-0029　宮古市藤の川4番1号　三陸国道事務所　東庁舎103号　（TEL）0193-77-4733

三陸国道事務所 ホームページは
三陸国道　で検索出来ます。

腹帯第１トンネル（仮）貫通

令和元年６月28日(金)国道106号茂市地区道路工事（戸田・岩田地崎JV）において、腹帯第１トンネル（仮）（延長1,774m）が無事貫通しました。

宮古箱石道路で計画されている11箇所のトンネルのうち、８箇所目の貫通です。

腹帯第１トンネル（仮）は、平成29年７月に掘削を開始し約２年の時間を要してこの度貫通しました。

通常トンネルを掘削する場合は、片方の坑口から反対側に向かって掘削していきますが、このトンネルは本線のトンネルを掘削する前に作業用のトンネル（横坑）を掘削し本線にアプローチする、道路トンネルとして非常に珍しい工法を採用しました。

今後作業用のトンネルを塞ぐ工事が行われます。近くにお寄りの際には、この記事を思い出して眺めて見るのはいかがでしょうか。

無事に貫通させていただき、関係者の皆様ありがとうございます。

地域の皆様、引き続き復興道路･復興支援道路の整備にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。









ー編集後記ー

宮古にも暑い夏がやってまいりました！「お盆過ぎれば宮古は秋」なんてよく話しますが、まだまだ暑いと思うので体調管理には気を付けたいですね。

この時期は、夏休みやお盆で久しぶりに帰省される方が多いと思います。「新しい道路が出来れば帰省する時に楽」「どんどん宮古が変わっていくようで少しさびしい気もする」といろんなお声をいただきます。今回はどのような気持ちで工事の状況を見ていかれるのでしょうか。

時期的に交通量が多くなりますので、運転にはくれぐれもお気をつけください。

宮古市キャラクター利用許可　水　第503号

令和元年度　宮古箱石道路　工事一覧表

No.	工　事　名	工　期	受 注 者	現場事務所TEL
①	国道106号 磯鶏地区道路工事	H28.4.1～R1.9.27	大成建設㈱	77-5162
②	国道106号 小山田地区道路工事	H29.4.1～R1.8.15	飛島建設㈱	77-5322
③	国道106号　磯鶏地区舗装工事	H30.12.4～R2.2.28	鹿島道路㈱	77-5715
④	国道106号 茂市トンネル工事	H28.11.26～R2.3.23	前田建設工業㈱	79-1685
⑤	茂市地区道路改良工事	H30.7.19～R1.12.20	㈱新井組	65-6655
⑥	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19～R2.3.23	戸田･岩田地崎JV	65-7007
⑦	茂市橋上部工工事	H30.9.7～R1.9.25	日本ファブテック㈱	ー
⑧	上茂市橋上部工工事	H30.3.30～R1.8.30	日本ファブテック㈱	65-7973
⑨	上茂市橋外床版工事	H31.4.1～R2.3.13	㈱新井組	65-6655
⑩	下腹帯橋上部工工事	H30.9.4～R1.11.8	㈱角藤	ー

No.	工　事　名	工　期	受 注 者	現場事務所TEL
⑪	腹帯上川井地区道路改良工事	H29.7.19～R1.8.30	大豊建設㈱	72-2001
⑫	国道106号　腹帯橋上部工工事	H30.9.20～R2.3.19	宮地エンジニアリング㈱	ー
⑬	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16～R1.12.27	大成建設㈱	77-5653
⑭	下川井地区舗装工事	R1.6.8～R2.3.16	㈱ガイアート	ー
⑮	古田地区舗装工事	R1.6.12～R2.3.16	大成ロテック㈱	ー
⑯	国道106号 川井地区トンネル工事	H29.11.15～R2.8.28	西松建設㈱	77-3777
⑰	上川井地区道路改良工事	H30.3.30～R1.7.31	岩田地崎建設㈱	65-8712
⑱	国道106号 片巣地区道路工事	H29.12.14～R1.10.24	㈱奥村組	65-8361
⑲	国道106号　新箱石大橋上部工工事	H30.4.1～R2.2.3	高田機工㈱	ー

宮古箱石道路（宮古～箱石）工事状況

令和元年7月15日現在

⑲施工：高田機工(株)



新箱石大橋(仮)上部工架設のための準備を行っています。

⑯施工：西松建設(株)



川井第2トンネル(仮)の掘削を行っています。全長1,782mのうち1,134mまで進んでいます。



川井第1トンネル(仮)の掘削を行っています。全長1,764mのうち985mまで進んでいます。

⑪施工：大豊建設(株)



腹帯第3トンネル(仮)では、落石防護柵と法面工の施工を行っています。

⑥施工：戸田・岩田地崎JV



腹帯第1トンネル(仮)の宮古側では、6/28をもって貫通しました。現在は、覆工を行っています。全長1774mのうち1060mまで進んでいます。

⑤施工：(株)新井組



茂市橋(仮)P1橋脚では、躯体の施工を行っています。

④施工：前田建設工業(株)




茂市トンネル(仮)の掘削を行っています。全長1,885mのうち1,310mまで進んでいます。

①施工：大成建設(株)



磯鶏トンネル(仮)（磯鶏側）では、覆工を行っています。延長845mのうち、671mまでコンクリート打設が進んでいます。

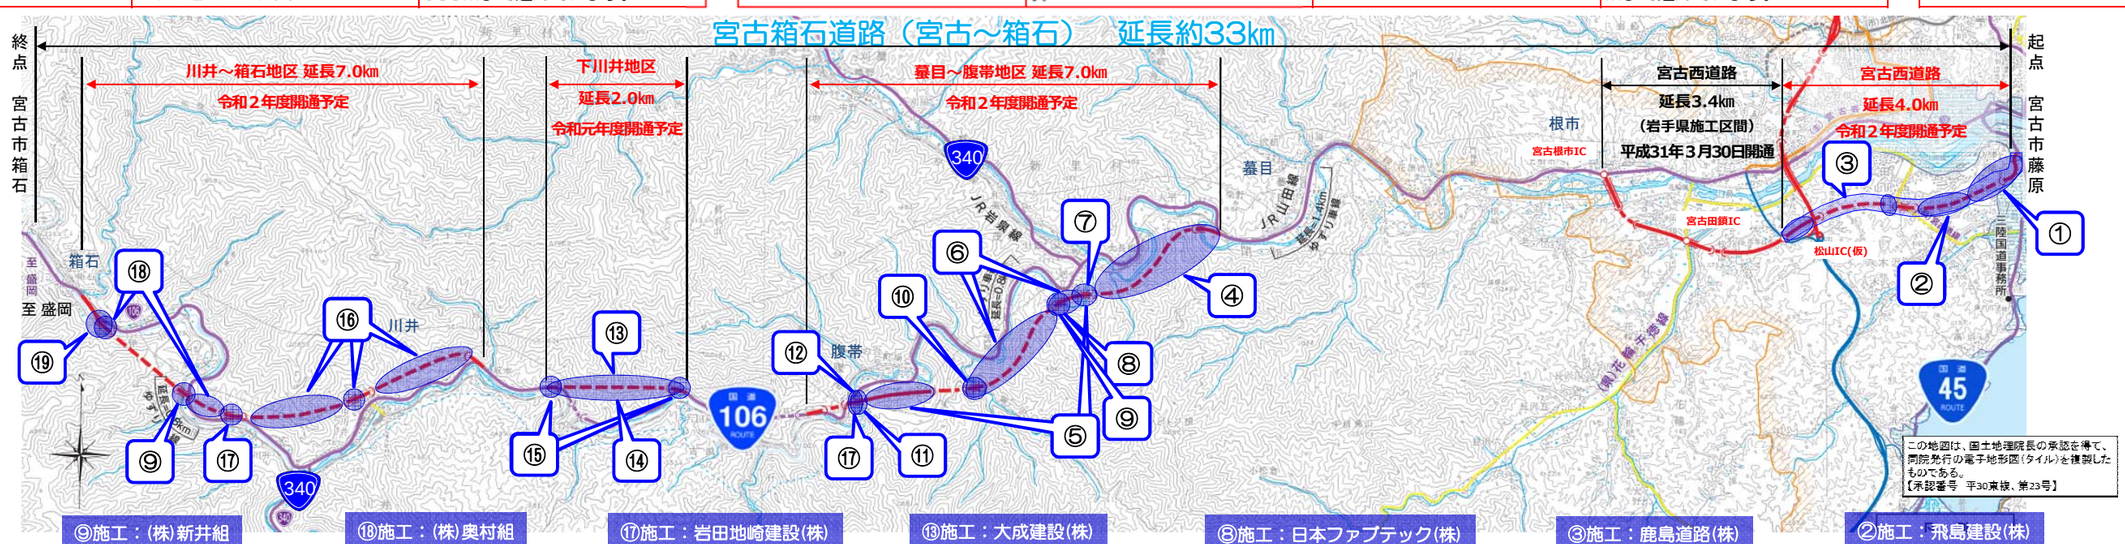

⑨施工：(株)新井組



上片巣橋(仮)では、床版を打設するための型枠を組立ています。

⑱施工：(株)奥村組



片巣トンネル(仮)では掘削が完了し、覆工コンクリート打設用のセントル組立を行っています。

⑰施工：岩田地崎建設(株)



腹帯橋(仮)P5橋脚では、躯体の施工が完了し、足場の解体を行っています。

⑬施工：大成建設(株)



下川井トンネル(仮)では掘削が完了し、覆工を行っています。全長2,050mのうち1,913mまでコンクリート打設が進んでいます。

⑧施工：日本ファブテック(株)



上茂市橋(仮)上部工の架設が完了し、情報管路工の施工を行っています。

③施工：鹿島道路(株)



小山田トンネル（仮）の中央分離帯剛性防護柵を施工中です。

②施工：飛島建設(株)



磯鶏トンネル(仮)では、6/25をもって貫通し、現在は覆工を行っています。全長710mのうち390mまで進んでいます。
