がんばろう！東北　復興支援道路

発　行　日：　令和元年９月15日

宮古箱石道路通信　№66

サーモンくん　みやこちゃん

発　　行：　宮古箱石道路安全協議会
　　三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）
編集・監修：　国土交通省三陸国道事務所

工事完了報告　～ 上川井地区道路改良工事 ～

岩田地崎建設㈱　　工期：H30.3.30～R1.7.31

今回の工事は、腹帯～上川井地区において、工事箇所が3箇所点在する工事でした。各現場を巡視するだけで半日程かかるため、1日2回巡視して1日が終わるというような状況でした。本当にあっという間に工事が終わったという気がしています。

腹帯地区では橋脚、川井地区では切土・盛土や鋼材を使用した仮橋による工事用道路、上川井地区では切土や法面工事による共通ランプ（本線への接続道路）の施工が主な工事でした。

工事が順調に進められ、無事故で工事完了できましたこと、地域の皆様のご理解とご協力あってのものと考えております。この場をお借りしてお礼申し上げます。

本当にありがとうございました。

全線開通を楽しみにしています。



石井 現場代理人



山形 監理技術者



【腹帯地区】腹帯橋（仮）P5橋脚



【川井地区】工事用道路



【上川井地区】共通ランプ

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省　東北地方整備局　三陸国道事務所　PPP宮古箱石工区　事業管理班
〒027-0029　宮古市藤の川4番1号　三陸国道事務所　東庁舎103号　（TEL）0193-77-4733

三陸国道事務所 ホームページは　三陸国道　で検索出来ます。

空から見た宮古箱石道路

工事の進捗状況　【腹帯橋（仮）】　施工箇所：裏面 ⑫（延長＝278m）



今回の「空から見た宮古箱石道路」は、腹帯橋（仮）（延長278m）です。

昨年８月と今年７月に撮影した写真を比較して、工事の進捗を見ていただきます。

【昨年８月時点の状況】

腹帯橋（仮）は、橋の土台である橋台２基、橋脚５基で構成される橋梁です。

昨年の８月時点では橋脚２基が未施工、１基が河川内を鋼矢板で締切り掘削の施工中でした。

橋のルートがほぼ確認できます。



【今年７月時点の状況】

左の写真のとおり橋脚５基が全て完成しました。

下部工（橋の土台）が全て完成し、橋のルートが完全に確認できます。

現在は上部工（橋桁）の架設（設置）準備が行われています。

もうすぐ鉄の橋桁を大きなクレーンで架設する様子が見られるようになります。

※橋台（Abutment）
　橋の両端にあり、橋を支える土台
※橋脚（Pier）
　橋台の間にあり、橋を支える柱

－編集後記－

不定期で「空から見た宮古箱石道路」を紹介してますが、使用している写真は「ドローン」を使って撮影してます。なかなか「同じポイント」から撮影することが難しいようなのですが、今回の「腹帯橋（仮）」はうまい具合に撮れたようで（偶然！？）、比較しやすい写真となりました。工事もどんどん進んでますが、撮影者の腕もどんどん上達しているようです。



宮古市キャラクター利用許可　水　第503号

令和元年度　宮古箱石道路　工事一覧表

No.	工　　事　　名	工　　期	受　注　者	現場事務所TEL	No.	工　　事　　名	工　　期	受　注　者	現場事務所TEL
①	国道106号 磯鶏地区道路工事	H28.4.1～R1.9.27	大成建設㈱	77-5162	⑪	下腹帯橋上部工工事	H30.9.4～R1.11.8	㈱角藤	ー
②	国道106号 小山田地区道路工事	H29.4.1～R2.1.31	飛島建設㈱	77-5322	⑫	腹帯上川井地区道路改良工事	H29.7.19～R1.8.30	大豊建設㈱	72-2001
③	国道106号　磯鶏地区舗装工事	H30.12.4～R2.2.28	鹿島道路㈱	77-5715	⑬	国道106号　腹帯橋上部工工事	H30.9.20～R2.3.19	宮地エンジニアリング㈱	65-6353
④	国道106号 茂市トンネル工事	H28.11.26～R2.3.23	前田建設工業㈱	79-1685	⑭	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16～R1.12.27	大成建設㈱	77-5653
⑤	下茂市橋上部工工事	R1.8.27～R2.6.30	高田機工㈱	ー	⑮	下川井地区舗装工事	R1.6.8～R2.3.16	㈱ガイアート	ー
⑥	茂市地区道路改良工事	H30.7.19～R1.12.20	㈱新井組	65-6655	⑯	古田地区舗装工事	R1.6.12～R2.3.16	大成ロテック㈱	ー
⑦	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19～R2.3.23	戸田･岩田地崎JV	65-7007	⑰	下川井地区標識設置工事	R1.8.15～R2.2.20	岩手道路開発㈱	ー
⑧	茂市橋上部工工事	H30.9.7～R2.2.5	日本ファブテック㈱	ー	⑱	国道106号 川井地区トンネル工事	H29.11.15～R2.8.28	西松建設㈱	77-3777
⑨	上茂市橋上部工工事	H30.3.30～R1.8.30	日本ファブテック㈱	65-7973	⑲	国道106号 片巣地区道路工事	H29.12.14～R1.10.24	㈱奥村組	65-8361
⑩	上茂市橋外床版工事	H31.4.1～R2.3.31	㈱新井組	65-6655	⑳	国道106号　新箱石大橋上部工工事	H30.4.1～R2.2.3	高田機工㈱	65-6274

宮古箱石道路（宮古～箱石）工事状況

令和元年8月15日現在

⑱施工：西松建設(株)



川井第2トンネル(仮)の掘削を行っています。全長1,782mのうち1,277mまで進んでいます。



川井第1トンネル(仮)の掘削を行っています。全長1,764mのうち1,078mまで進んでいます。

⑫施工：大豊建設(株)



腹帯第3トンネル(仮)では、落石防護柵の施工が完了し、現場内の片付けを行っています。

⑦施工：戸田・岩田地崎JV



下腹帯橋(仮)下部工では、A2橋台背面埋戻しが終了し、今月より⑪の工事で、上部工を架設するための準備を行っています。

⑥施工：(株)新井組



茂市橋(仮)P1橋脚では、躯体の施工を行っています。

④施工：前田建設工業(株)




茂市トンネル(仮)の掘削を行っています。全長1,885mのうち1,387mまで進んでいます。

①施工：大成建設(株)



磯鶏トンネル(仮)（磯鶏側）では、覆工を行っています。延長845mのうち786mまでコンクリート打設が進んでいます。

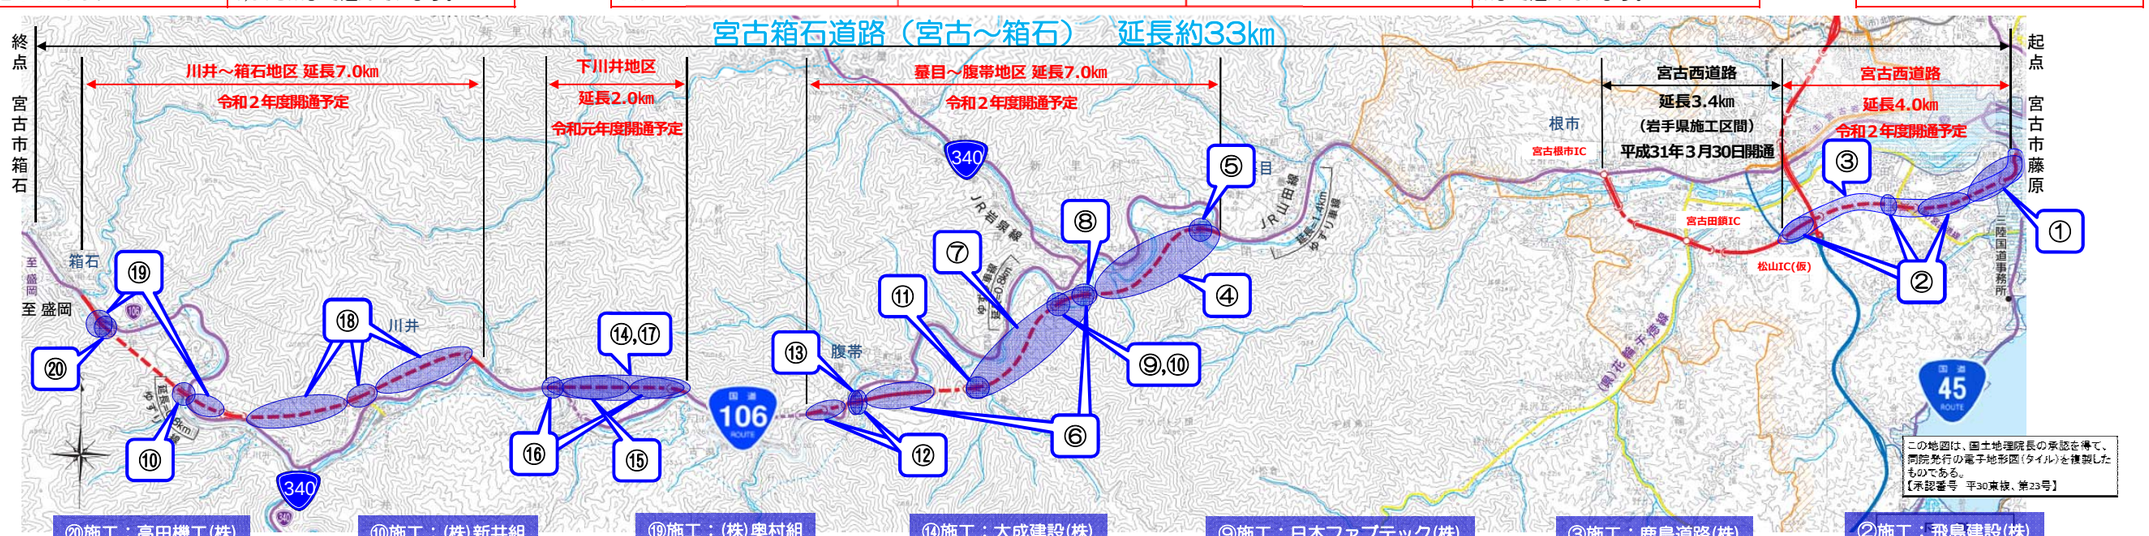

⑳施工：高田機工(株)



新箱石大橋(仮)上部工架設のための準備を行っています。

⑩施工：(株)新井組



上片巣橋(仮)では、床版を打設するための鉄筋を組立ています。

⑲施工：(株)奥村組



片巣トンネル(仮)では掘削が完了し、覆工を行っています。全長559mのうち87mまでコンクリート打設が進んでいます。

⑭施工：大成建設(株)



下川井トンネル(仮)では掘削が完了し、覆工を行っています。全長2,050mのうち1,963mまでコンクリート打設が進んでいます。

⑨施工：日本ファブテック(株)



上茂市橋(仮)上部工の架設が完了し、橋梁付属物の施工を行っています。

③施工：鹿島道路(株)



松山地区で、排水構造物の施工を行っています。

②施工：飛島建設(株)



磯鶏トンネル(仮)（小山田側）では、坑門工と覆工を行っています。延長710mのうち430mまでコンクリート打設が進んでいます。
