がんばろう！東北　復興支援道路

発　行　日：　令和元年10月15日

宮古箱石道路通信　№67



発　　行：　宮古箱石道路安全協議会
　　三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）
編集・監修：　国土交通省三陸国道事務所

安全パトロールを実施
～　工事現場の安全を点検　～

令和元年８月29日（木）国道106号下川井トンネル工事（大成建設（株））にて、現場の安全点検を実施しました。

点検を実施することにより気づいた点を改善し、さらに安全に対する意識を高め、無事故・無災害を目指します。





道路の清掃を行いました

令和元年９月20日（金）小山田地区の道路清掃を行いました。

歩道に溜まっている土砂の撤去や、雑草・ゴミ類を収集しました。地域のみなさまの生活環境と、道路を利用する方々の安全で快適な交通を確保するために、今後も活動を行ってまいります。





ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省　東北地方整備局　三陸国道事務所　PPP宮古箱石工区　事業管理班
〒027-0029　宮古市藤の川4番1号　三陸国道事務所　東庁舎103号　（TEL）0193-77-4733

三陸国道事務所 ホームページは
三陸国道 で検索出来ます。

『やまびこフェスタ』で
宮古盛岡横断道路 パネル展開催！！

令和元年９月14日（土）道の駅やまびこ館で開催された『やまびこフェスタ』で、宮古盛岡横断道路パネル展を開催しました。

当日は秋晴れということもあり、やまびこフェスタにはたくさんの方が来場されました。

パネル展にも足を止めていただき、工事の進捗状況を説明したり、質問などにお答えすることができました。

また「子どもたちに道路を作る仕事に興味を持ってもらえたら」と始めてから恒例となりました『ボールすくいゲーム』には、お子様連れの家族が参加し楽しんでいただきました。



やまびこフェスタ開催！！




ボールすくいゲーム


テント内での様子


宮古盛岡横断道路ブース



盛岡側工区のパネルも展示

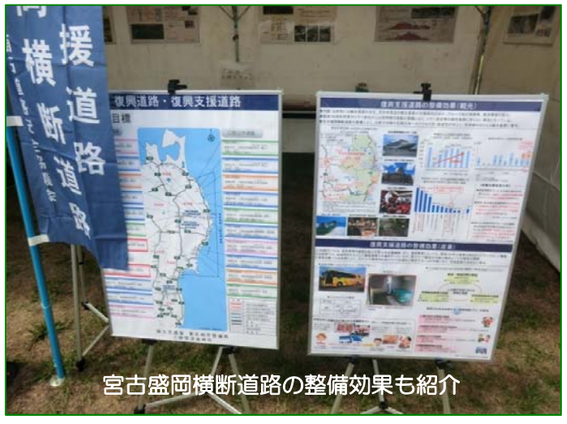

宮古盛岡横断道路の整備効果も紹介

宮古市キャラクター利用許可　水　第503号

令和元年度　宮古箱石道路　工事一覧表

No.	工　　事　　名	工　　期	受　注　者	現場事務所TEL	No.	工　　事　　名	工　　期	受　注　者	現場事務所TEL
①	国道106号 磯鶏地区道路工事	H28.4.1～R1.9.27	大成建設㈱	77-5162	⑩	下腹帯橋上部工工事	H30.9.4～R1.11.8	㈱角藤	65-7610
②	国道106号 小山田地区道路工事	H29.4.1～R2.1.31	飛島建設㈱	77-5322	⑪	国道106号　腹帯橋上部工工事	H30.9.20～R2.3.19	宮地エンジニアリング㈱	65-6353
③	国道106号　磯鶏地区舗装工事	H30.12.4～R2.2.28	鹿島道路㈱	77-5715	⑫	国道106号 下川井トンネル工事	H26.12.16～R1.12.27	大成建設㈱	77-5653
④	国道106号 茂市トンネル工事	H28.11.26～R2.3.23	前田建設工業㈱	79-1685	⑬	下川井地区舗装工事	R1.6.8～R2.3.16	㈱ガイアート	65-6601
⑤	下茂市橋上部工工事	R1.8.27～R2.6.30	高田機工㈱	ー	⑭	古田地区舗装工事	R1.6.12～R2.3.16	大成ロテック㈱	65-8577
⑥	茂市地区道路改良工事	H30.7.19～R1.12.20	㈱新井組	65-6655	⑮	下川井地区標識設置工事	R1.8.15～R2.2.20	岩手道路開発㈱	ー
⑦	国道106号 茂市地区道路工事	H27.2.19～R2.3.23	戸田・岩田地崎JV	65-7007	⑯	国道106号 川井地区トンネル工事	H29.11.15～R2.8.28	西松建設㈱	77-3777
⑧	茂市橋上部工工事	H30.9.7～R2.2.5	日本ファブテック㈱	65-7973	⑰	国道106号 片巣地区道路工事	H29.12.14～R1.10.24	㈱奥村組	65-8361
⑨	上茂市橋外床版工事	H31.4.1～R2.3.31	㈱新井組	65-6655	⑱	国道106号　新箱石大橋上部工工事	H30.4.1～R2.2.3	高田機工㈱	65-6274

宮古箱石道路（宮古～箱石）工事状況

令和元年9月15日現在

⑯施工：西松建設(株)



川井第2トンネル(仮)の掘削を行っています。全長1,782mのうち1,418mまで進んでいます。



川井第1トンネル(仮)の掘削を行っています。全長1,764mのうち1,170mまで進んでいます。

⑫施工：大成建設(株)



下川井トンネル(仮)では掘削が完了し、覆工を行っています。全長2,050mのうち残り10mまでコンクリート打設が進んでいます。

⑦施工：戸田・岩田地崎JV



腹帯第1トンネル(仮)では、覆工と坑門工の施工を行っています。全長1,774mのうち1,468mまでコンクリート打設が進んでいます。

⑥施工：(株)新井組



茂市橋(仮)P1橋脚では、躯体の施工が完了しました。現在は、腹帯地区で函渠の施工を行っています。

④施工：前田建設工業(株)




茂市トンネル(仮)の掘削を行っています。全長1,885mのうち1,460mまで進んでいます。

①施工：大成建設(株)



磯鶏トンネル(仮)（磯鶏側）では、覆工コンクリート打設が完了し、坑門工の施工を行っています。

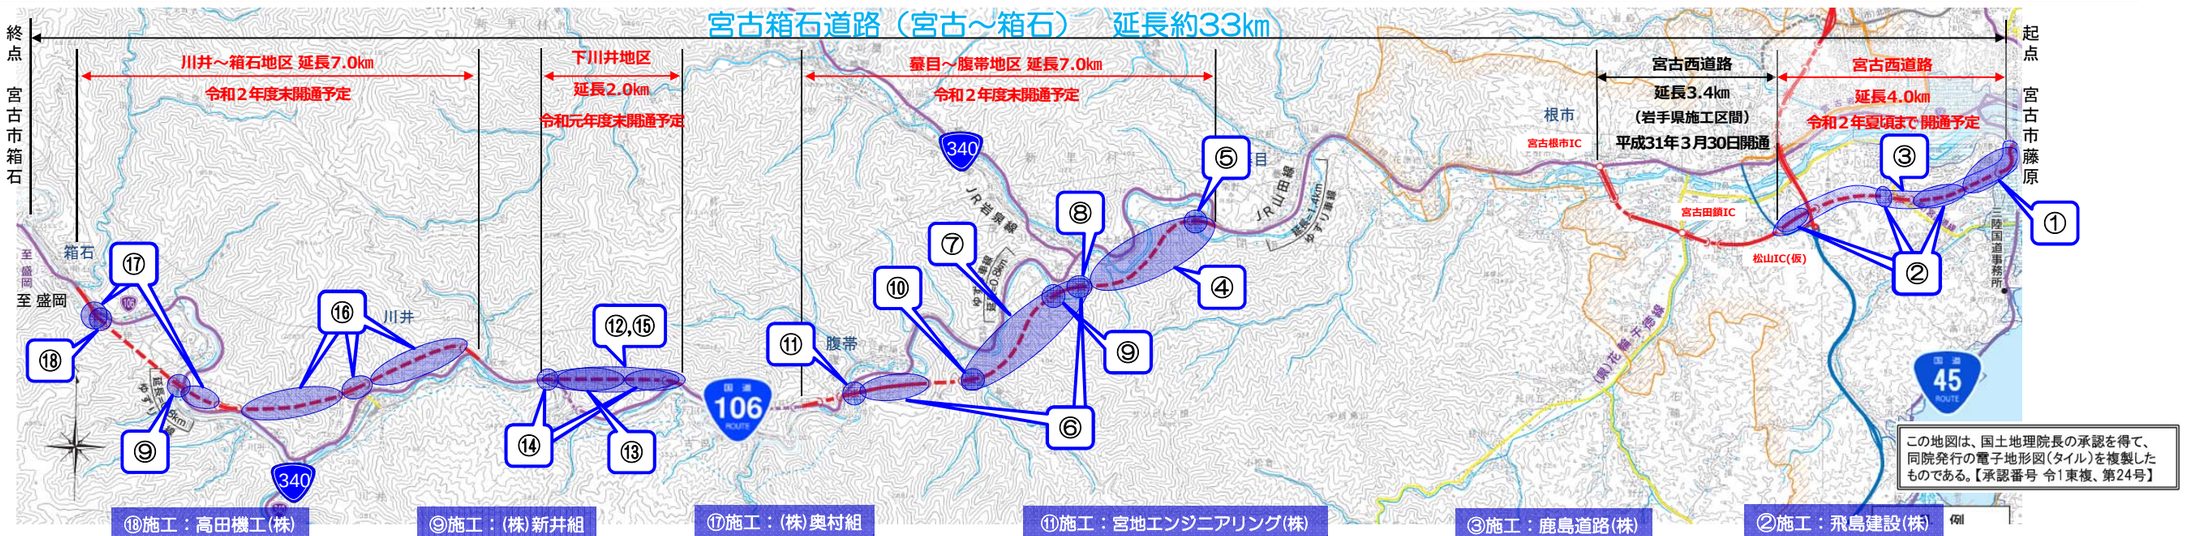


⑱施工：高田機工(株)



新箱石大橋(仮)上部工の架設を行っています。

⑨施工：(株)新井組



上片巣橋(仮)では、床版を打設するための、型枠と鉄筋の組立を行っています。

⑰施工：(株)奥村組



片巣トンネル(仮)では、覆工と坑門工の施工を行っています。全長559mのうち181mまでコンクリート打設が進んでいます。

⑪施工：宮地エンジニアリング(株)



腹帯橋(仮)上部工では、橋桁の組立の準備と、下部工検査路の取付けを行っています。

③施工：鹿島道路(株)



小山田こ道橋(仮)では、橋面防水、橋面舗装の施工を行っています。

②施工：飛島建設(株)



磯鶏トンネル(仮)（小山田側）では、坑門工と覆工を行っています。延長710mのうち438mまでコンクリート打設が進んでいます。
