
阿武隈川緊急治水対策プロジェクト（阿武隈川上流）の進捗状況 【R8.10末時点】

○令和元年東日本台風により、甚大な被害が発生した阿武隈川において、国、県、市町村が連携し、
「阿武隈川緊急治水対策プロジェクト」を進めています。
○国、県、市町村が連携し、以下の取り組みを実施していくことで、より水害に強いまちづくりを目指します。
①被害の軽減に向けた治水対策の推進　【河川における対策】　②地域が連携した浸水被害軽減対策の推進【流域における対策】
③減災に向けたさらなる取り組みの推進　【ソフト施策】

位置図

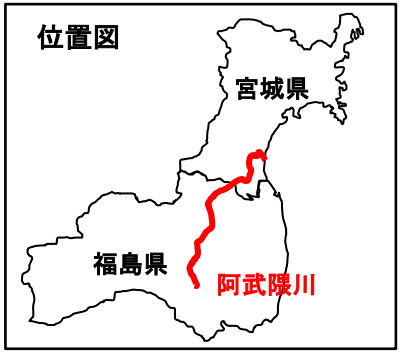


河川における対策
■全体事業費　約２，６６７億円
【国：約２，２７１億円、県：約３９６億円】
災害復旧　約　５４２億円
【国：約　２２９億円、県：約３１２億円】
改良復旧　約２，１２５億円
【国：約２，０４１億円、県：約８４億円】
■事業期間　令和元年度～令和１５年度
■目　標　令和元年東日本台風洪水における本川からの越水防止
■対策内容　河道掘削、堤防整備等


■流域における対策
・浸水リスクを考慮した立地適正化計画の展開
・一時貯留施設の設置

■ソフト対策
・バックウォータ現象を考慮した危機管理型水位計及びカメラの設置及び避難体制の構築
・中小河川や内水を考慮したタイムライン策定推進

【令和7年9月】

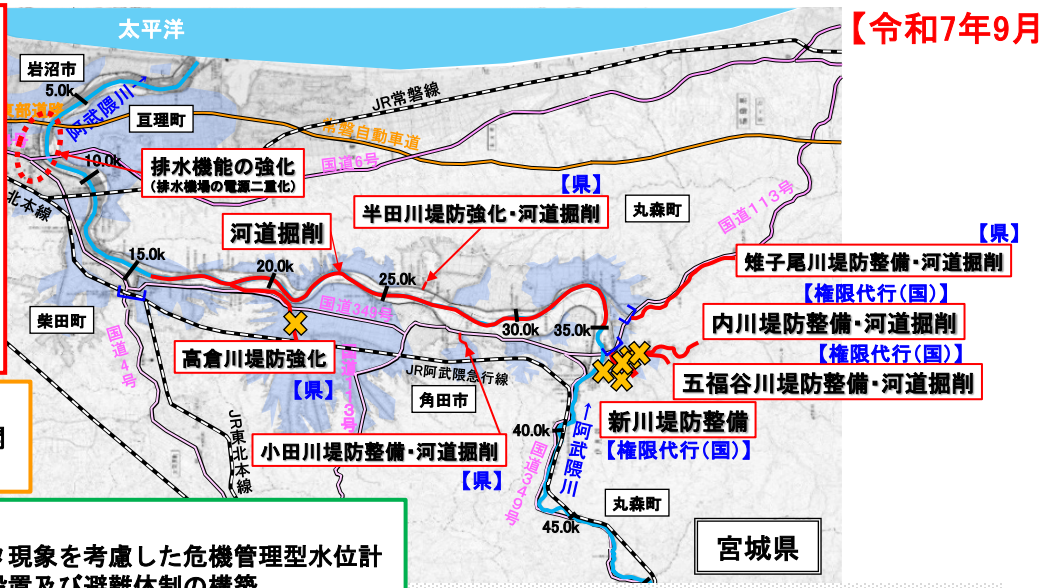



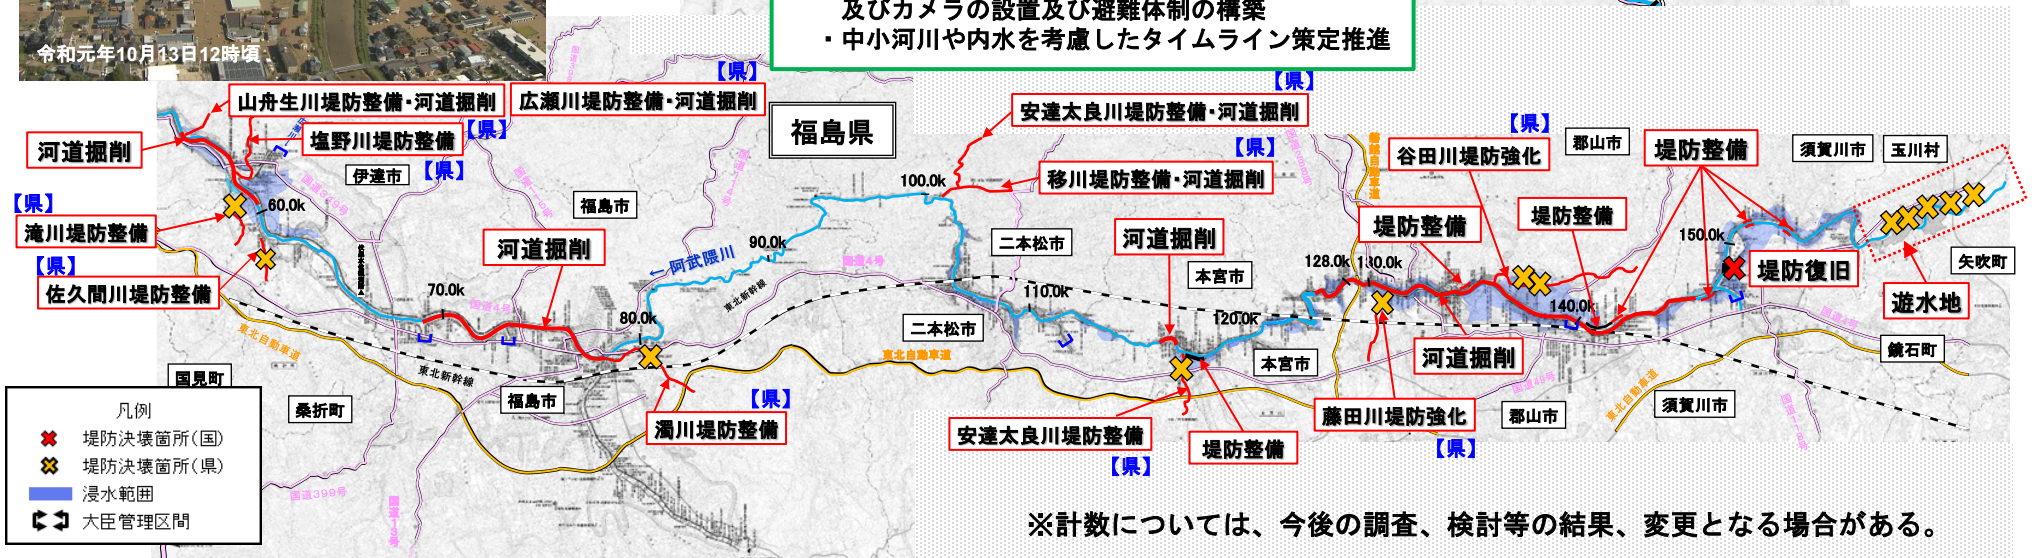

※計数については、今後の調査、検討等の結果、変更となる場合がある。

阿武隈川緊急治水対策プロジェクト（阿武隈川上流）の進捗状況 【R8.10末時点】

河道掘削

○河道を掘り、川が流すことのできる水量を増加させ、氾濫リスクを低下。

河道掘削全体 76%

①伊達地区 100%



着工前：2022年8月



掘削状況：2023年7月

②福島地区 100%



着工前：2023年3月



掘削状況：2023年11月

③本宮地区 100%




着工前：2020年10月



掘削後：2022年7月

④郡山地区 100%



着工前：2022年11月



掘削状況：2023年12月

⑤須賀川地区 22%




堤防整備

雲水峯大橋 85%　小作田地区 25%

○堤防の高さが不足している箇所の浸水被害軽減に向け、橋の架替及び堤防の嵩上げを実施。

【堤防整備の整備イメージ】

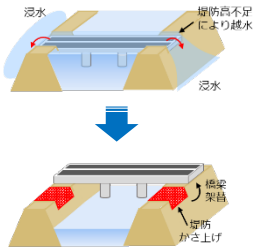

①雲水峯地区


地元説明 ⇔ 調査・測量・設計 → 下部工工事 → 上部工工事 → 旧橋撤去工事 → 築堤工事



工事中（2025年10月）

②小作田地区

地元説明 ⇔ 調査・測量・設計 → 下部工工事 → 上部工工事 → 旧橋撤去工事 → 築堤工事



工事中（2026年1月）

事業個所



遊水地事業

○鏡石町、玉川村、矢吹町にまたがる遊水地整備に向け現在、地元調整中。

地元調整 → 測量・設計 → 用地買収 → 工事





災害復旧

○壊れた堤防・護岸を元の状態に復旧した上で、コンクリートブロック等を設置し、浸食を抑制。

災害復旧全体 100%

①伊達地区 100%



着工前：2020年7月



施工後：2021年7月

②国見地区 100%



着工前：2020年9月



施工後：2021年7月

③福島地区 100%



着工前：2020年9月



施工後：2021年5月

④福島荒川地区 100%



着工前：2020年5月




施工後：2022年7月

⑤二本松地区 100%



着工前：2019年10月



施工後：2021年3月

⑥本宮地区 100%



着工前：2019年10月



施工後：2022年7月

⑦郡山地区 100%



着工前：2020年2月



施工後：2021年7月



着工前：2021年7月



施工後：2022年7月

⑧須賀川地区 100%



着工前：2019年10月



施工後：2021年5月



着工前：2019年10月



施工後：2022年7月

阿武隈川上流遊水地の進捗状況

【R8.10末時点】

■上流遊水地全体進捗

用地協議・補償	遊水地全体	約68%(239ha/350ha)
	第1遊水地	約80%(105ha/130ha)
	第2遊水地	約45%(54ha/120ha)
	第3遊水地	約80%(80ha/100ha)
堤防整備		未着手
地内掘削		▌完了 2%

※第2遊水地の進捗割合が低い理由
玉川村が大部分を占める第2遊水地の用地進捗率が第1遊水地と第3遊水地に比べて低い理由については、農地所有者の多くが住家の移転者であることが理由の一つとしてあげられる。

■第二遊水地進捗


堤防整備	未着手
地内掘削	▌完了 2%(試験圃場箇所含む)

■第三遊水地進捗

堤防整備	未着手
地内掘削	▌完了3%

■第一遊水地進捗

堤防整備	未着手
地内掘削	▌完了 2%

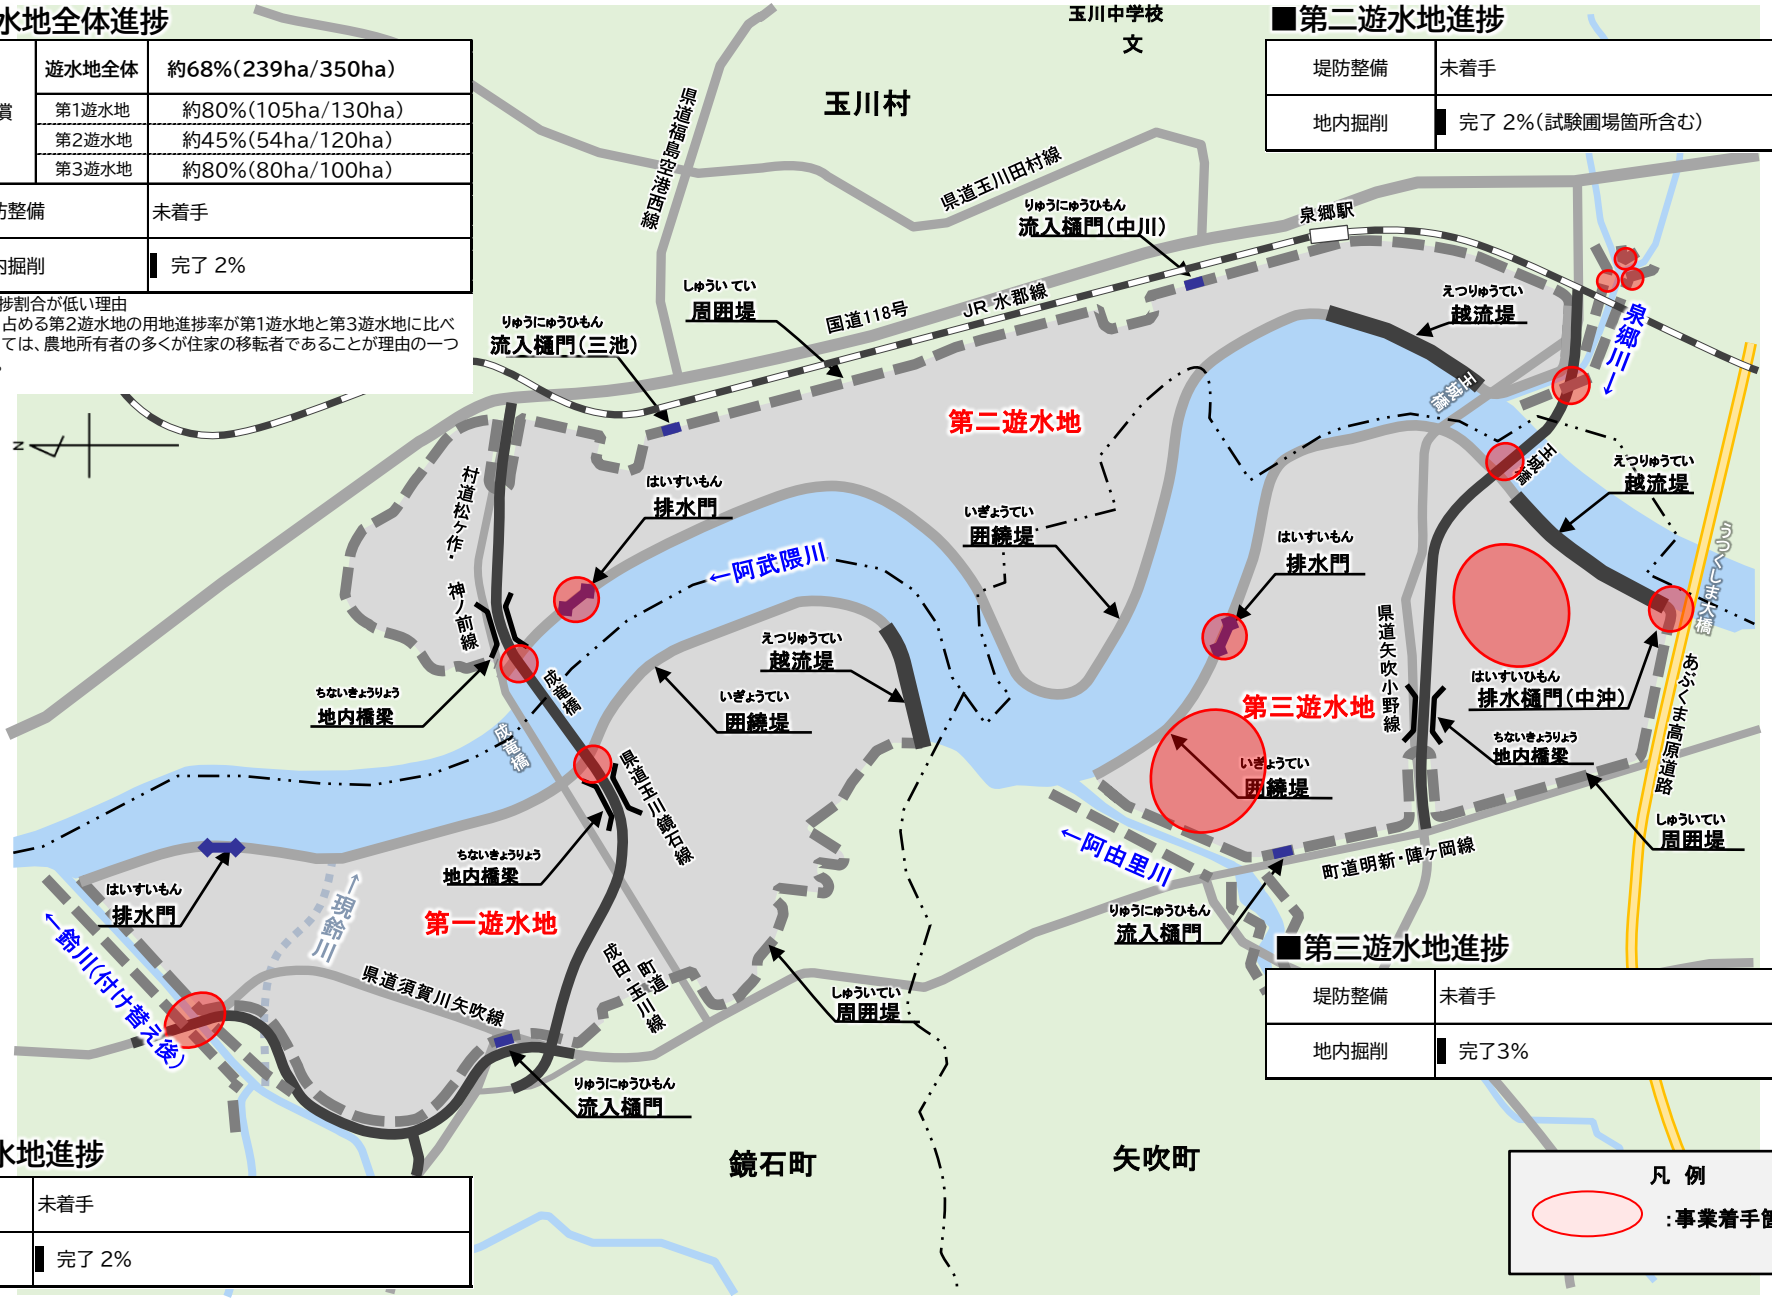


注)今後の検討結果等により、変更となる可能性もあります。

阿武隈川上流遊水地の進捗状況

【R8.10末時点】

■第一遊水地進捗

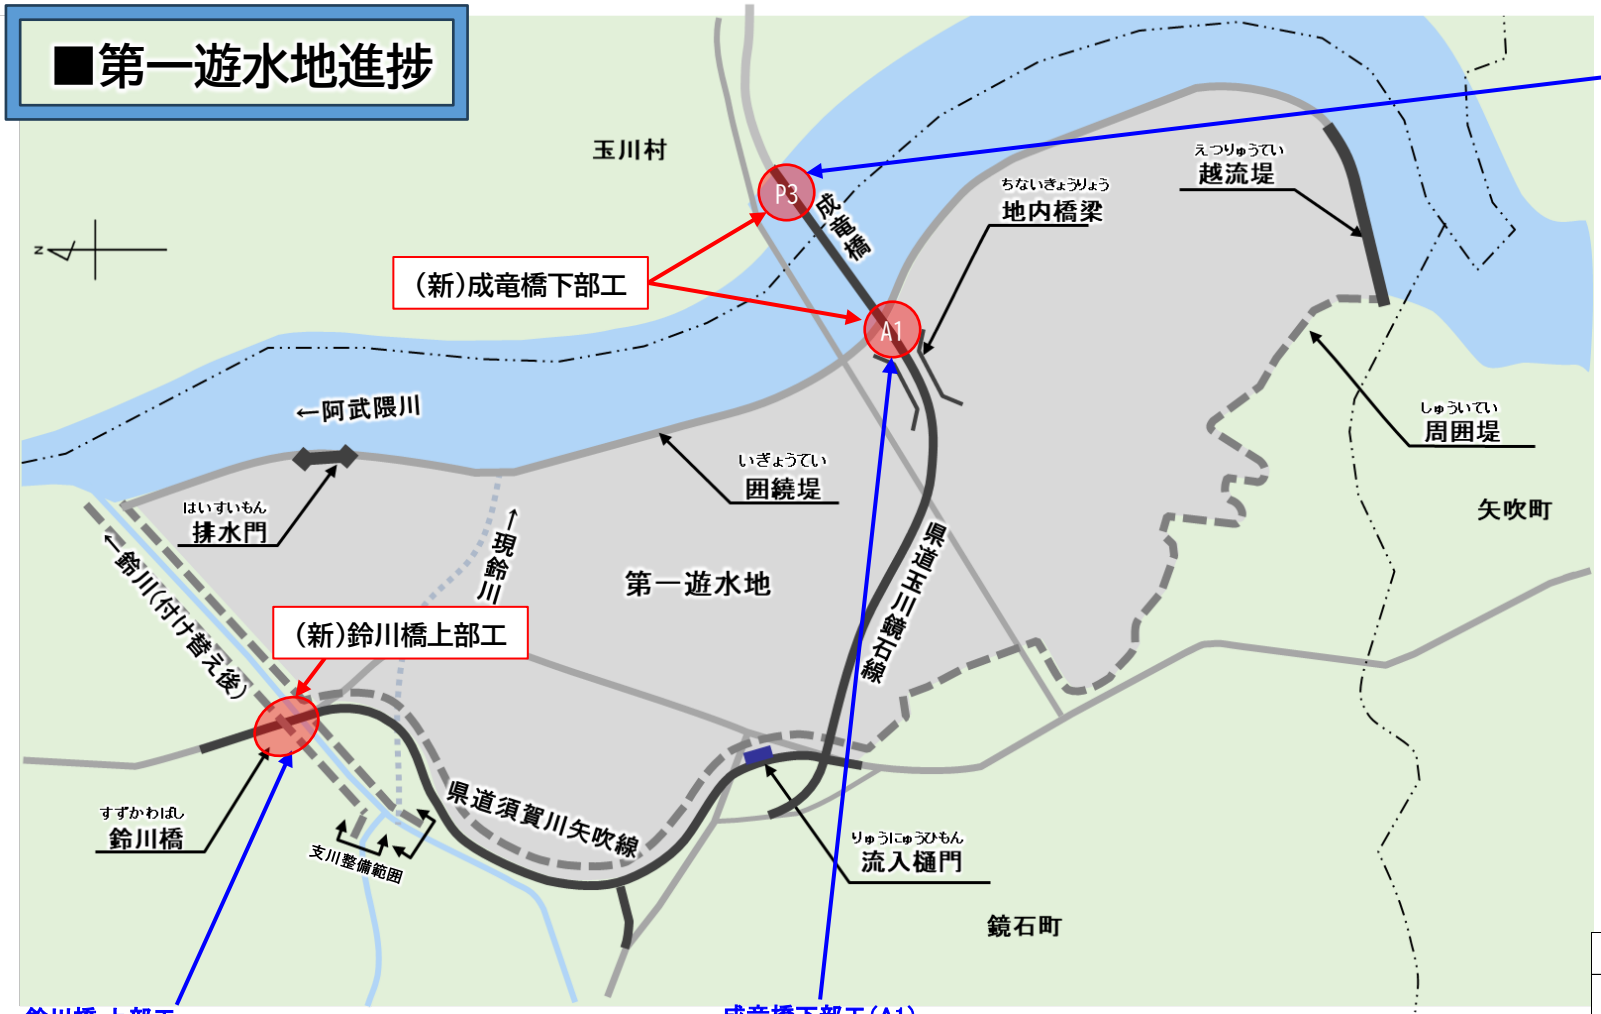

成竜橋下部工(P3)





鈴川橋 上部工





成竜橋下部工(A1)





囲繞堤	未着手
周囲堤	未着手
越流堤	未着手
地内掘削	完了 2%
排水門	未着手
流入樋門	未着手
県道玉川鏡石線	施工中
県道須賀川矢吹線	施工中 1%
支川 鈴川	未着手

阿武隈川上流遊水地の進捗状況

【R8.10末時点】

■第二遊水地進捗



吐口・樋門



泉郷川橋（A1）



第二排水門



囲繞堤	未着手
周囲堤	未着手
越流堤	未着手
地内掘削	▌完了 2%（試験圃場箇所含む）
排水門	施工中
流入樋門（三池）	未着手
流入樋門（中川）	未着手
県道玉川鏡石線	未着手
県道矢吹小野線	未着手
支川 泉郷川	未着手

阿武隈川上流遊水地の進捗状況

【R8.10末時点】

■第三遊水地進捗

第三排水門





地内掘削







玉城橋下部工(P1)



排水樋門(中沖)



地内掘削



試験圃場(畑)

囲繞堤	未着手
周囲堤	未着手
越流堤	未着手
地内掘削	▌ 完了 3%
排水門	施工中
流入樋門	未着手
県道矢吹小野線	未着手
町道明新・陣ヶ岡線	未着手
支川 阿由里川	未着手
