阿武隈川上流遊水地の進捗状況

【R8.10末時点】

■上流遊水地全体進捗

用地協議・補償	遊水地全体	約68%(239ha/350ha)
	第1遊水地	約80%(105ha/130ha)
	第2遊水地	約45%(54ha/120ha)
	第3遊水地	約80%(80ha/100ha)
堤防整備		未着手
地内掘削		▌完了 2%

※第2遊水地の進捗割合が低い理由
玉川村が大部分を占める第2遊水地の用地進捗率が第1遊水地と第3遊水地に比べて低い理由については、農地所有者の多くが住家の移転者であることが理由の一つとしてあげられる。

■第二遊水地進捗


堤防整備	未着手
地内掘削	▌完了 2%(試験圃場箇所含む)

■第三遊水地進捗

堤防整備	未着手
地内掘削	▌完了3%

■第一遊水地進捗

堤防整備	未着手
地内掘削	▌完了 2%

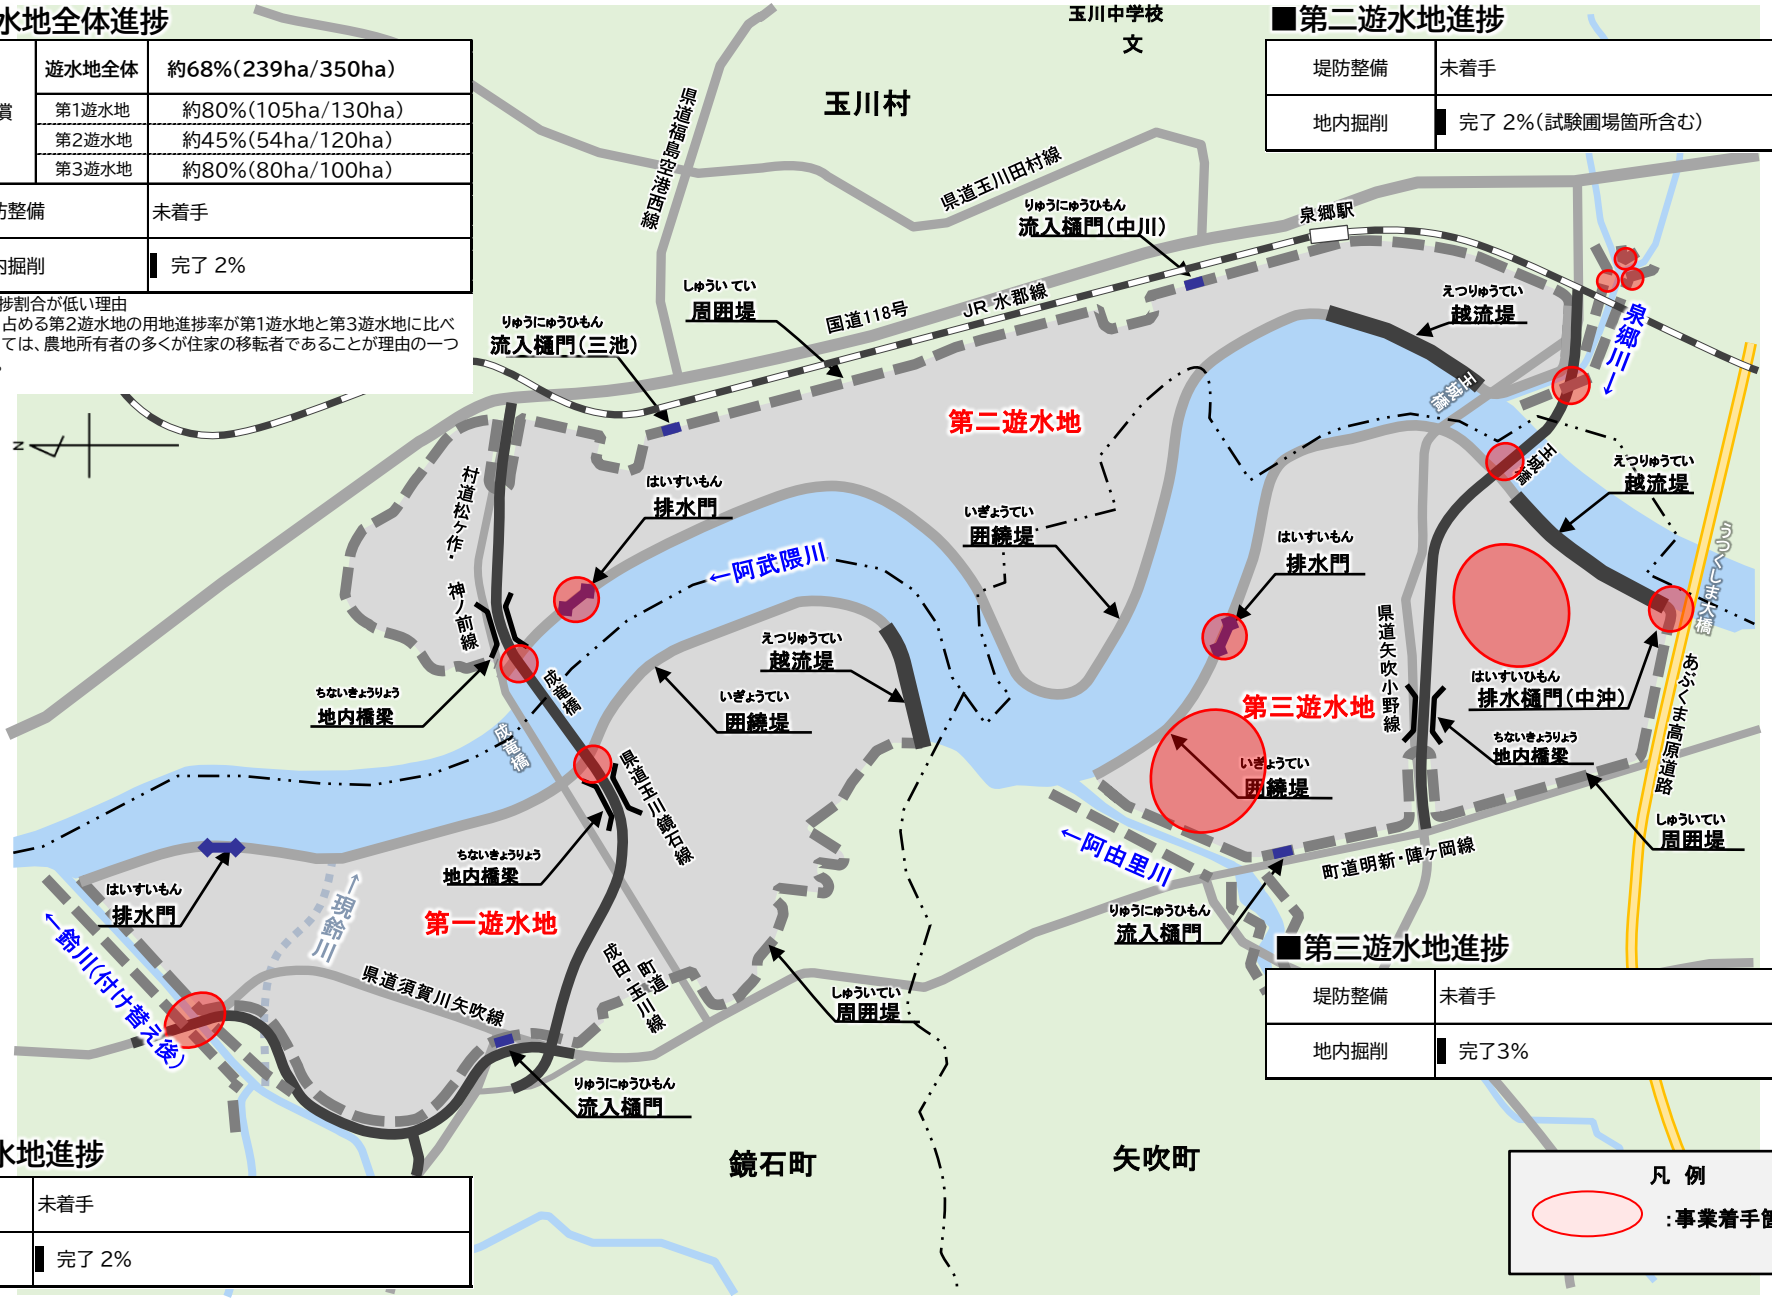


注)今後の検討結果等により、変更となる可能性もあります。

阿武隈川上流遊水地の進捗状況

【R8.10末時点】

■第一遊水地進捗

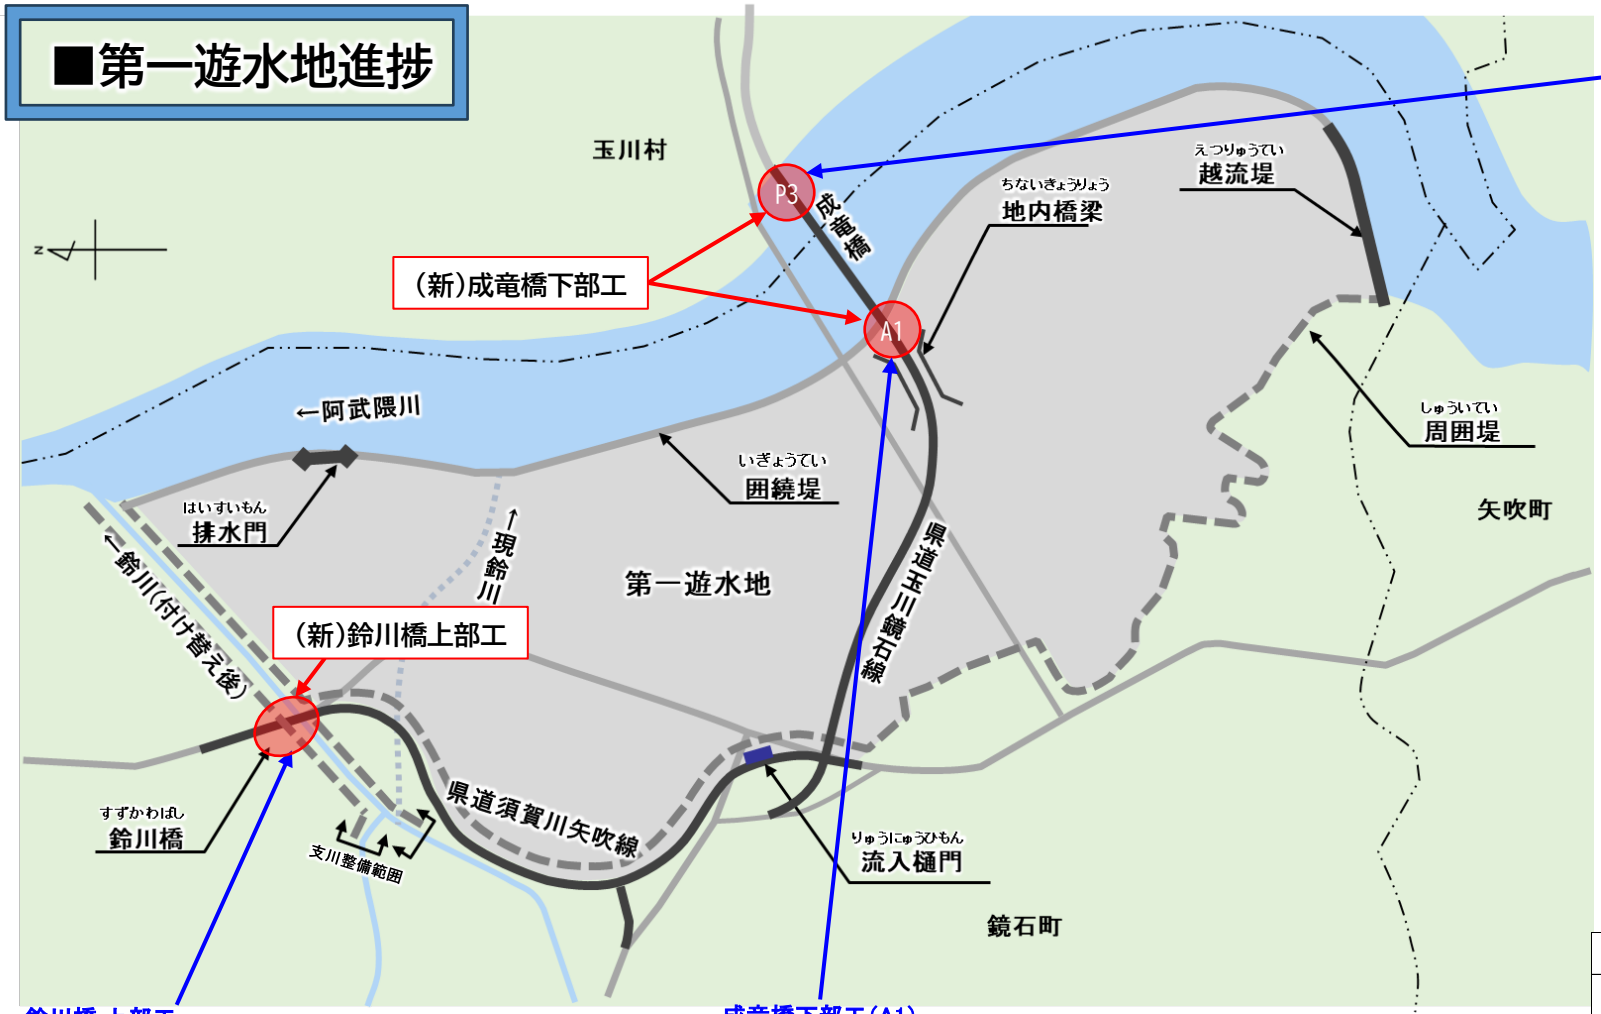

成竜橋下部工(P3)





鈴川橋 上部工





成竜橋下部工(A1)





囲繞堤	未着手
周囲堤	未着手
越流堤	未着手
地内掘削	完了 2%
排水門	未着手
流入樋門	未着手
県道玉川鏡石線	施工中
県道須賀川矢吹線	施工中 1%
支川 鈴川	未着手

阿武隈川上流遊水地の進捗状況

【R8.10末時点】

■第二遊水地進捗



吐口・樋門



泉郷川橋（A1）



第二排水門



囲繞堤	未着手
周囲堤	未着手
越流堤	未着手
地内掘削	▌完了 2%（試験圃場箇所含む）
排水門	施工中
流入樋門（三池）	未着手
流入樋門（中川）	未着手
県道玉川鏡石線	未着手
県道矢吹小野線	未着手
支川 泉郷川	未着手

阿武隈川上流遊水地の進捗状況

【R8.10末時点】

■第三遊水地進捗

第三排水門





地内掘削







玉城橋下部工(P1)



排水樋門(中沖)



地内掘削



試験圃場(畑)

囲繞堤	未着手
周囲堤	未着手
越流堤	未着手
地内掘削	▌ 完了 3%
排水門	施工中
流入樋門	未着手
県道矢吹小野線	未着手
町道明新・陣ヶ岡線	未着手
支川 阿由里川	未着手
