令和７年度
重要水防箇所図

赤　　川

酒田河川国道事務所

凡　例

種　　別	A	B	要注意
越　水 （溢　水）			
堤体漏水			
基礎地盤漏水			
水衝・洗掘			
橋　　梁			
新　堤　防			
旧　川　跡			
(漏水)破堤箇所			
危険箇所			
水防倉庫 (県市町村)			
緊急資材倉庫 (国土交通省)			
ＣＣＴＶ			

令和７年度 赤川重要水防箇所図

1：50,000 (1km=2cm)

1000 0 1000 2000 3000 4000 5000m

流域図

S＝1:400,000




赤川改修計画概要

水源地及び標高	山形県鶴岡市以東岳 1,771m
流域面積	857㎢（山地696㎢ 平地161㎢）
流路延長	本川 70Km、支川 大山川 27Km、支川 内川 17Km
氾濫防御区域	大臣管理区間内 306㎢
大臣管理区間	本川 33.0Km、支川 大山川 2.5Km、支川 内川 2.0Km
計画高水流量	（熊出地点）基本方針基本高水流量 5,300㎥/s 基本方針計画高水流量 3,200㎥/s
既往著名洪水	昭和15年7月12日（低気圧） 熊出地点約4,800㎥/s（最大流量） 昭和44年8月8日（前線） 熊出地点約2,940㎥/s（戦後最大流量） 昭和46年7月16日（前線） 熊出地点約2,210㎥/s 昭和62年8月29日（低気圧） 熊出地点約2,050㎥/s ＊流量は氾濫戻し流量


凡例

種別	A	B	要注意
越水（溢水）			
堤体漏水			
基礎地盤漏水			
水衝・洗掘			
橋梁			
新堤防			
旧川跡			
（漏水）破堤箇所			
危険箇所			
水防倉庫（県市町村）			
緊急資材倉庫（国土交通省）			
ＣＣＴＶ	CCTV		


赤川堤防標準断面図 S＝1:600



大山川堤防標準断面図 S＝1:600




内川堤防標準断面図 S＝1:600



赤川縦断面図

縮尺 縦1：600 横1：200.000

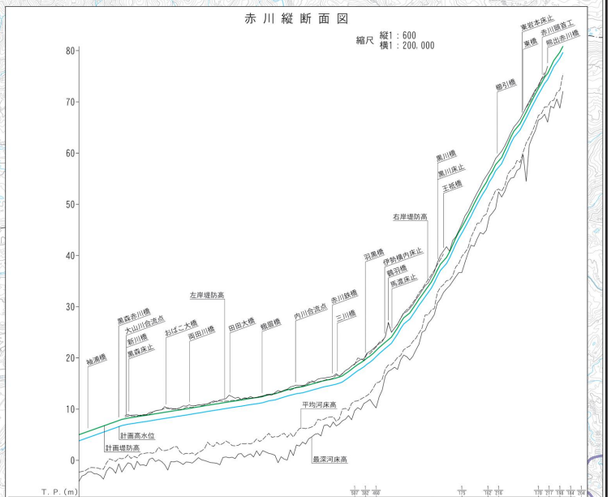

計画高水勾配	
計画堤防高	
計画高水位	
平均河床高	
距離標	

酒田市酒田水防団 第9分団
酒田市酒田水防団 第8分団
三川町水防団 第3分団
水防警報対象区域（浜中）
三川町水防団 第1分団
鶴岡市藤島方面隊 第5分団
鶴岡市羽黒方面隊 第1分団
水防警報対象区域（羽黒橋）
鶴岡市櫛引方面隊 第4分団
鶴岡市櫛引方面隊 第3分団
水防警報対象区域（熊出）
鶴岡市朝日方面隊 第4分団

酒田河川国道事務所
酒田市
酒田国道維持出張所
酒田出張所
三川町
庄内町
鶴岡市
山形県
新潟県
日本海東北自動車道
月山ダム管理所
月山国道維持出張所
赤川砂防出張所
赤川水位・流量観測所
新川橋水質観測所
蛾眉橋水質観測所
東橋水質観測所
熊出水位・流量観測所
大山川水位観測所
押切水位観測所
大臣管理区間


1 L=8,130m
2 L=170m
3 L=220m
4 L=130m
5 L=1,400m
6 L=230m
7 L=110m
8 L=1,420m
9 L=1,600m
10 L=1,100m
11 赤川橋梁
12 三川橋
13 L=300m
14 L=600m
15 黒川橋
16 L=3,380m
17 L=2,380m
18 L=1,000m
19 L=2,470m
20 L=880m
21 L=5,180m
22 L=400m
23 L=900m
24 L=1,191m
25 L=250m
26 L=2,200m
27 L=2,300m
28 L=1,970m
29 内川橋
30 内川橋梁
31 L=110m
32 L=820m
33 L=970m
2 おばこ大橋
3 両田川橋
4 田田大橋
5 L=1,150m
6 蛾眉橋
7 蛾眉歩道橋
8 L=4,420m
3 L=50m
20 L=500m
21 L=40m
16 L=80m
22 L=160m
23 L=970m
24 L=120m
25 L=150m
26 L=260m
27 L=60m
12 L=70m
13 L=50m
14 L=30m
15 L=40m
16 L=70m
17 L=40m
18 L=70m
19 L=170m

凡例

堤防		都府県界	
堤防（計画）		都市界	
中高水敷堀削法線		町村界	
兼用道路		大臣管理区間	
床止め・固定堰		法河川	
可動堰		水路その他	
用水樋門・樋管		事務所	
排水樋門・樋管		出張所	
用排水樋門・樋管		水位観測所（普通、自記）	
揚水機場		流量観測所（普通、自記）	
排水機場		雨量観測所（普通、自記）	
ダム（完成、工事中、実調）		水質観測所（一般、基準）	
橋梁		無線・テレメータ	
港橋		距離標	
サイフォン		感潮区間	
都市計画区域		直轄河川防御対象氾濫区域	
市街化区域		浸水区域（昭和15年7月12日）	
港湾区域及び漁港区域			
国道及び自動車専用道路			

大山川縦断面図


縮尺 縦1：300 横1：500.000



計画高水勾配	
計画堤防高	
計画高水位	
平均河床高	
距離標	

内川縦断面図


縮尺 縦1：300 横1：500.000



計画高水勾配	
計画堤防高	
計画高水位	
平均河床高	
距離標	

赤川計画高水流量図（H20改訂）

単位：㎥/sec （ ）は基本高水流量

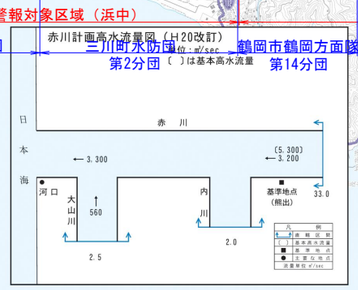

水防警報対象区域（浜中）
酒田市酒田水防団 第9分団
三川町水防団 第2分団
鶴岡市鶴岡方面隊 第14分団
水防警報対象区域（羽黒橋）
鶴岡市鶴岡方面隊 第3分団
鶴岡市鶴岡方面隊 第1分団
鶴岡市鶴岡方面隊 第4分団
鶴岡市櫛引方面隊 第1分団
水防警報対象区域（熊出）
鶴岡市櫛引方面隊 第2分団
鶴岡市朝日方面隊 第4分団
1特定の区間

平成二十五年三月現在 国土交通省東北地方整備局 酒田河川国道事務所

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の２万５千分の１地形図を使用した。（承認番号 平24情使、第244-30585号）」

北海道地図株式会社山形営業所
電話（023）623-6418

令和7年度　赤川重要水防箇所（左岸より順次）

図面番号	河川名	岸	重要水防箇所		重　要　度		評　定		対策水防工法名	関連市町村	※担当出張所等
			地先名	距離標位置	種別	ランク	堤防（m）	工作物（箇所）			
1	赤　川	左岸	成田他	3.0＋204～11.2	越水(溢水)	B	8,130		積土のう工等	鶴岡市 三川町	赤川
2	赤　川		おばこ大橋	5.6～50	工作物	B		1		酒田市 三川町	赤川
3	赤　川		両田川橋	7.2+10	工作物	A		1		三川町	赤川
4	赤　川		田田大橋	9.8+40	工作物	A		1		三川町	赤川
5	赤　川	左岸	湯野沢他	11.2～12.6	越水(溢水)	A	1,400		積土のう工等	鶴岡市	赤川
6	赤　川		蛾眉橋	11.8＋180	工作物	A		1		鶴岡市 三川町	赤川
7	赤　川		蛾眉歩道橋	12.0	工作物	A		1		鶴岡市 三川町	赤川
8	赤　川	左岸	文下他	12.6～17.2＋102	越水(溢水)	B	4,420		積土のう工等	鶴岡市	赤川
9	赤　川	左岸	道形他	16.0～17.6	基礎地盤漏水	B	1,600		釜段工 月の輪工	鶴岡市	赤川
10	赤　川	左岸	道形他	16.0～17.0+100	堤体漏水	B	1,100		釜段工 月の輪工	鶴岡市	赤川
11	赤　川		赤川橋梁	16.6+40	工作物	B		1		鶴岡市	赤川
12	赤　川		三川橋	16.8+170	工作物	B		1		鶴岡市	赤川
13	赤　川	左岸	我老林	20.2＋100～20.6	堤体漏水	B	300		釜段工 月の輪工	鶴岡市	赤川
14	赤　川	左岸	我老林	20.4～21.0	越水(溢水)	B	600			鶴岡市	赤川
15	赤　川		黒川橋	23.4＋50	工作物	B		1		鶴岡市	赤川
16	赤　川	右岸	黒森他	3.2＋97～6.4	越水(溢水)	B	3,380		積土のう工等	酒田市 三川町	赤川
17	赤　川	右岸	押切他	6.4～8.4	越水(溢水)	A	2,380		積土のう工等	三川町	赤川
18	赤　川	右岸	対馬	8.0＋100～9.0＋100	基礎地盤漏水	B	1,000		釜段工 月の輪工	三川町	赤川
19	赤　川	右岸	対馬他	8.4～11.0	越水(溢水)	B	2,470		積土のう工等	三川町	赤川
20	赤　川	右岸	横山他	11.0～12.0	越水(溢水)	A	880		積土のう工等	三川町	赤川
21	赤　川	右岸	助川他	12.0～17.2＋75	越水(溢水)	B	5,180		積土のう工等	三川町 鶴岡市	赤川
22	赤　川	右岸	大半田	15.6～16.0	基礎地盤漏水	B	400		釜段工 月の輪工	鶴岡市	赤川
23	赤　川	右岸	地蔵俣他	18.0～18.8＋100	基礎地盤漏水	B	900		釜段工 月の輪工	鶴岡市	赤川
24	赤　川	右岸	松尾他	20.2+109～21.4＋100	基礎地盤漏水	B	1,191		釜段工 月の輪工	鶴岡市	赤川
25	赤　川	右岸	松尾他	20.2＋100～20.4＋150	堤体漏水	B	250		釜段工 月の輪工	鶴岡市	赤川

令和7年度　赤川重要水防箇所（左岸より順次）

図面番号	河川名	岸	重要水防箇所		重　要　度		評　定		対策水防工法名	関連市町村	※担当出張所等
			地先名	距離標位置	種別	ランク	堤防（m）	工作物（箇所）			
26	大山川	左岸	大山川	0.2＋150～2.5	越水(溢水)	B	2,200		積土のう工等	酒田市	赤川
27	大山川	右岸	大山川	0.2～2.5	越水(溢水)	B	2,300		積土のう工等	三川町	赤川
28	内　川	左岸	内川	0.0～2.0	越水(溢水)	B	1,970		積土のう工等	鶴岡市	赤川
29	内　川		内川橋	1.2＋100	工作物	A		1		鶴岡市	赤川
30	内　川		内川橋梁	1.6+50	工作物	A		1		鶴岡市	赤川
31	内　川	右岸	内川	0.0+178～0.2	越水(溢水)	B	110		積土のう工等	鶴岡市	赤川
32	内　川	右岸	内川	0.2～1.0	越水(溢水)	A	820		積土のう工等	鶴岡市	赤川
33	内　川	右岸	内川	1.0～2.0	越水(溢水)	B	970		積土のう工等	鶴岡市	赤川

※担当出張所等：赤川⇒赤川出張所
