記者発表資料

平成２７年　７月１７日
北上川下流河川事務所

がんばろう！東北

夏休み前の『親水施設の一斉点検』結果

７月９日（木）～１５日（水）にかけて実施した32施設の一斉点検結果をお知らせします。

今回の点検は、夏休みを迎えるにあたり、親水施設を安全に利用していただけるか確認するため実施したものです。

その結果、**新たに2施設において不具合が確認**されましたが、**7月中に対応を完了**します。

※　夏休み前の「親水施設の一斉点検」の実施については、７月７日に記者発表を行っています。

■点 検 実 施 日：７月９日（木）～７月１５日（水）

■点 検 施 設 数：３２施設。施設の位置については、別紙１をご参照下さい。

■点　検　結　果：３２施設の点検結果については、別紙２をご参照下さい。

■点検後の措置：

今回新たに不具合が確認された箇所の措置内容は以下のとおりです。

○米谷親水公園内の使用不可遊具のトラロープ撤去。

○中田漕艇施設の、昇降機の電源が入ったままになっていることに対する指導。

詳細は別紙３をご参照下さい。

その他、これまでも安全管理上問題があると判断されていた施設については、引き続き立入規制を実施し、利用者への危険の周知に努めています。

利用者の皆様におかれましは、安全には十分にご配慮の上ご利用いただきますよう、宜しくお願いします。

なお、河川管理施設については、今後、問題箇所の是正（修繕等）を実施し、一日も早く利用出来るように努めます。

北上川下流河川事務所記者発表資料は、ホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【　http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu//　】

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０
電話０２２５－９５－０１９４（代表）
技術副所長　佐藤（さとう）　正明（まさあき）（内線２０５）
管理課長　大平（おおだいら）　知秀（ともひで）（内線３３１）

北上川下流河川事務所管内　親水施設位置図（安全利用点検実施箇所）

■全体箇所数

北上川水系　計23箇所　鳴瀬川水系　計12箇所

合計35箇所

■今回点検を実施する箇所

北上川水系　計20箇所

鳴瀬川水系　計12箇所

合計　32箇所

■震災等により使用を一部規制している箇所

北上川水系　計10箇所

鳴瀬川水系　計2箇所

合計　12箇所

■震災の影響により施設が流出（損壊）した箇所

北上川水系　計3箇所

鳴瀬川水系　計0箇所

合計　3箇所

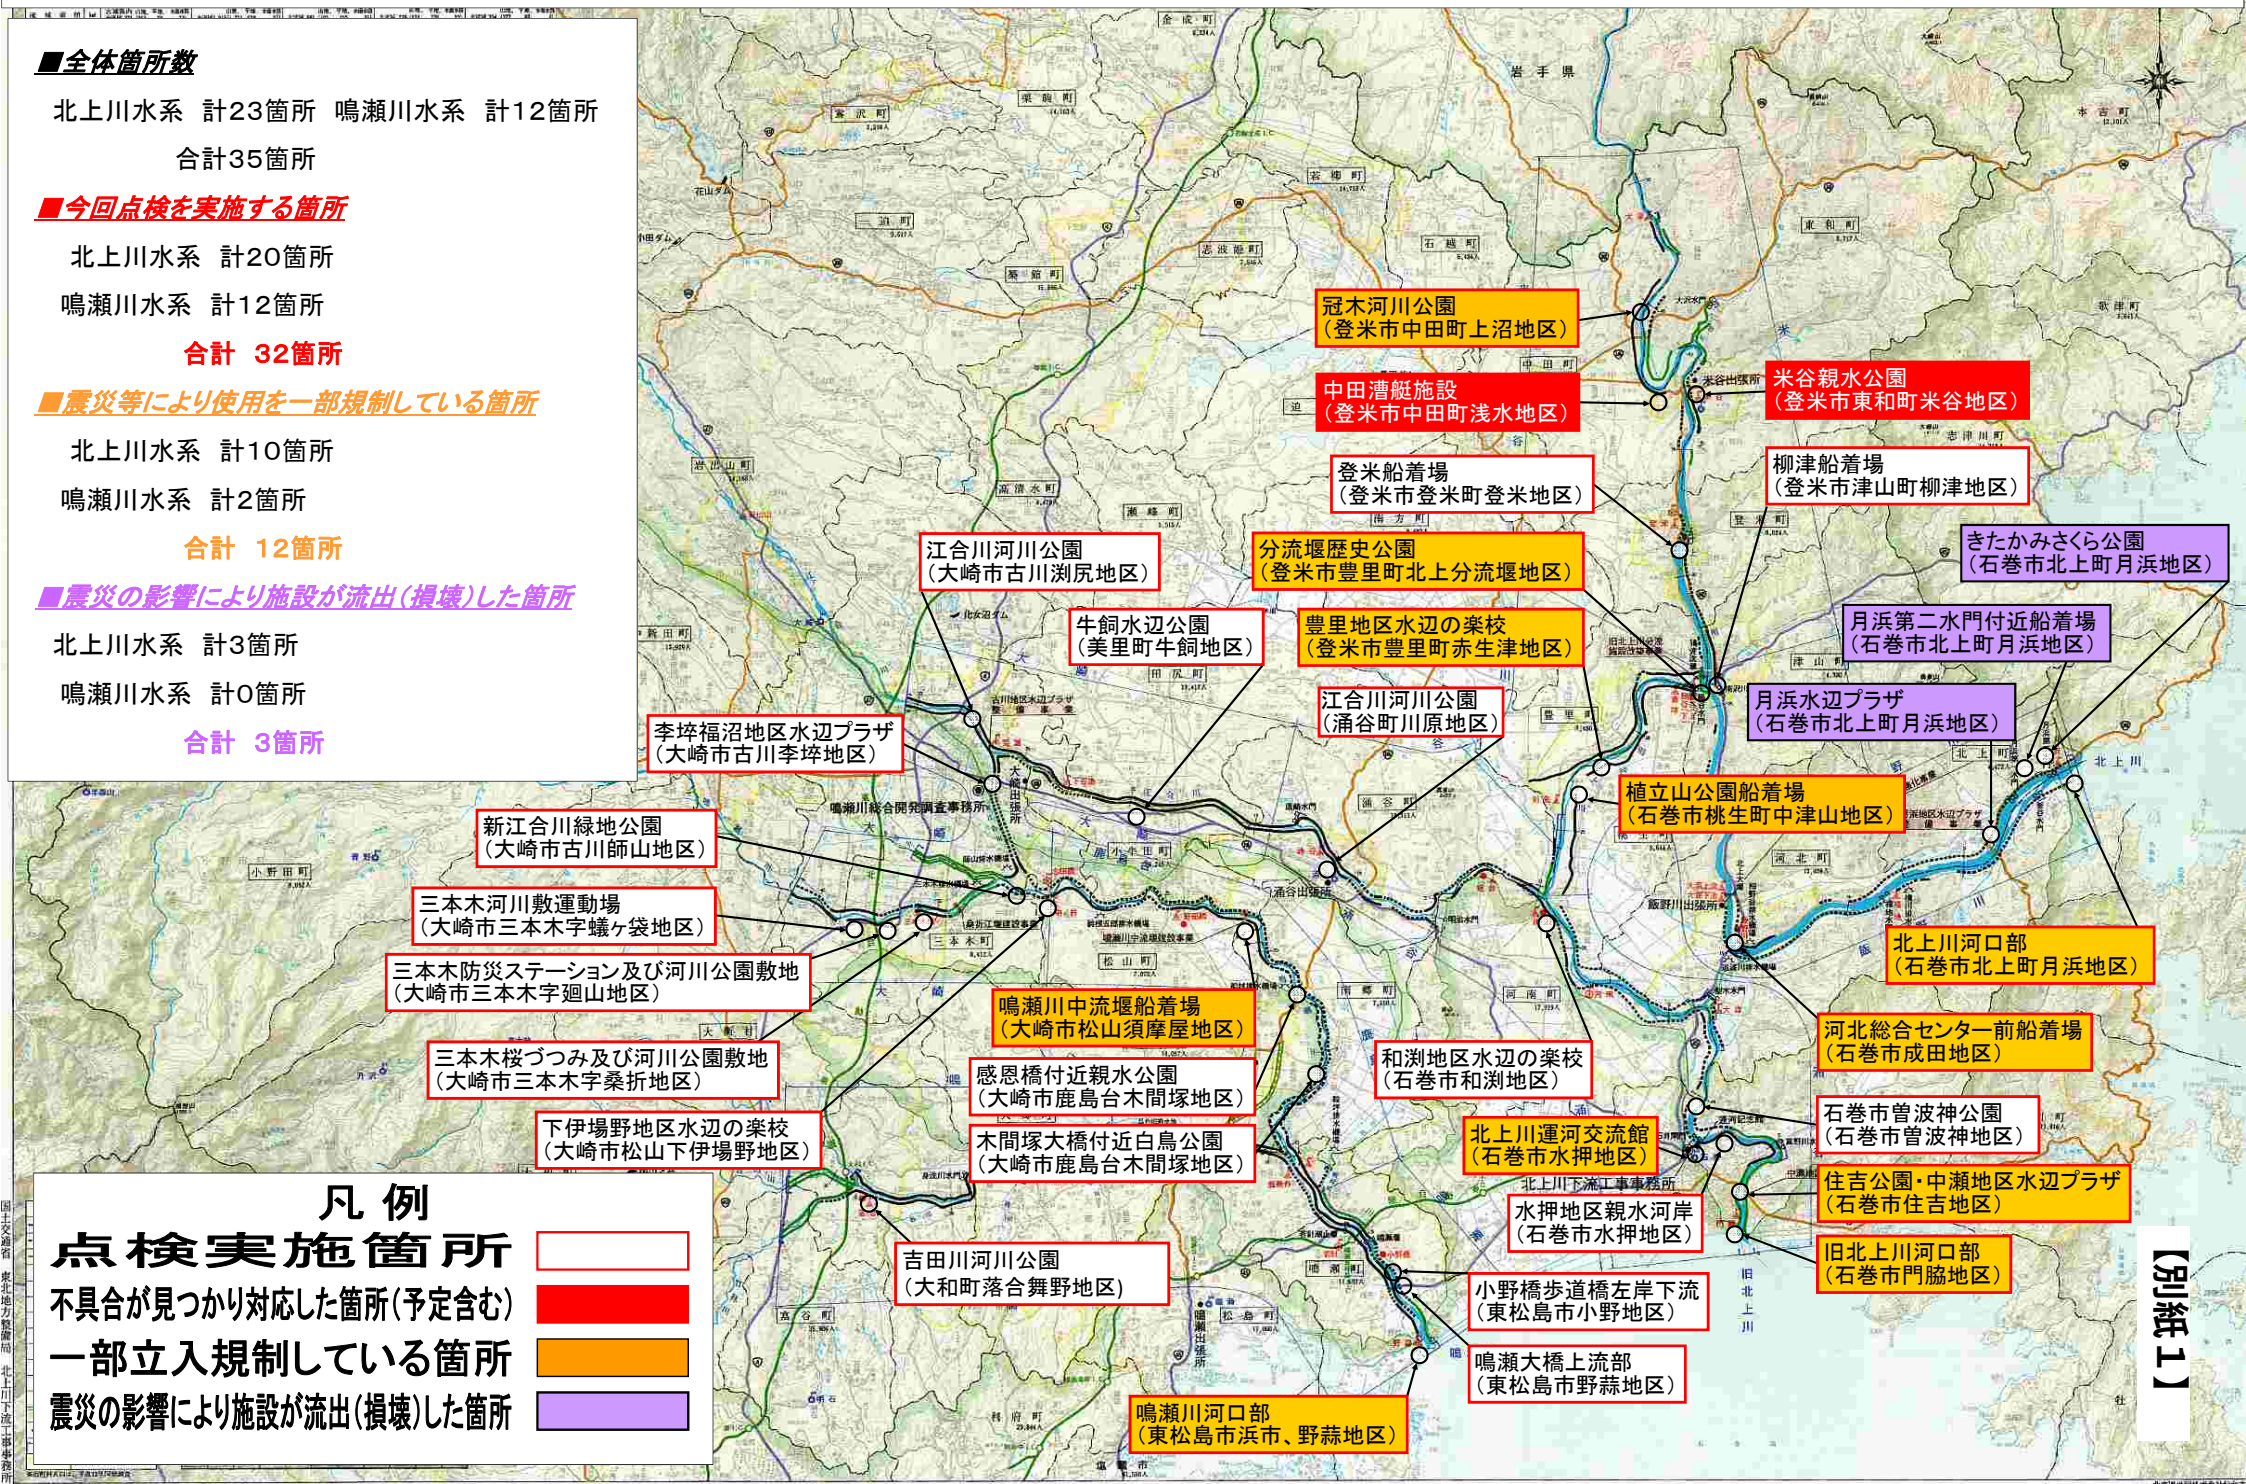

【別紙２】

北上川下流河川事務所管内（北上川・旧北上川・江合川・新江合川・鳴瀬川・吉田川）点検結果一覧表

河川・ダム名	点検日	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	措置（予定）日	規制した箇所	点検者
北上川	7月9日	北上川河口	水面	河口部工事中	工事中	従来より対応済み	○	河川管理者
	7月10日	河北総合センター前船着場	船着場	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	河川管理者・占用者
	7月13日	柳津船着場	水面・船着場・水制工	異常なし	－	－		
		登米船着場	水面・船着場・四阿	異常なし	－	－		
		米谷親水公園	水面・公園全般・船着場	使用不可遊具のトラロープが危険	トラロープ撤去 遊具撤去の検討	7月17日 7月中	○	
		中田漕艇施設	水面・漕艇施設	昇降機の電源が入ったままの状態	電源を切り、施錠済み。	7月13日		
		冠木河川公園	水面・公園全般	急激な深み	立入規制	従来より対応済み	○	
旧北上川	7月10日	旧北上川河口部	水面・導流堤	河口部工事中	工事中	従来より対応済み	○	河川管理者
		住吉公園・中瀬地区水辺プラザ	水面・船着場	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	河川管理者・占用者
		水押地区親水河岸（音の広場）	水面・低水護岸	異常なし	－	－		
		北上川運河交流館	水面・低水護岸・船着場	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	
		石巻市曽波神公園	公園全般	異常なし	－	－		
		和渕地区水辺の楽校	公園全般・低水護岸・船着場	異常なし	―	―		
		植立山公園船着場	船着場	手すり破損	立入規制	従来より対応済み	○	
		豊里地区水辺の楽校	船着場・テラス護岸	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	
		分流堰歴史公園	脇谷閘門・鴇波洗堰・船着場	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	
江合川	7月15日	牛飼水辺公園	公園全般	異常なし	－	－		
		江合川河川公園（大崎）	公園全般	異常なし	－	－		
	7月10日	江合川河川公園（涌谷）	公園全般	異常なし	－	－		
新江合川	7月15日	水辺プラザ（李埣福沼地区）	施設等	異常なし	－	－		
鳴瀬川	7月9日	鳴瀬川河口	水面・低水護岸・特殊堤	河口部工事中	工事中	従来より対応済み	○	
		鳴瀬大橋上流部（河川敷）	河川敷・階段護岸	異常なし	－	－		
		小野橋歩道橋下流部（河川敷）	低水護岸	異常なし	－	－		
	7月15日	木間塚大橋付近白鳥公園	水面・水辺	異常なし	－	－		
		感恩橋付近親水公園	河川敷	異常なし	－	－		
		鳴瀬川中流堰船着場	水面・水辺	吸い出しによる穴	立入規制	従来より対応済み	○	河川管理者
		下伊場野地区水辺の楽校	水面・水辺・河川敷	異常なし	－	－		河川管理者・占用者
		新江合川緑地公園	公園全般	異常なし	－	－		
		防災ステーション及び河川公園敷地	公園全般	異常なし	－	－		
		三本木河川敷運動場	公園全般	異常なし	－	－		
		三本木桜づつみ及び河川公園敷地	公園全般	異常なし	－	－		
吉田川	7月15日	吉田川河川公園（河川敷）	河川敷	異常なし	－	－		

不具合が見つかり対応を完了した箇所（予定を含む）

◎：今回の点検で新たに立入または利用規制した箇所

○：従来より一部立入または利用規制している箇所

『親水施設の一斉点検』 異常個所対応状況

施設名：米谷親水公園

不具合個所：
使用不可のため結ばれているトラロープが、首等をひっかける可能性もあり、危険と思われます。

対応状況：
7月17日にトラロープを撤去しました。
また7月中に占用者（登米市）に遊具の撤去について）検討してもらいます。

施設名：中田漕艇施設

不具合内容：
昇降機の電源が入ったままとなっており、利用者以外の方も操作可能な状態となってました。

対応状況：
7月13日に、電源を切り施錠しております。
占用者（登米市）には、利用者に対し、利用後には確実に電源を切り施錠するよう指導してもらいます。

【別紙3】
