国道349号 山側への別ルート（別線整備） 工事進捗状況

国土交通省
宮城南部復興事務所

令和4年8月末時点

① トンネル坑口付け施工中

② 橋梁下部工（A1,A2）施工中

③トンネル坑口部擁壁施工中

④ 橋梁下部工、道路土工（盛土）施工中

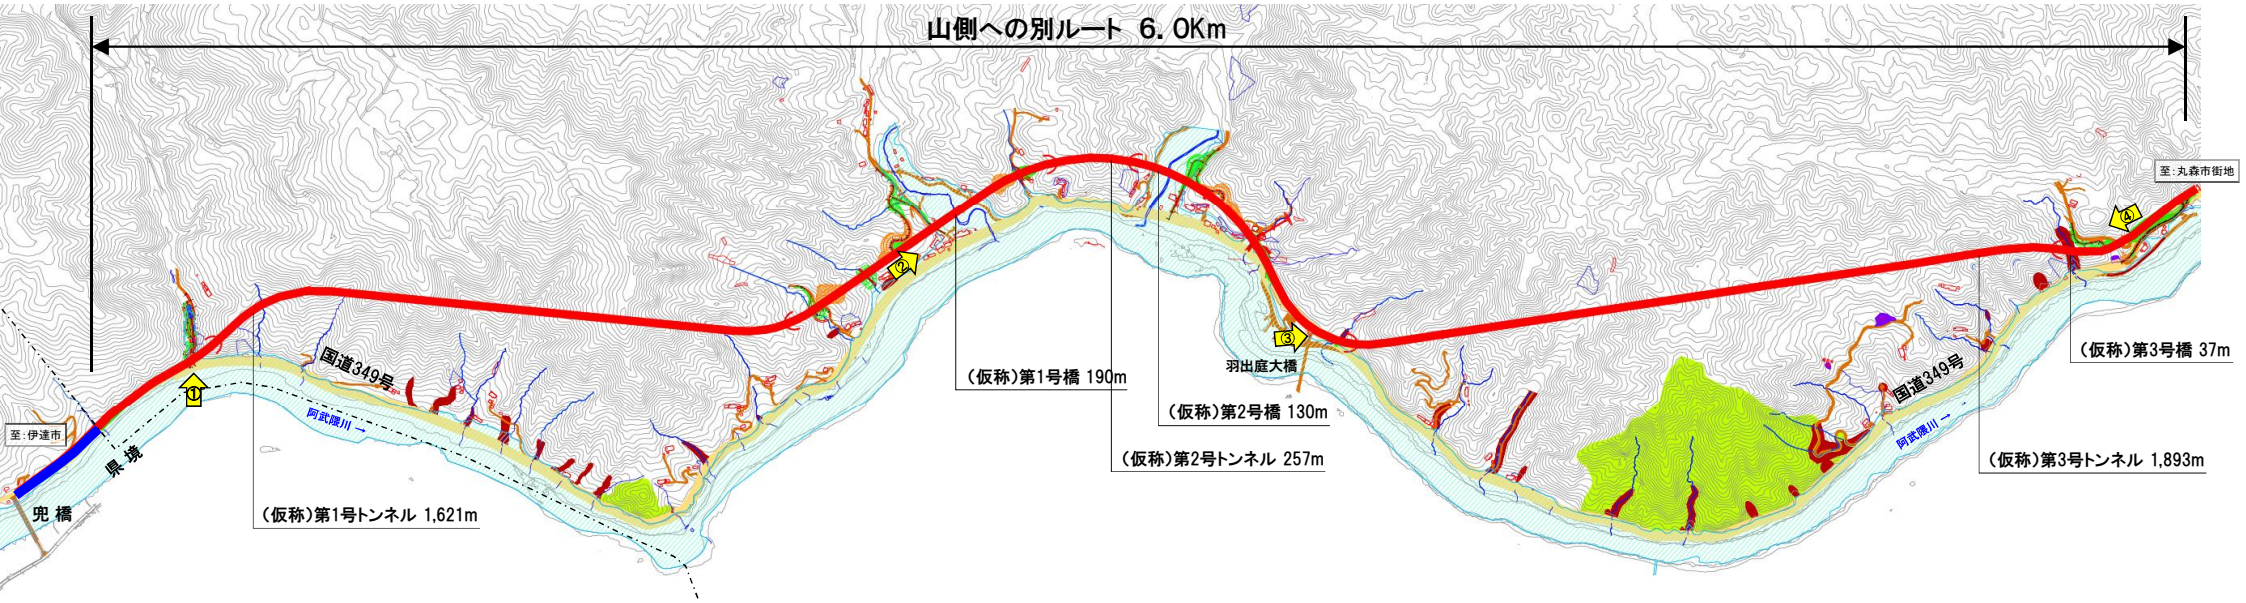

凡 例

- :台風19号浸水範囲
- :台風19号被災箇所
- :県立自然公園（第3種特別地域）

現場状況写真

（福島県施行）兜橋～県境部区間 0.3km

（国交省施行）山側への別ルート 6.0km

（仮称）第１号トンネル　進捗状況

国土交通省
宮城南部復興事務所

令和4年8月末時点

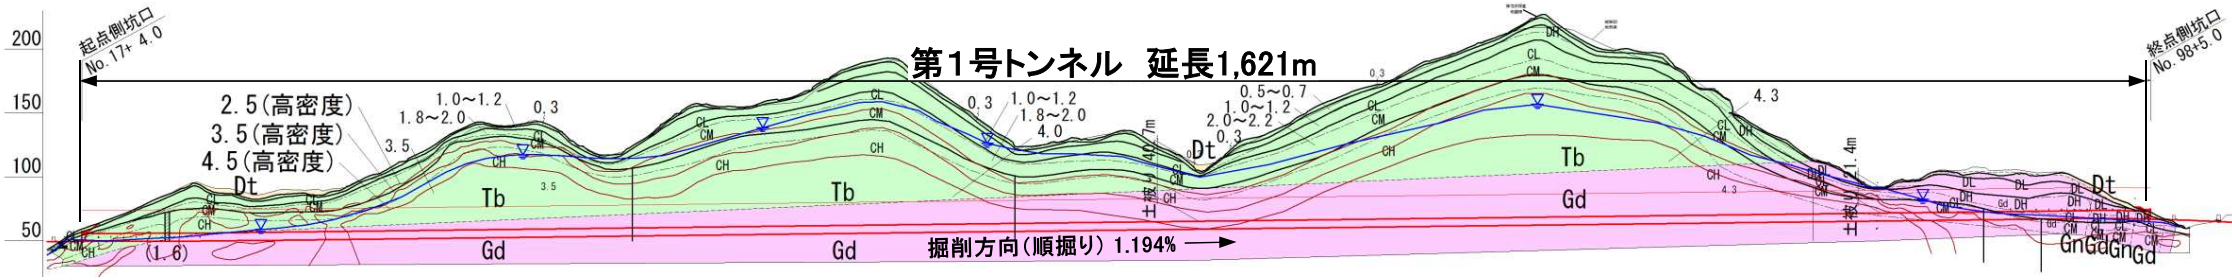

	進捗状況	進捗率
トンネル掘削	3m ／ 1,621m	0%
覆工コンクリート	0m ／ 1,621m	0%

層序表

地質時代	地層名				土性・岩相
	既存資料	丸森町地質図	本調査区分	記号	
第四紀 完新世	現河床堆積物	第四系	現河床堆積物	Rd	礫・砂・粘土
	崖錐堆積物		崖錐堆積物	Dt	礫混じり土砂
	－		沖積層	A	礫(Ag)・砂(As)・粘土(Ac)
第三紀 中新世	霊山層	霊山層	凝灰角礫岩	Tb	凝灰角礫岩 安山岩溶岩(An)
中生代 白亜紀	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	Gd	花崗閃緑岩 片麻岩(Gn) 閃緑岩(Di)

▲ 安全祈願祭開催状況

▲ 起点側坑口付け状況
