工事だより

11月号

院　内　小　沢　橋　下　部　工　工　事

伊藤・佐藤経常建設共同企業体

現場事務所　0183-52-5174

― 工　事　進　捗　状　況 ―

・Ａ２橋台工……埋戻し作業中。
・法覆護岸工……施工完了。
・湯ノ沢改良工…舗装工事完了。11月上旬ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置、区画線施工予定。

※工期延長のお知らせ　H21.10.30　→　H21.11.13

法覆護岸工



湯ノ沢改良工



橋台工（Ａ２橋台）

躯体完成（背面）



躯体完成（前面）



工事だより

10月号

現在、橋台工は躯体が完成し、埋戻しを残すのみとなりました。また9月下旬より夜間作業にて施工していた舗装工（湯ノ沢線）も10月早々、舗設作業を施工し完成いたします。護岸工の積みブロック工も10月中旬を目途に施工完了予定です。

現在の進捗状況　・Ａ１橋台・・・・・・・・完成。
・Ａ２橋台・・・・・・・・10月下旬より埋戻し作業。
・舗装工（湯ノ沢線）・・10/1～10/2（夜間通行止にて舗装工事）
・法覆護岸工・・・・・・・出来高30％

Ａ１橋台　完成



Ａ２橋台
（ｺﾝｸﾘｰﾄ打設状況）



舗装工（湯ノ沢）
舗装版剥取状況



法覆護岸工



《院内小沢橋下部工工事》伊藤・佐藤経常建設共同企業体
平成21年3月14日～平成21年10月30日
現場代理人：佐藤　卓也　　監理技術者：池田　雄太郎
現場事務所：0183-52-5174

工事だより

9月号

工事に着手し、５ヶ月が経過し現在、橋台工（A1橋台）完了、掘削工完了しております。今後の予定は、９月より湯ノ沢線の舗装工事（夜間）、A2橋台施工開始となっており、近隣の皆様には大変ご不便、ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をお願い致します。お手数ですが何かお気づきの点がありましたら下記の連絡先までご一報下さい。

※工期延長のお知らせ　→　当初（H21.3.14～H21.9.30）
変更（H21.3.14～H21.10.30）

橋台工


A1橋台（完了）



橋台工

A2橋台（掘削状況）



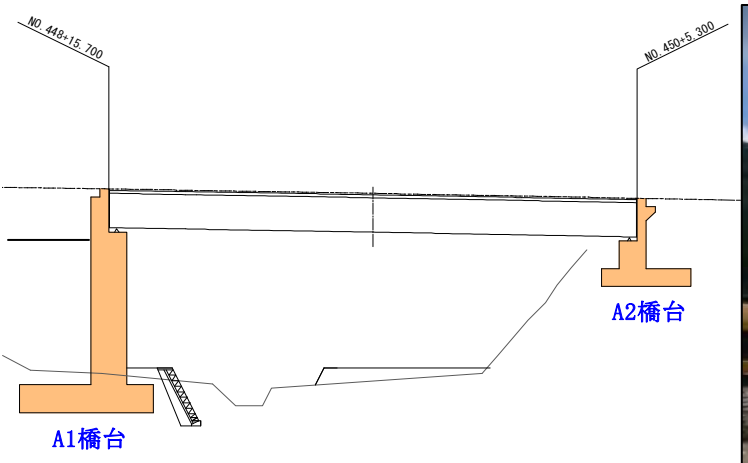

進入路工

A2進入路工（掘削状況）



《院内小沢橋下部工工事》伊藤・佐藤経常建設共同企業体
平成21年3月14日～平成21年10月30日（1ヶ月延長）
現場代理人：佐藤　　卓也
監理技術者：池田　雄太郎
現場事務所：0183-52-5174



工事だより 8月

工事に着手し、4ヶ月が経過し現在、橋台工（A1橋台）80%完了、掘削工70%完了しております。お盆を目途にA1橋台完成、A2橋台施工開始予定となっており、近隣の皆様には大変ご不便、ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をお願い致します。お手数ですが何かお気づきの点がありましたら下記の連絡先までご一報下さい。

お盆休暇のお知らせ→8/13～8/16（4日間）作業休止。

橋台工（A1橋台）

コンクリート打設状況（竪壁・翼壁）



道路土工


A2進入路工（掘削状況）



道路土工

A2進入路工（掘削状況）



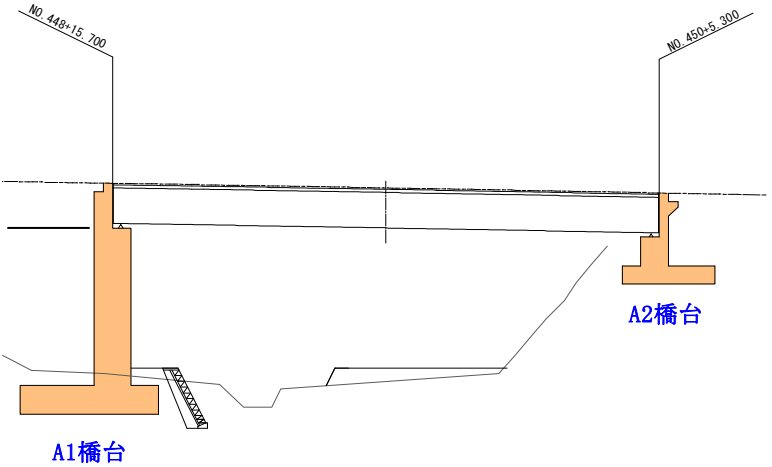



《院内小沢橋下部工工事》伊藤・佐藤経常建設共同企業体
平成21年3月14日～平成21年9月30日
現場代理人：佐藤　　卓也
監理技術者：池田　雄太郎
現場事務所：0183-52-5174

工事だより

7月号

工事名：院内小沢橋下部工工事　　工期：平成21年3月14日～平成21年9月30日

このたび、私達「伊藤・佐藤JV」は**「国土交通省　東北地方整備局　湯沢河川国道事務所」**発注の【院内小沢橋下部工工事】を施工する事となり、工事に着手して３ヶ月が経過しました。
この工事は、院内道路の中間部に位置しており、橋台工（A1橋台・A2橋台）を施工しています。
今現在、A1橋台の均しコンクリートを打設完了し、A1橋台施工の為の足場組立中です。
また、A2橋台施工のため岩掘削（V≒14,000㎥）を施工しており、現在50%完了しております。
安全面、環境対策に重点を置き工事を施工して参りますが何かお気づきの点がありましたら
下記の連絡先までご一報下されば**早急に対処致します**のでよろしくお願いします。

施工状況写真

6月末現在

A1橋台（足場組立状況）





防　音　対　策

小割ヤード
（防音ネット設置）



掘削状況

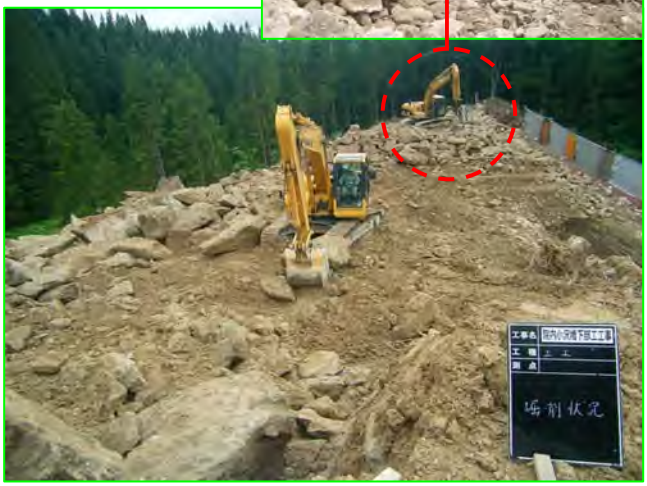

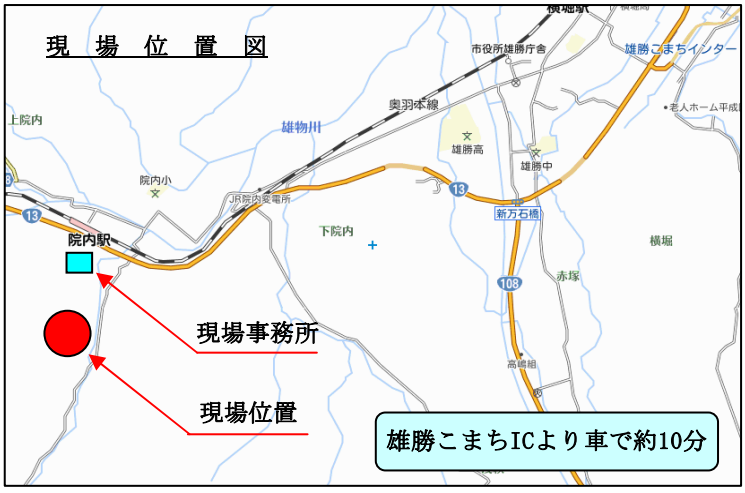



現場代理人の佐藤です。災害0で工事完成を目指し、環境対策等に力を入れ工事を進めて行きたいと思いますのでご協力のほどお願いします。



監理技術者の池田です。地域住民の皆様と円満に工事を進めていくことを第一に考えておりますのでご協力お願いします。

《院内小沢橋下部工工事》　伊藤・佐藤経常建設共同企業体
現場事務所　TEL0183-52-5174
現場代理人：佐藤　卓也　　監理技術者：池田　雄太郎
