第　１　号
令和２年６月２６日

吉田川治水だより

～ 吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」 ～

『吉田川治水だより』は、国土交通省が実施している事業の内容や進捗状況等について、地域の皆様へお知らせするお便りです。今後、月１回程度の発行を予定しています。

国土交通省 北上川下流河川事務所

吉田川　令和元年台風19号関連の事業概要

令和元年10月の台風19号により、鳴瀬川水系吉田川においては、堤防の決壊、越水により多くの家屋や事業所等で浸水等、甚大な被害が発生しました。

この災害に対して、関係機関が連携しとりまとめた**吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」**を踏まえ、国・県・市町村が連携し、堤防復旧、堤防整備、河道掘削等の治水対策を概ね5年で実施します。

吉田川の事業全体図

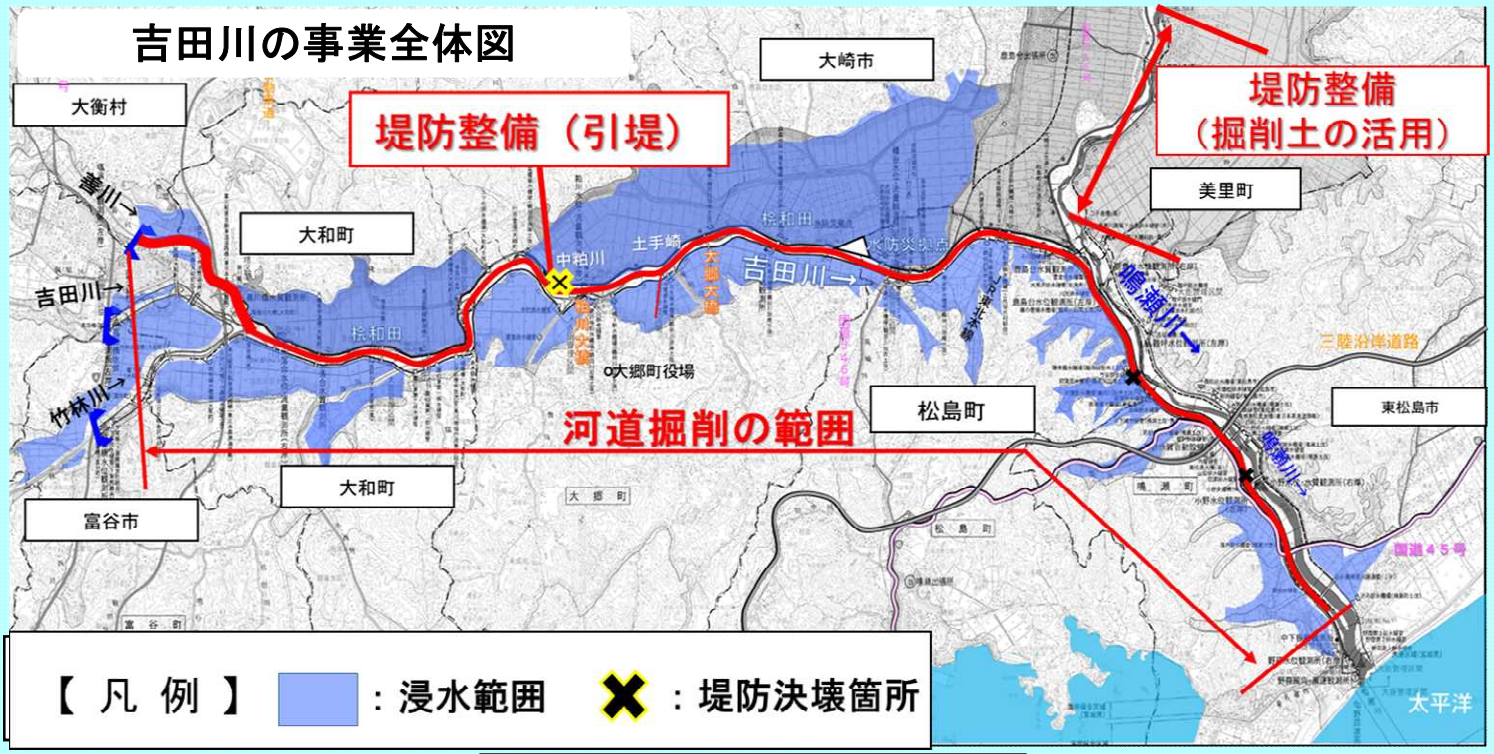

河道掘削の効果

川の中の土砂を撤去し、水が流れる面積を大きくすることで、水が流れやすくなり**洪水時の水位を下げること**ができます。

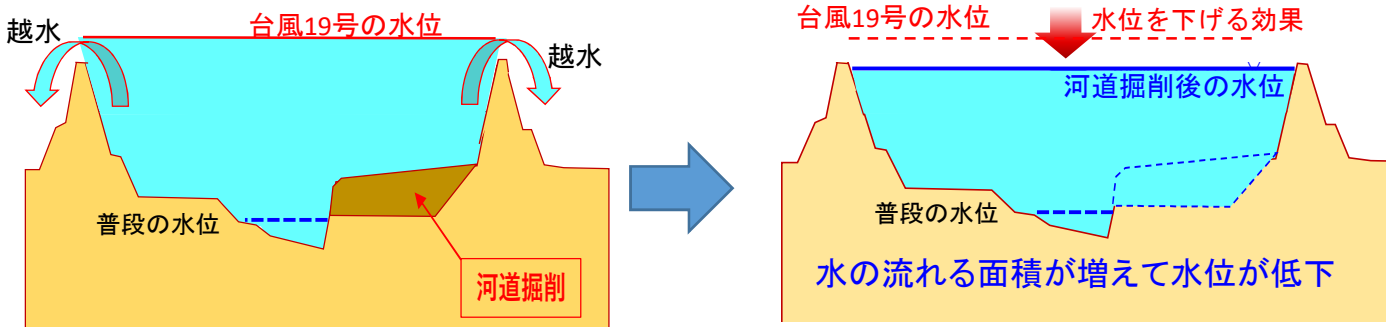

堤防補修工事の進捗状況

本格的な洪水シーズンに備えて、堤防の高さが部分的に低い箇所の嵩上げ工事(第１段階)を実施しています。また、堤防の幅が狭い場所については、川裏側の法面に盛土を行い、堤防を厚くする工事(第２段階)も行います。工事実施中の区間は通行止めとなります。ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

尚、これらの堤防補修工事は、昨年の台風１９号で越水が発生した場所を優先しながら、堤防が低くなっている箇所について順次実施していきます。

堤 防 補 修 工 程 表

	５月			６月			７月			８月			９月		
	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21
桧和田地区	盛土５月末完了			舗装工	植生工	完了									
土 橋 地 区	盛土５月末完了			舗装工	植生工	完了									
土手崎地区			既設舗装版・路盤撤去、盛土…実施中					植生工	敷砂利			※第2段階の工事は11月から実施予定			
大郷大橋下流			既設舗装版・路盤撤去、盛土…実施中					敷砂利 植生工				※第2段階の工事は11月から実施予定			

堤防かさ上げ断面イメージ

第１段階
- かさ上げ盛土
- 敷砂利
- 植生工

第2段階〈11月～〉
- 腹付盛土
- 敷砂利・舗装工
- 植生工

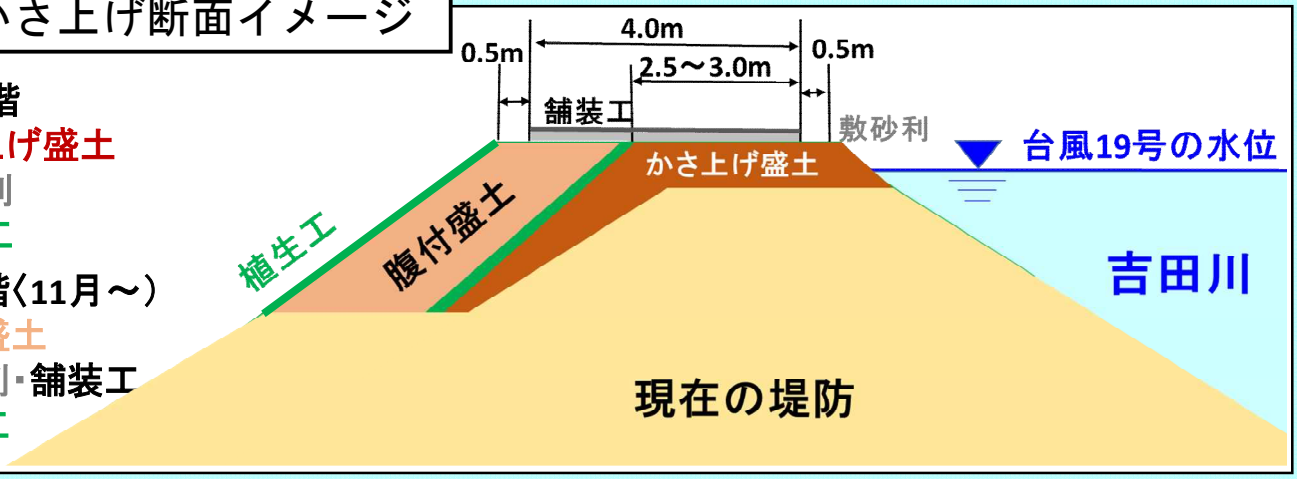

〈本工事に関するお問い合わせ先〉

（大郷大橋下流）　北上川下流河川事務所　鹿島台出張所　TEL:0229-56-2617

（その他の地区）　北上川下流河川事務所　鳴瀬出張所　TEL:022-354-3101

中粕川地区　引堤計画について

大郷町中粕川地区の新たな堤防の整備について、大郷町の復興まちづくり計画と連携し、住民の皆様にご協力いただきながら、早期完成に向けて取り組んでおります。現在、⑤住民説明会での設計の説明⑥用地の幅杭設置、⑦用地調査を行っている段階です。引き続きご協力ほどよろしくお願いします。

堤防完成までのステップ

1 堤防の計画（河川整備計画）

洪水の状況を調査し、地域に必要な堤防について計画します。

2 計画の説明（土地立入了解）

計画が決まると、現地調査のために関係者へ説明を行い、現地調査の協力を求めます。

3 測量・地盤調査

堤防を作るために必要な資料の収集・調査・図面の作成を行います。

住民説明会実施（4/17, 19）

4 堤防の設計

測量図面や収集した資料を基に堤防の設計を行います。

5 設計の説明

関係する方に堤防の設計（規模・範囲）について説明を行い、設計や用地測量・調査の協力を求めます。

6 用地巾杭設置　実施中

設計に基づき堤防工事に必要な用地の範囲を示す杭を打設します。

7 用地の調査　実施中

堤防工事に必要な土地、建物の調査を行い、地権者立ち会いのもと、用地境界等の確認を行います。

8 用地価格の説明（契約・支払い）

用地調査結果をもとに地権者と価格等について説明を行い、契約合意を得た後、補償金の支払いを行います。

9 工事の説明

工事方法、期間などの説明を行います。

10 工事

設計に基づき堤防を作ります。

予定：令和3年度～

11 堤防の完成

計画から工事まで色々な方の協力によって堤防ができあがります。

予定：令和5年度末頃



※イラスト：秋田河川国道事務所提供

用地調査の進捗状況

国土交通省北上川下流河川事務所では、吉田川左岸粕川地区において、台風19号で被災した堤防復旧工事の実施に向けて、中粕川地区において用地調査を実施しております。現在は、6月22日の境界立会に向けて境界測量等の作業を行っています。

また、糟川寺の墓地に関しては、お墓の使用者調査が概ね完了し、現在は、使用者様の立会いのうえ現地調査を行っております。（遠方にお住まいの方にはお手紙にて調査をお願いしております。）引き続き、現地立会・調査を行ってまいりますので、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

※ 用地調査の作業者は、国土交通省発行の身分証明書を携帯しています。

地元の皆様のご理解を頂きながら事業を進めて参ります。何かお気付きの点などがありましたら、下記までご連絡を宜しくお願いします。

【お問い合わせ先】　北上川下流河川事務所

○ 用地調査に関すること
用地第二課　TEL：０２２５－９５－６５０２

○ 事業に関すること
事業対策課　TEL：０２２５－９４－９７９３

堤防決壊箇所（中粕川）の工事の概要と進捗

本格的な洪水シーズンに備えて、昨年の台風19号で決壊した中粕川地区で工事を行っております。
右岸側の川の中の堆積土砂を掘削するとともに、仮締切を堤防側に新設し、現在の仮締切を撤去することで、水が流れる面積を拡大し、川の流れを良くし水位を下げます。この工事により、新たな本堤防（引堤）が完成するまでのおよそ5年間、周辺の堤防と同程度の安全性を確保します。

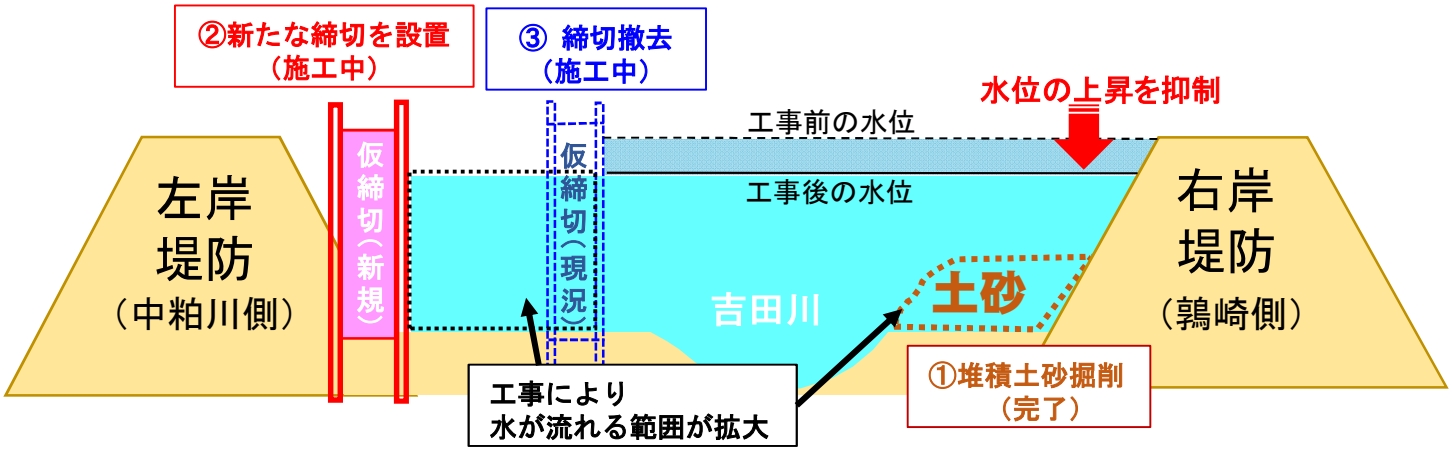

工事の予定	4月			5月			6月			7月			8月		
	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21
①土砂掘削							完了								
②締切設置															
③締切撤去															

＜本工事のお問い合わせ先＞
北上川下流河川事務所
吉田川緊急治水対策出張所
TEL：０２２９−５６−３９５６

防災お役立ち情報　～川の水位情報～

スマートフォンで、簡単に川の情報が入手できます。

国、都道府県の河川水位情報を一元的に提供。河川カメラも表示。
右の二次元コード読取、またはWeb検索からアクセスできます。

梅雨の大雨に備えご活用ください。　川の水位情報　検索

https://k.river.go.jp/

① 危機管理型水位計に加え、通常水位計や河川カメラが同一画面に表示されます。

② リアルタイムの河川水位に対応して表示の色が変化し、危険度がわかります。

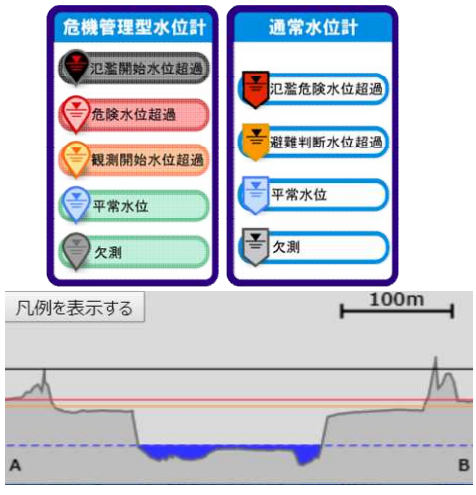

③ 河川カメラのアイコンを選択することで河川の状況が簡単にみられます。

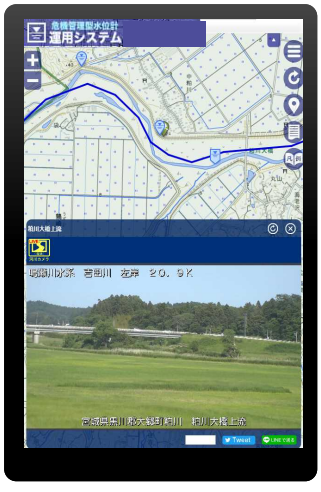

《吉田川治水だよりに関するお問い合わせ》
国土交通省東北地方整備局　北上川下流河川事務所　事業対策課　TEL：０２２５−９４−９７９３
