
速報版

【概要版】
令和7年8月19日からの大雨による
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所における対応の概要
《　第3報　9月1日　17時時点　》

東北地方整備局
湯沢河川国道事務所
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所


※数値は速報値ですので、今後の精査等により変更となる場合があります。

令和7年8月19日からの大雨　状況図

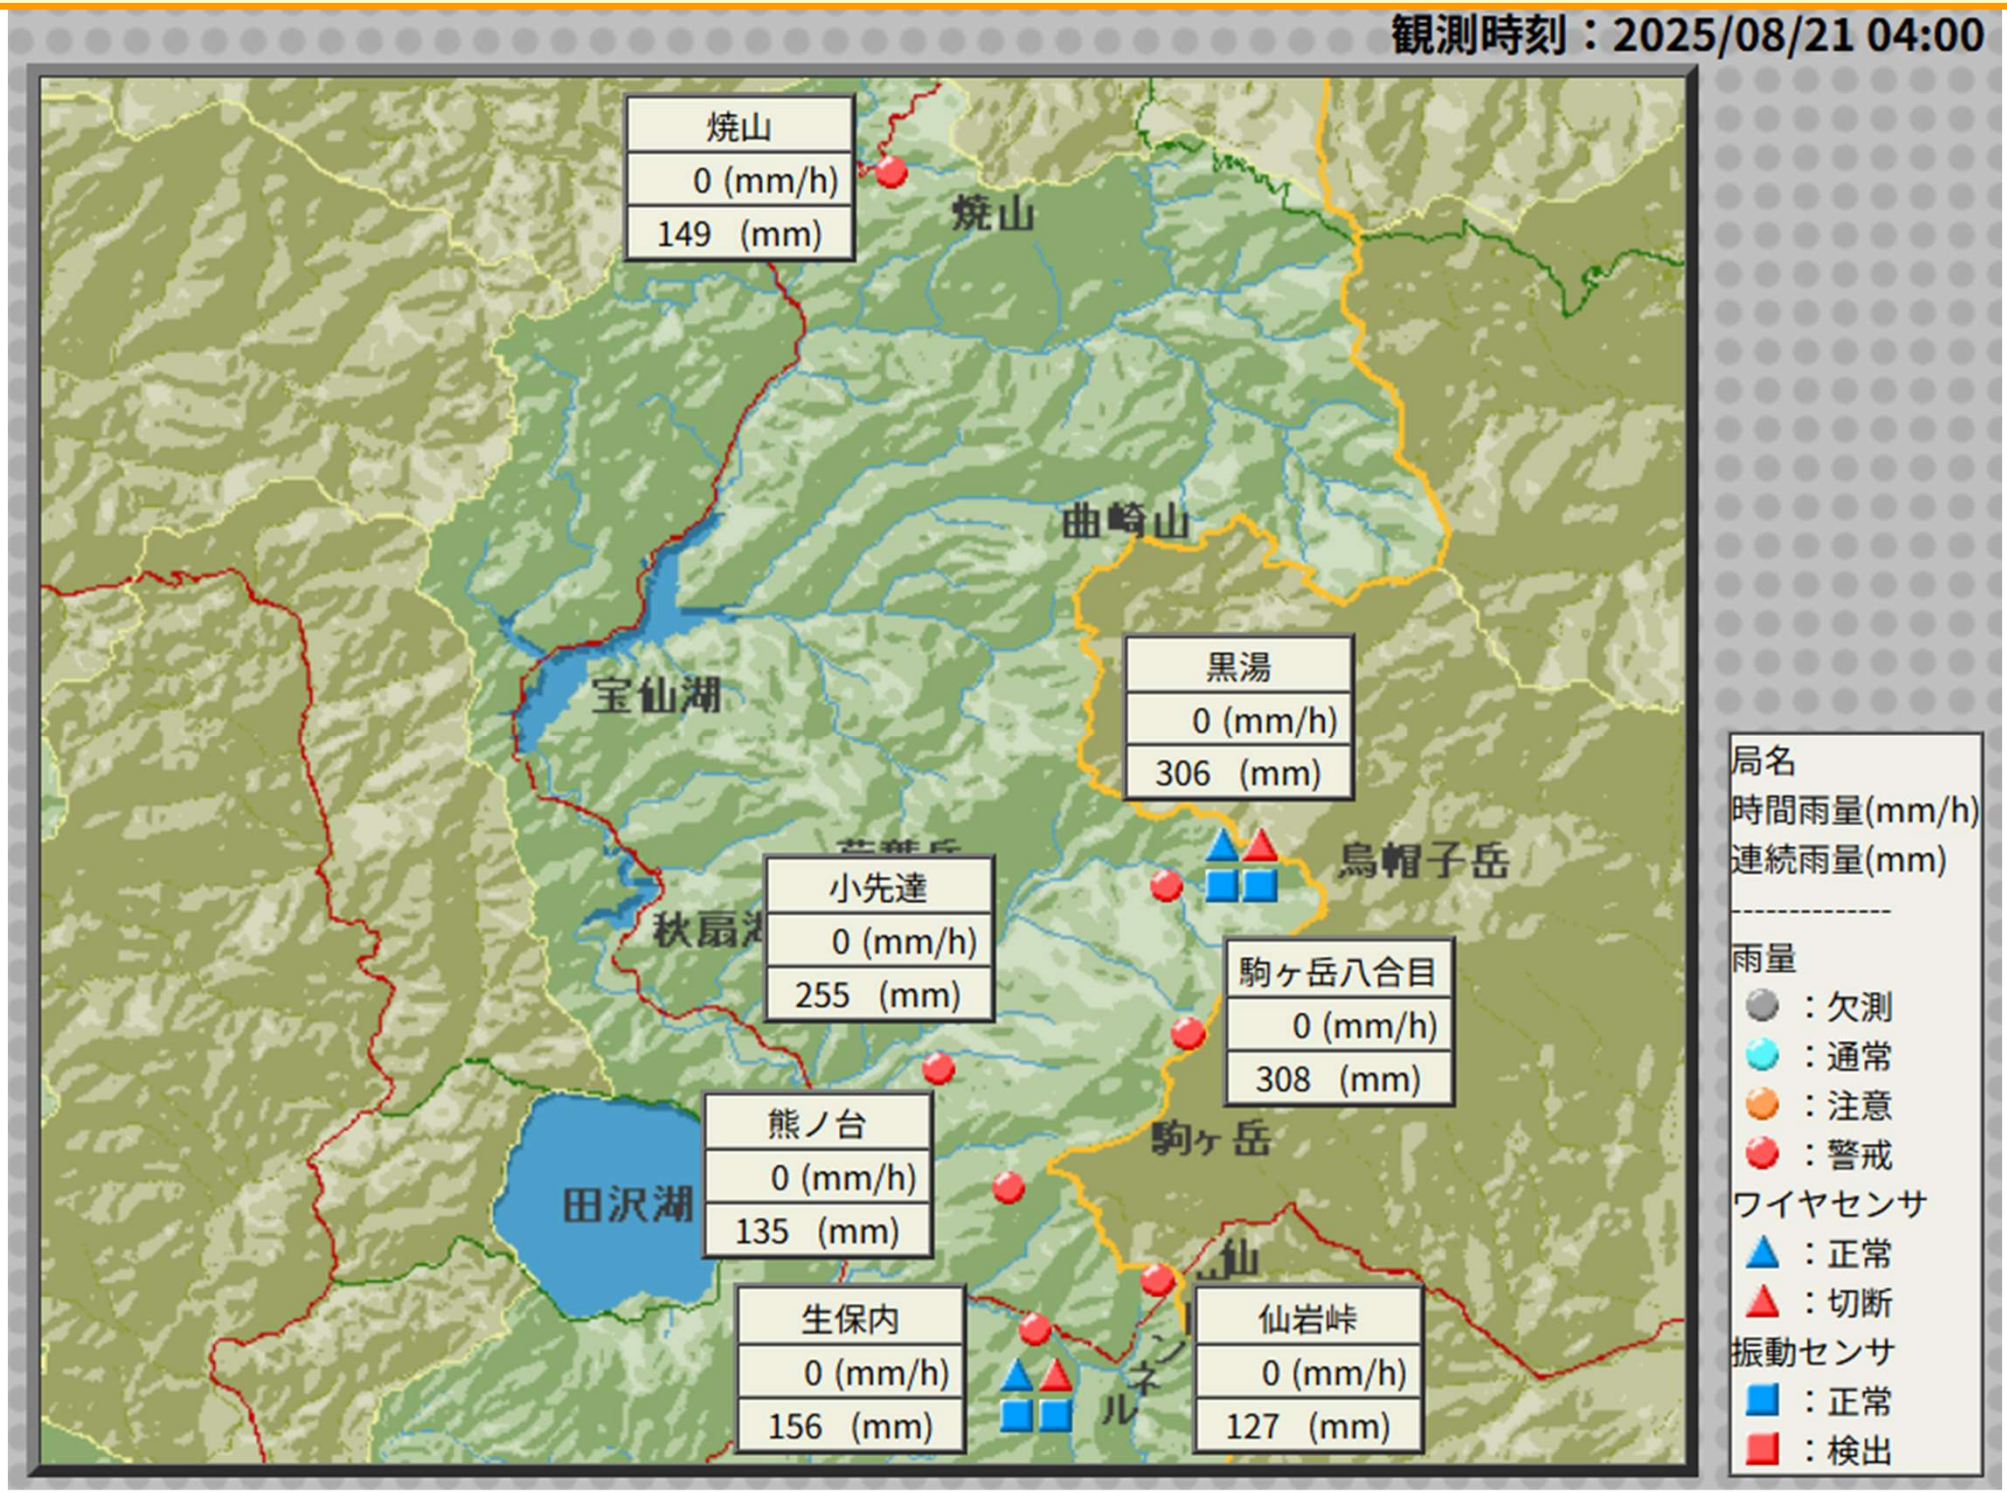


令和7年8月19日からの大雨　降雨グラフ

連続雨量**308**mm

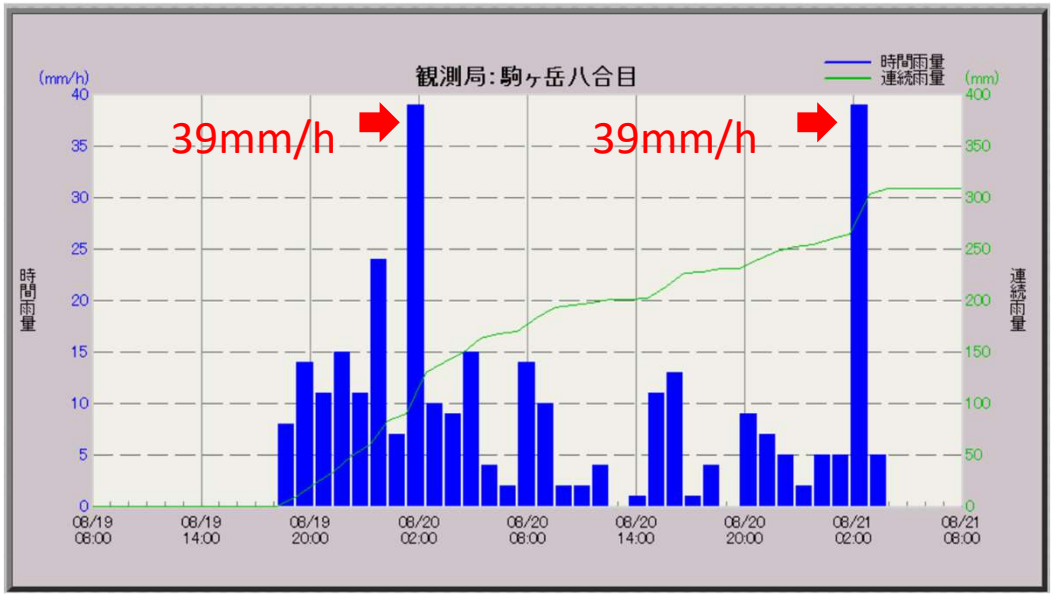


駒ヶ岳八合目観測所

連続雨量**306**mm

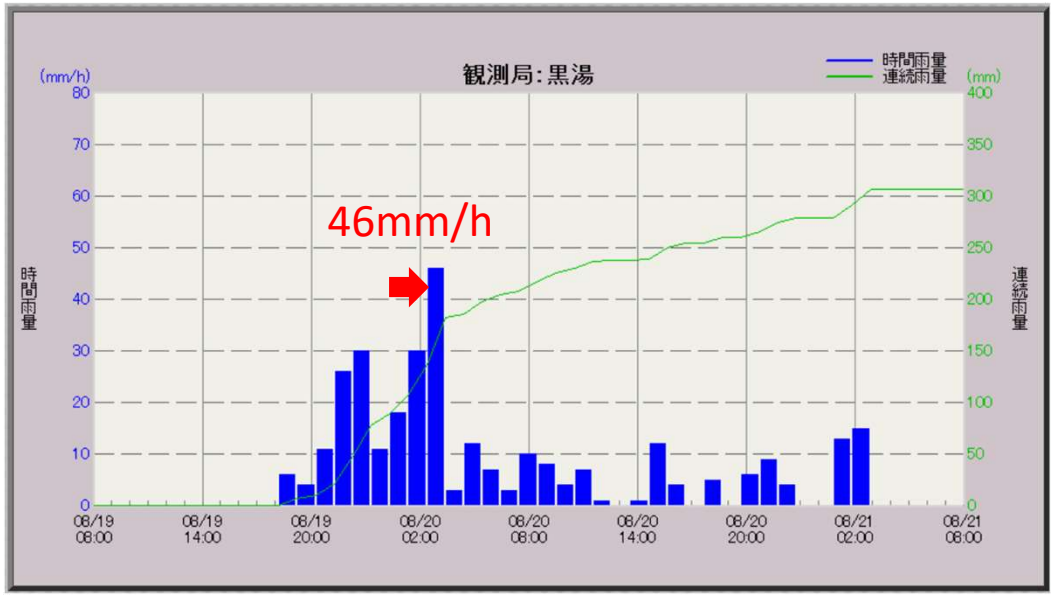


黒湯観測所

連続雨量**255**mm

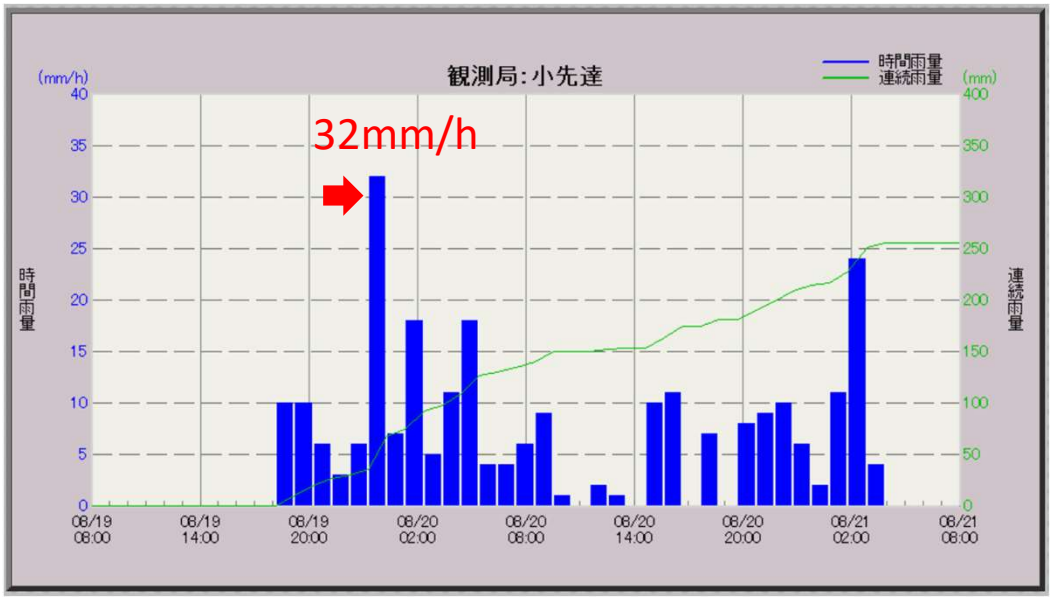

小先達観測所

連続雨量**156**mm

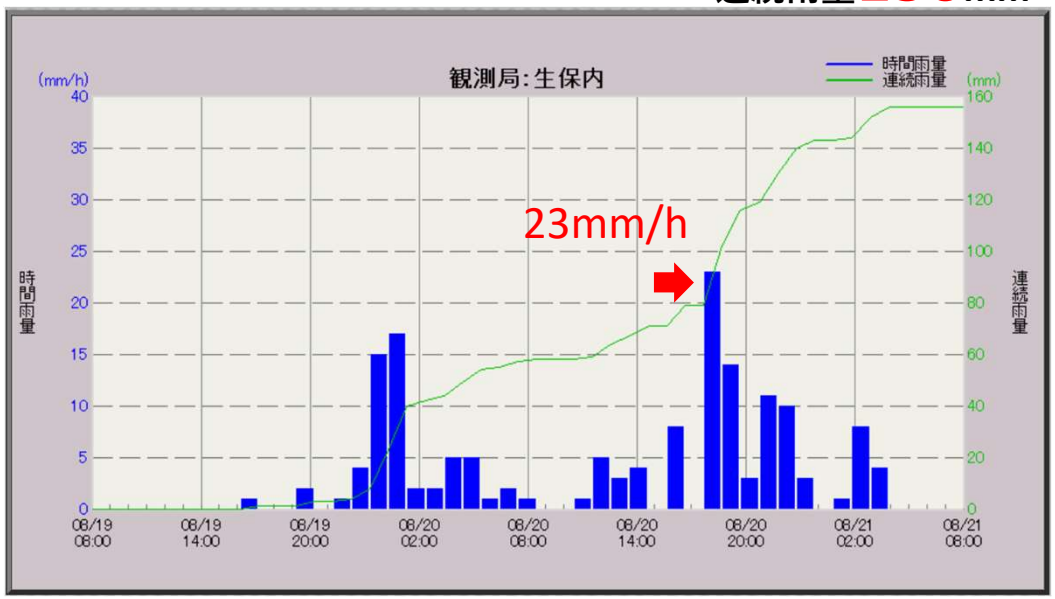

生保内観測所

令和7年8月19日からの大雨　CCTV画像

大雨前の状況

R7.8.19 14時



大雨後の状況

R7.8.20 9時



R7.8.19 14時



R7.8.20 5時



出張所職員による速やかなパトロール等による現地状況把握(概略調査)



出張所管内パトロール①



UAVによる渓流周辺点検状況（先達川）




出張所管内パトロール②



工事現場点検

出張所職員による速やかなパトロール等による現地状況把握(概略調査)

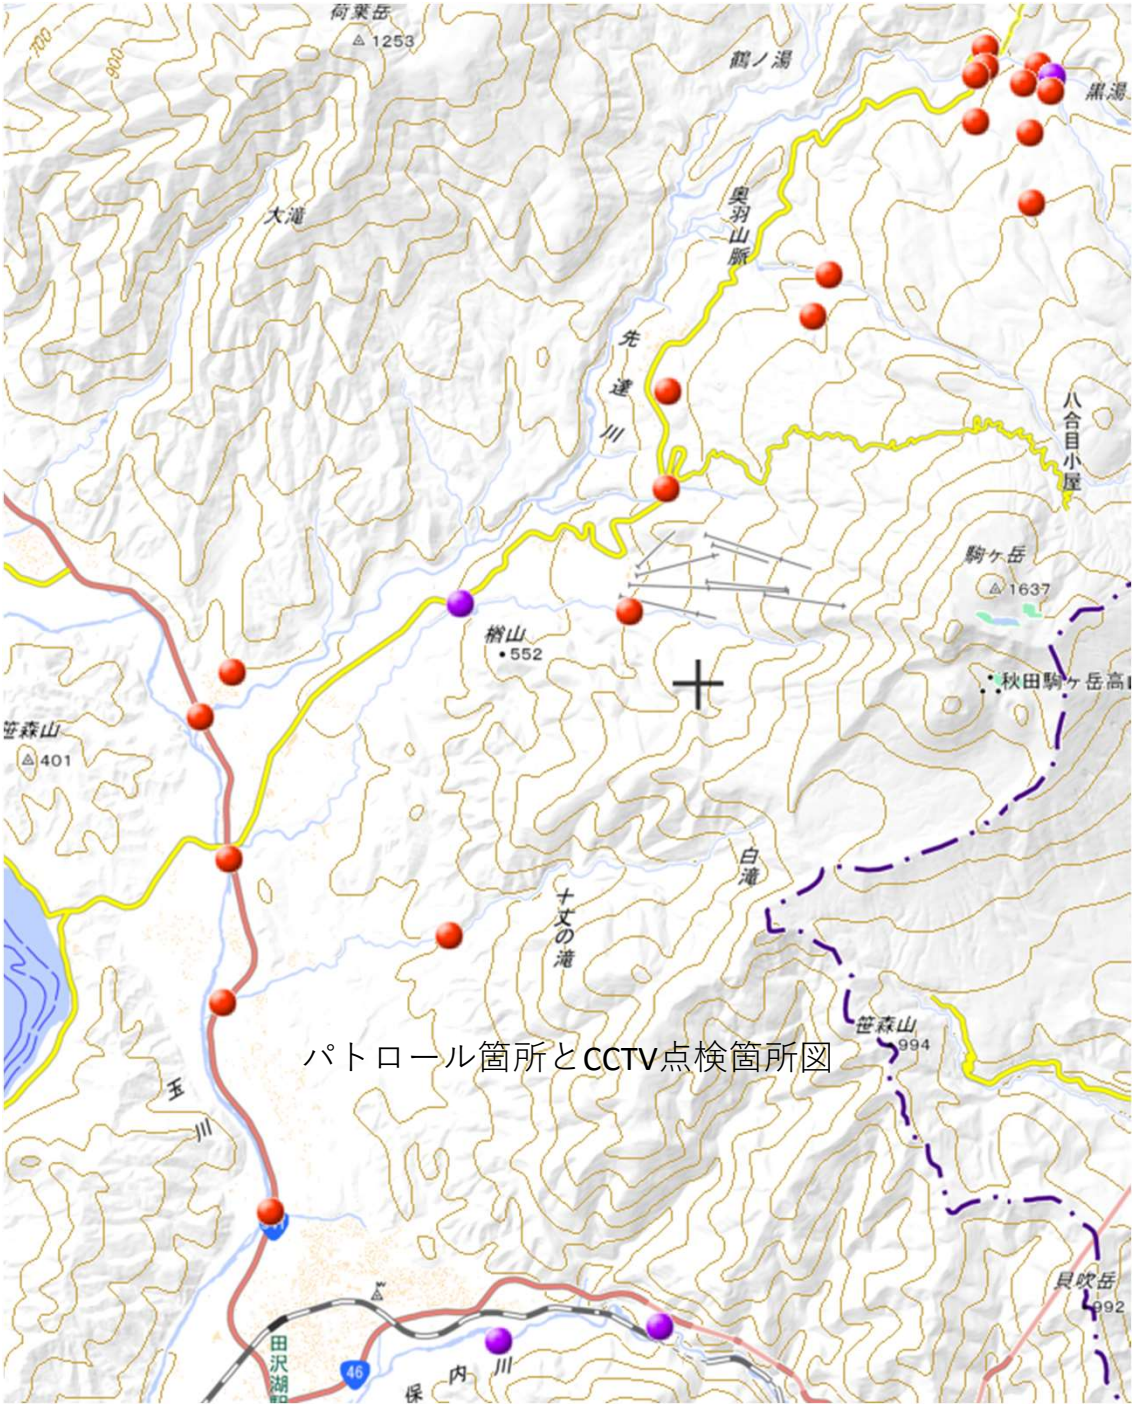


パトロール箇所とCCTV点検箇所図

パトロール箇所とCCTV点検箇所図

砂防堰堤CCTVによる確認状況様式

※CCTVによる施設の確認は、点検対象事象になった際に速やかに行う。
※施設に異常が確認された場合等は、流域治水課と調整のうえ、確認間隔等を決定するものとする。

ID	流域	名称	令和 7年 8月 21日 6時 00分 確認							備考 ※異常の状況等
			①臨時点検の対象	②カメラの状況	③堰堤	④堰堤上流河道	⑤堰堤下流河道	⑥堰堤右岸斜面	⑦堰堤左岸斜面	
1	先達川	黒湯(先達川第5砂防堰堤)	○	○	○	－	－	○	○	異状なし
2	先達川	小先達(小先達川第1砂防堰堤)	○	○	○	○	－	－	○	異状なし
3	生保内川	生保内(生保内川第2砂防堰堤)	○	○	○	○	○	－	○	異状なし
4	生保内川	生保内川遊砂地(大暗渠砂防堰堤)	○	○	○	○	○	○	－	異状なし
5	火山	熊の台	×	○	－	－	－	－	－	濃霧のため確認不可
6	火山	駒ケ岳八合目	×	○	－	－	－	－	－	濃霧のため確認不可
7	火山	焼山	×	○	－	－	－	－	－	異状なし
8	火山	仙岩峠	×	○	－	－	－	－	－	濃霧のため確認不可

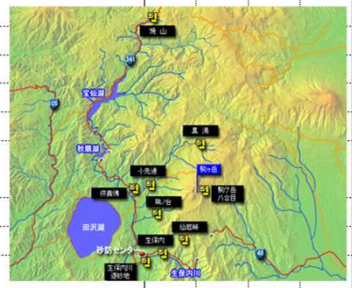

砂防施設CCTV点検記録票



砂防施設CCTV点検状況

現地パトロールで得られた情報は関係機関等へ共有



先達川沿いの登山道における斜面崩壊



石黒沢沿いの林道洗掘



市道黒湯線・蟹沢合流部の土砂流出状況



蟹沢の状況

契約工事における迅速な状況把握～降雨中の監視・降雨後の現地点検～



工事現場点検状況①



工事現場点検状況②



工事現場点検状況③



工事現場点検状況④

地域の建設業等による迅速な対応



砂防施設臨時点検状況①



砂防施設臨時点検状況②



既設林道補修作業状況



水質調査作業状況

砂防事業の効果①


- 先達川上流部では、平成2年7月18日～19日の大雨により先達川で土石流が発生し、下流にある「孫六温泉」の二階建て事務所兼客室が半壊し、浴室が土砂に埋没した被災事例あり
- 令和7年8月19日～20日の大雨では砂防施設が効果を発揮し、土砂災害は発生しなかった










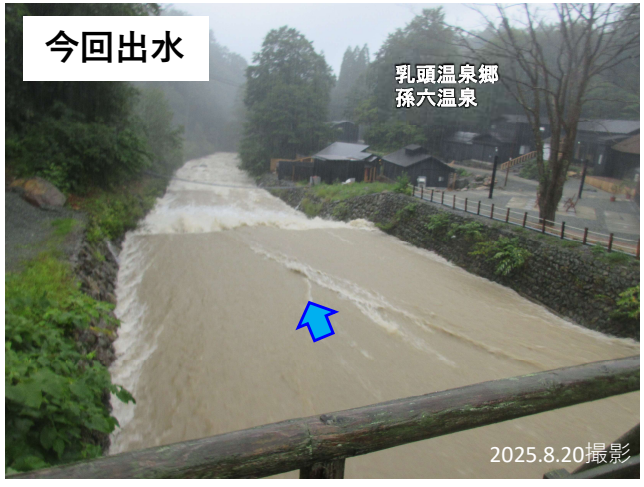

砂防事業の効果②


- 過去に先達川において土砂災害をもたらした平成2年7月出水と令和7年8月出水の雨量を比較
- これら２つの出水は、概ね同等の雨量規模であるが、先達川に整備された砂防施設により土砂災害は発生せず、被害解消が図られた


令和7年8月19日出水の雨量

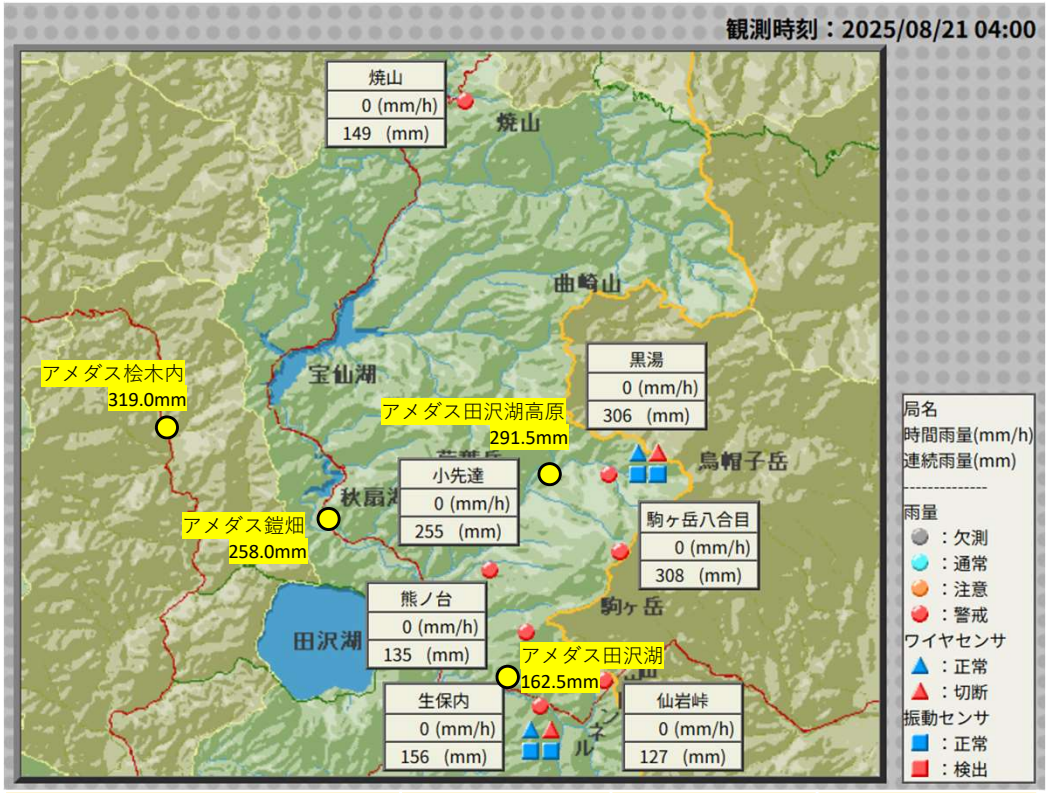

観測所	連続雨量	最大時間雨量	備考
アメダス桧木内	319.0mm	44.5mm	8/19-8/21
アメダス田沢湖	162.5mm	26.0mm	8/19-8/21
アメダス鎧畑	258.0mm	37.0mm	8/19-8/21
アメダス田沢湖高原	291.5mm	38.0mm	8/19-8/21

令和7年8月出水では、先達川上流部・駒ヶ岳周辺で桧木内地点(319mm)と概ね同等の雨量を記録（黒湯306mm/八合目308mm）

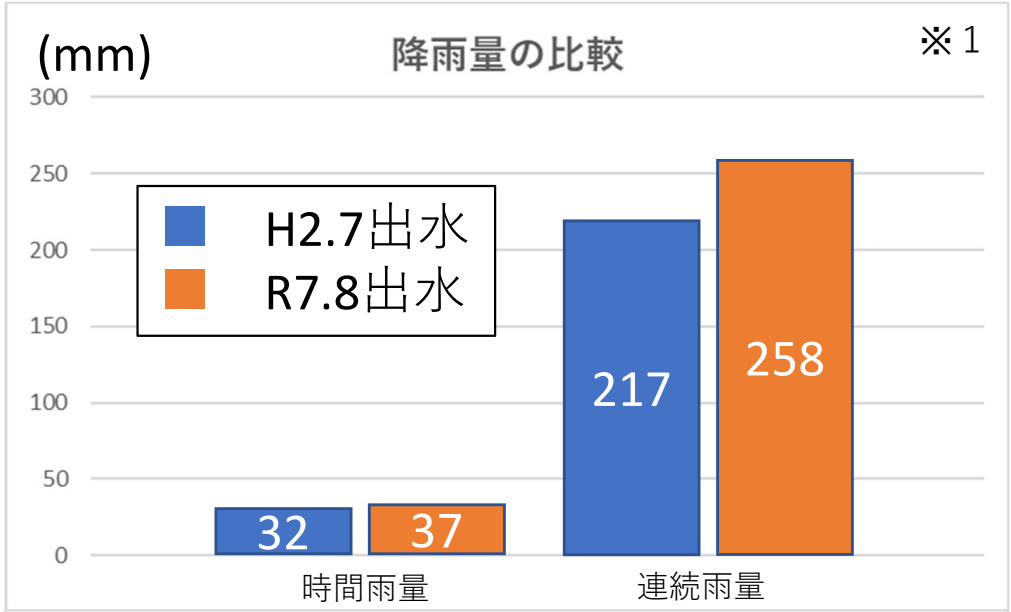


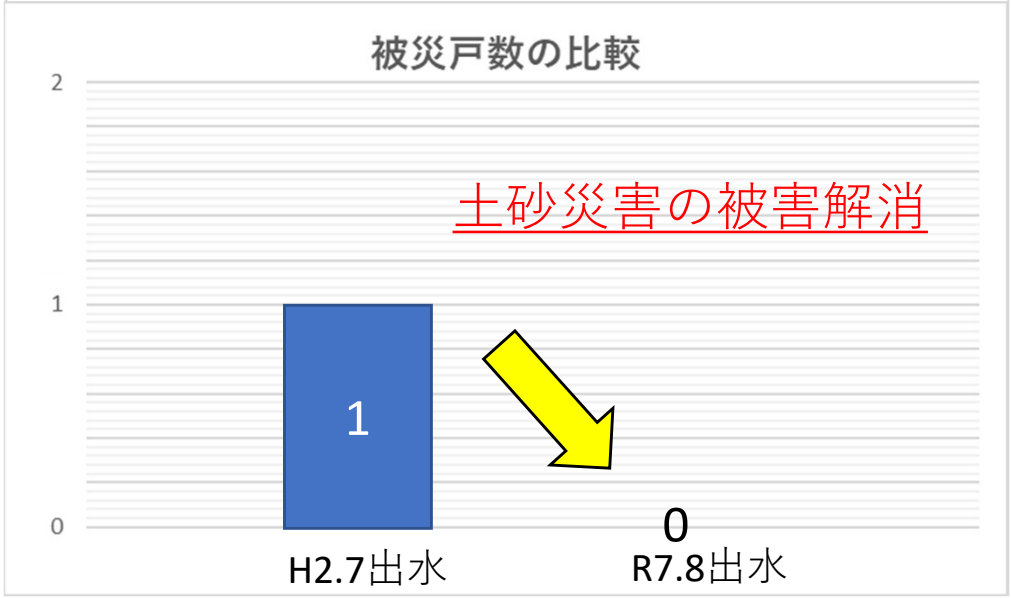

※１：鎧畑雨量観測所での雨量比較

砂防事業の効果③

- 令和7年8月19日～20日の大雨では、特に玉川支川の先達川上流部でまとまった雨を記録（黒湯雨量観測所では連続雨量306mm）
- 先達川に整備した先達川第２砂防堰堤において、多量の流木を捕捉し下流への流出を防止

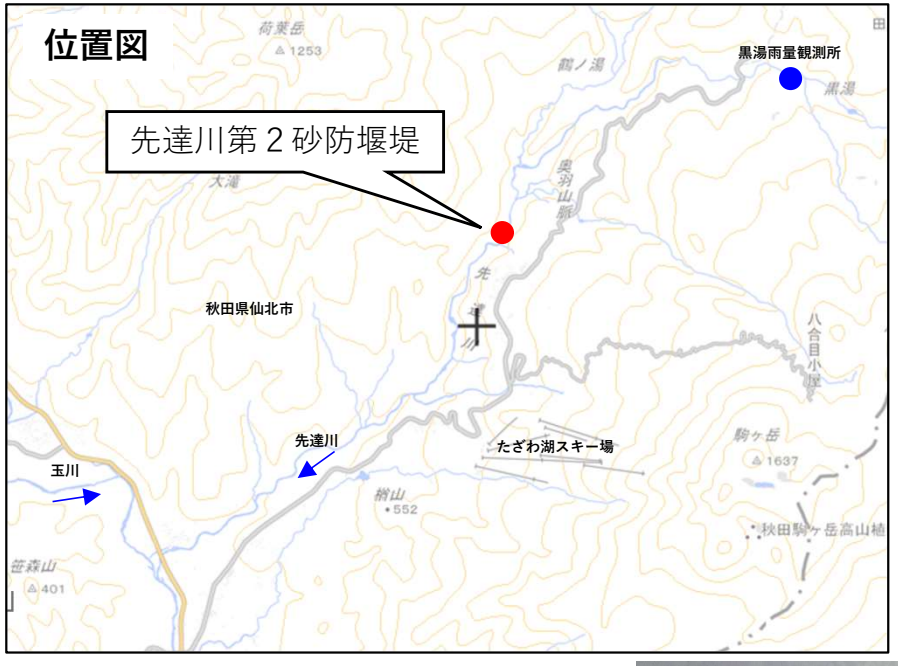



流木の捕捉状況
（先達川第２砂防堰堤）
（高さ14.0m／長さ96.0m）

推定流木捕捉量
約400m3（空隙込み）

