資料9

最上川水系流域委員会

【情報提供資料】

最上川水系緊急治水対策プロジェクト
進捗状況（ハード・ソフト）について

令和７年11月19日


国土交通省　東北地方整備局

（※令和7年11月19日第29回最上川水系流域委員会配付資料）

最上川下流・中流・上流緊急治水対策プロジェクト」の概要

最上川流域では、令和2年7月豪雨、令和4年8月出水及び令和6年7月大雨により甚大な被害が発生したことを踏まえ、国、県、沿川市町村等が連携し、「緊急治水対策プロジェクト」に基づき、河道掘削や堤防整備等の緊急治水対策を集中的に実施することで、同規模の洪水に対して浸水被害の軽減を図ります。

位置図

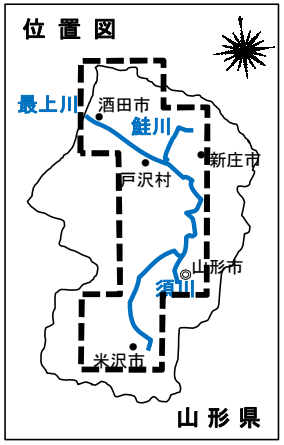

■最上川下流・中流緊急治水対策プロジェクト（令和6年7月大雨対応）

事業目標：令和6年7月豪雨と同規模の洪水に対して、堤防からの越水を防止

- 事業期間　令和6年度～令和11年度
- 事業費　国：約450億円程度、県：約200億円程度
- 整備メニュー：河道掘削、堤防強化　等

■最上川中流・上流緊急治水対策プロジェクト（令和2年7月豪雨対応）

事業目標：令和2年7月豪雨と同規模の洪水に対して、洪水を安全に流下

- 事業期間：令和2年度～令和11年度
- 事業費　国：約568億円程度、県：約88億円程度
- 整備メニュー：河道掘削、堤防整備、分水路整備、遊水地改良　等

■最上川上流（置賜地域）緊急治水対策プロジェクト（令和4年8月洪水対応）


事業目標：令和4年8月出水と同規模の洪水に対して、洪水を安全に流下

- 事業期間　令和4年度～令和7年度
- 事業費　国：約21億円程度、県：約81億円程度
- 整備メニュー　河道掘削　等

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合があります。

事業の進捗状況

（１）最上川中流･上流緊急治水対策プロジェクト[R2.7豪雨対応]（ 国：最上川上流）の進捗状況

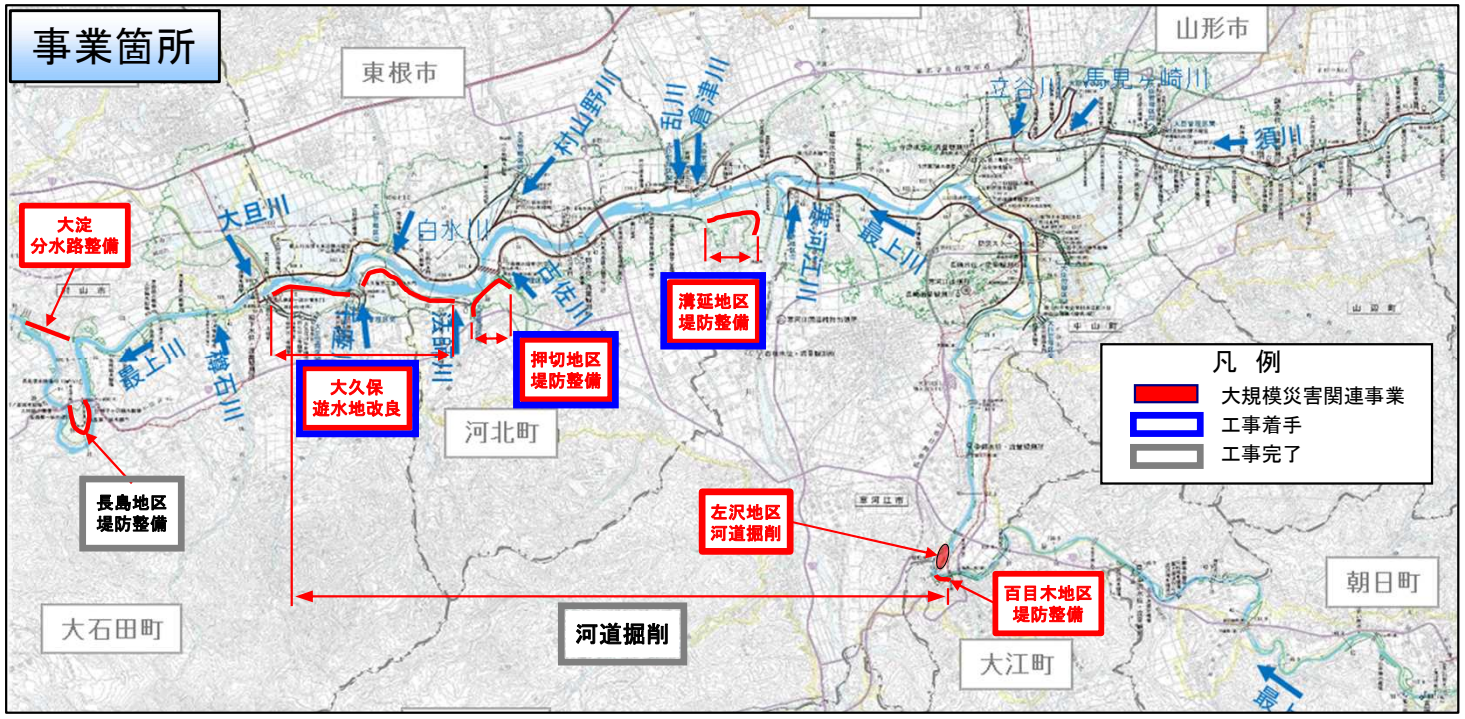

河道掘削の進捗状況

- 全体計画約24.6万m3の掘削の全てを令和４年度に完了しました。





事業の進捗状況

（２）最上川中流･上流緊急治水対策プロジェクト[R2.7豪雨対応]（ 国：最上川上流）の進捗状況

長島地区堤防整備の進捗状況

- 河川からの氾濫を防止するため「堤防整備」を実施し、令和５年６月完成しました。





押切地区堤防整備の進捗状況

- 河川からの氾濫を防止するため｢堤防整備｣を実施しています。
- 押切地区において最上川本川の堤防が概成、支川古佐川、支川法師川の築堤工事を実施中です。





大淀分水路整備の進捗状況

- 洪水流下のネック箇所となる大淀地区に「分水路整備」を実施しています。早期の工事着手にむけ、設計業務および用地調査等を実施しています。





百目木地区堤防の進捗状況

- 河川からの氾濫を防止するため「堤防整備」を実施しています。早期の工事着手に向け設計および用地補償を実施中です。






事業の進捗状況

（３）最上川中流･上流緊急治水対策プロジェクト[R2.7豪雨対応]（ 国：最上川中流）の進捗状況

河道掘削の進捗状況


- 河道掘削約65万m3のうち、約54万m3(約8割)の掘削を完了(令和7年10月末現在)しました。引き続き河道掘削を実施します。

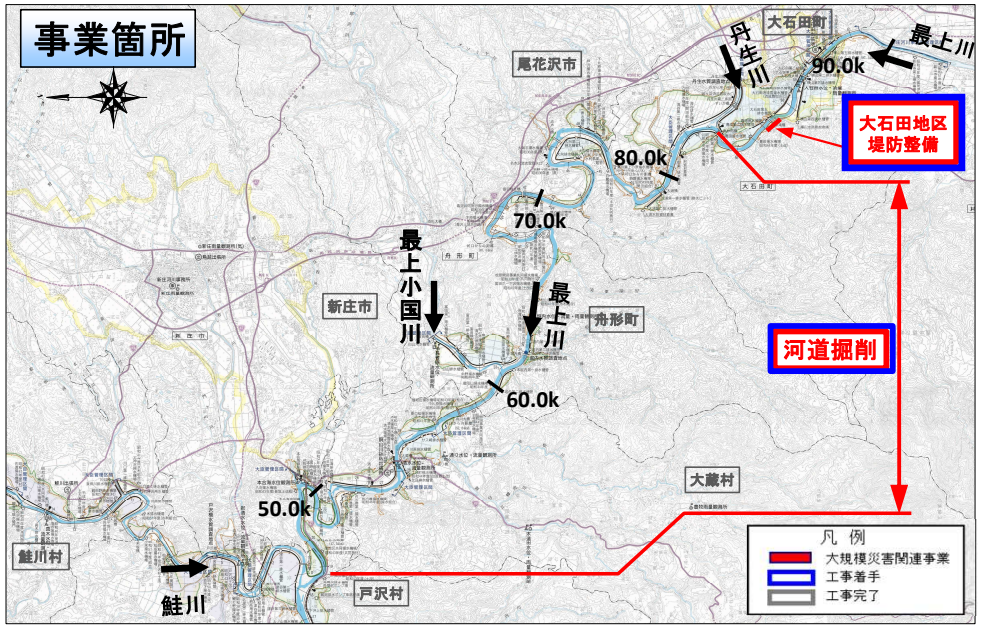


被災状況・整備予定



最上川中流堀内地区河道掘削工事（舟形町）

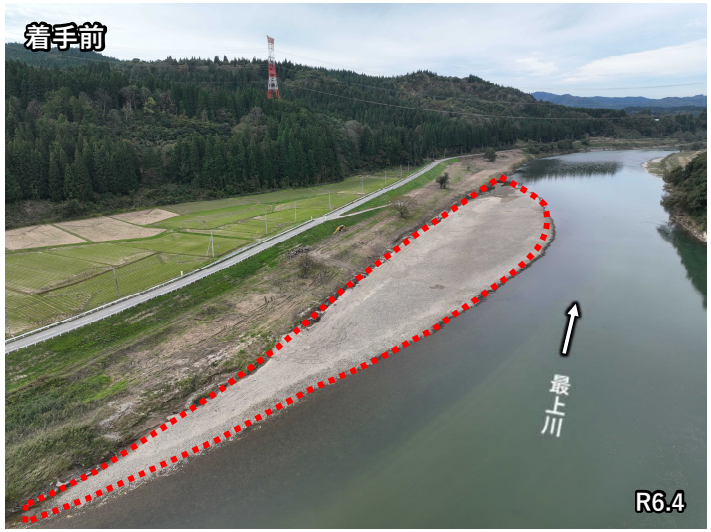

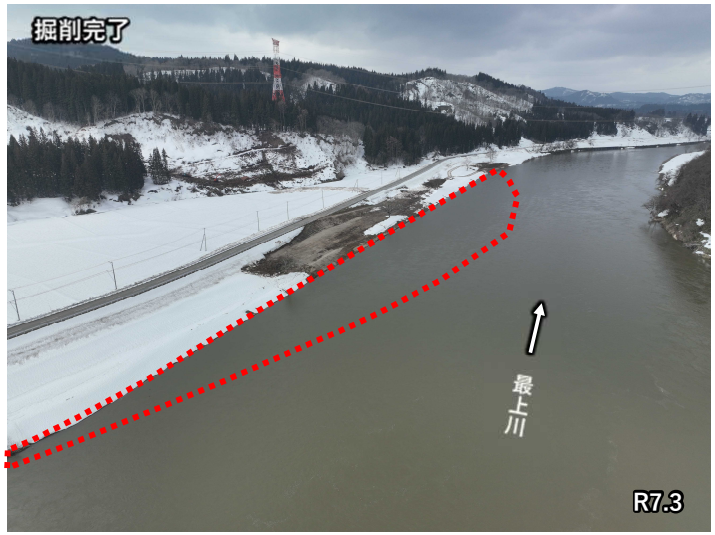



事業の進捗状況

（４）最上川中流･上流緊急治水対策プロジェクト[R2.7豪雨対応]（県）の進捗状況

白水川　堤防整備の進捗状況

- 令和２年７月豪雨により決壊した堤防の復旧と併せた「堤防整備」を実施し、令和４年10月に完成しました。

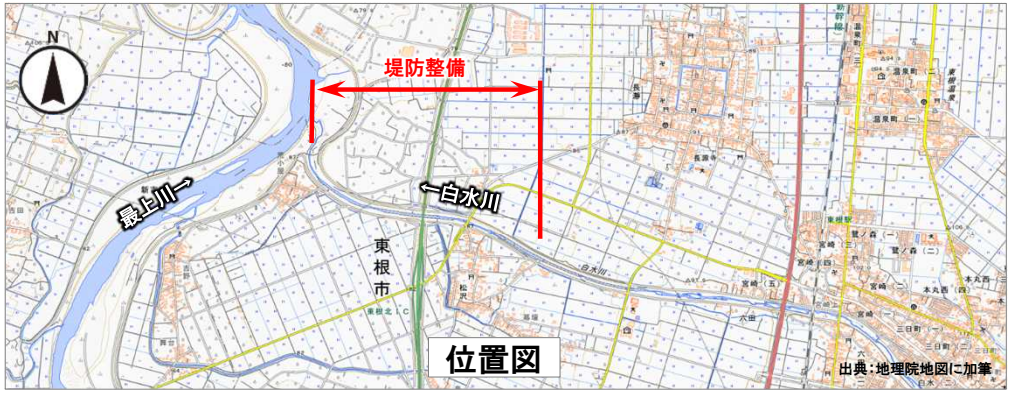

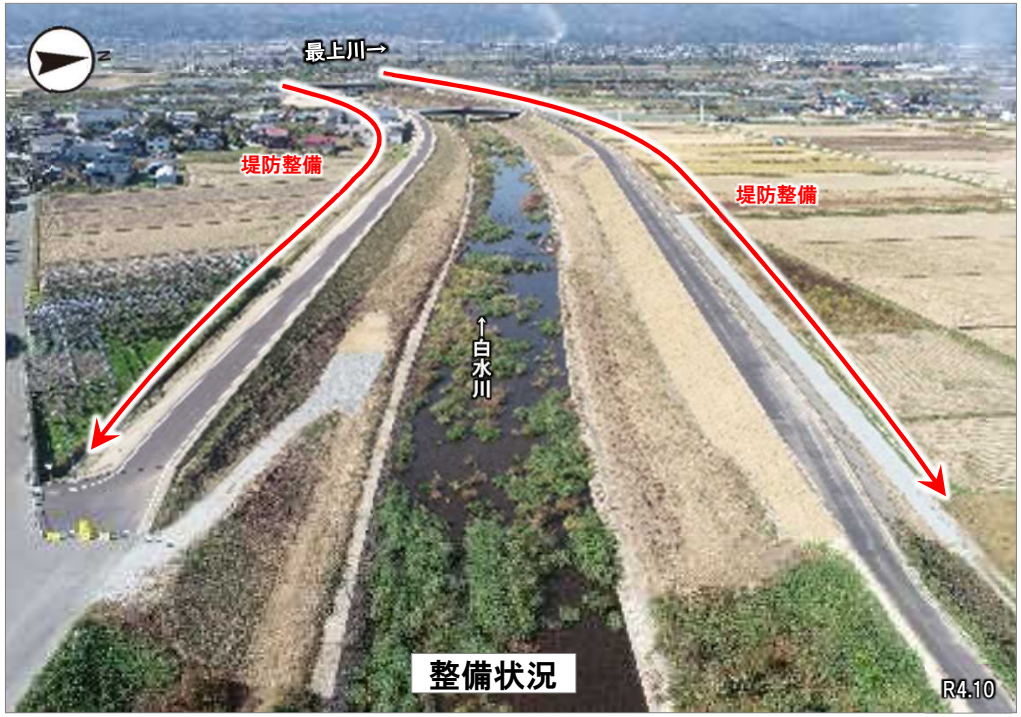

大旦川　調節池整備の進捗状況

- 大旦川沿川の浸水被害を防止するための「調節池整備」を実施し、令和５年６月に一部を運用開始しました。






事業の進捗状況

（５）最上川上流(置賜地区)緊急治水対策プロジェクト[R4.8豪雨対応]（ 国：最上川上流）の進捗状況


河道掘削の進捗状況

- 全体計画約14万m3の掘削の全てを令和５年度に完了しました。

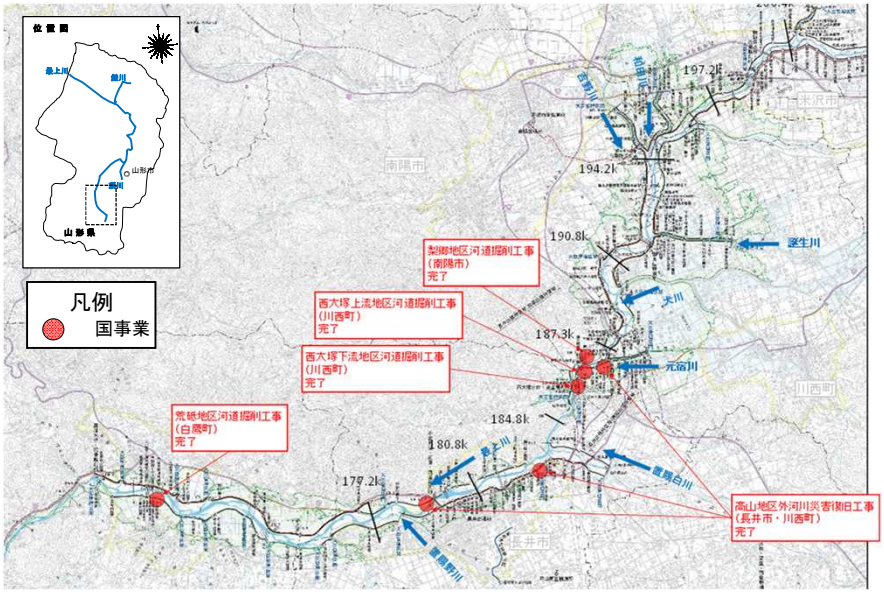


高山地区外河川災害復旧工事（長井市･川西町）






堤体内への河川水の浸透を表法面を被覆することで抑制し、漏水を防ぎ堤体の安全性を向上


荒砥地区河道掘削工事(白鷹町)

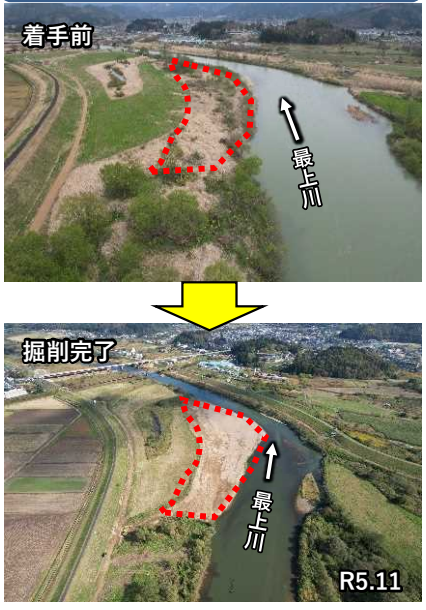


西大塚下流地区河道掘削工事(川西町)

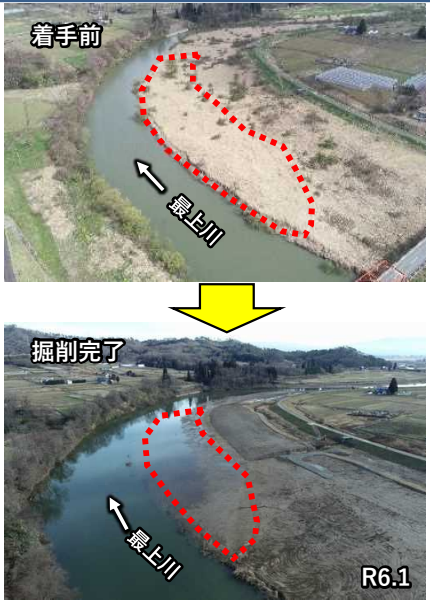

西大塚上流地区河道掘削工事(川西町)

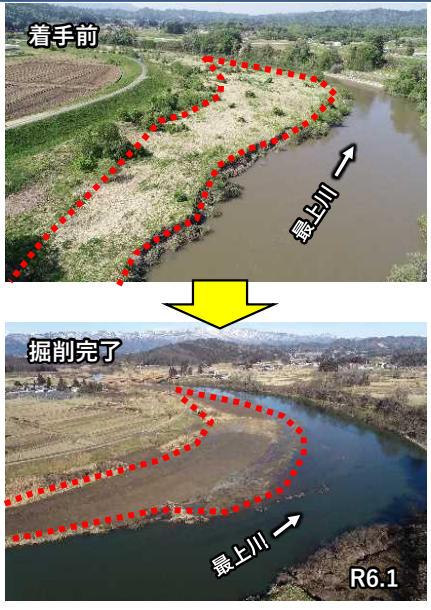

梨郷地区河道掘削工事(南陽市)

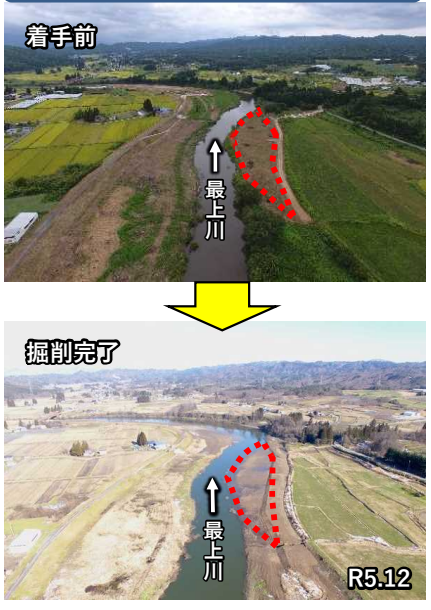

事業の進捗状況

（６）最上川上流(置賜地区)緊急治水対策プロジェクト[R4.8豪雨対応]（県）の進捗状況

小白川　災害復旧（河道整備）の進捗状況

- 令和４年８月豪雨により溢水が発生し甚大な被害が発生したことから、再度災害防止のため、河道整備工事を実施しており、令和７年度中の完成予定です。












整備状況

萩生川　災害復旧（河道整備）の進捗状況

- 令和４年８月豪雨により溢水が発生し甚大な被害が発生したことから、再度災害防止のため、河道整備工事を実施しており、令和７年度中の完成予定です。

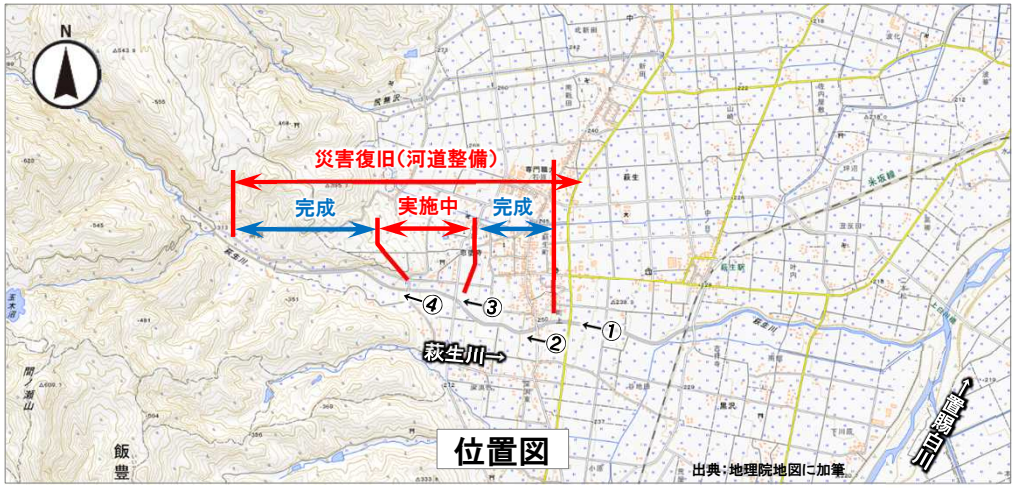










整備状況

事業の進捗状況


（７）最上川下流･中流緊急治水対策プロジェクト[R6.7大雨対応]（ 国：最上川中流）の進捗状況

河道掘削の進捗状況

- 令和7年6月15日工事着手、引き続き河川水位を低減させるため「河道掘削」を実施します。

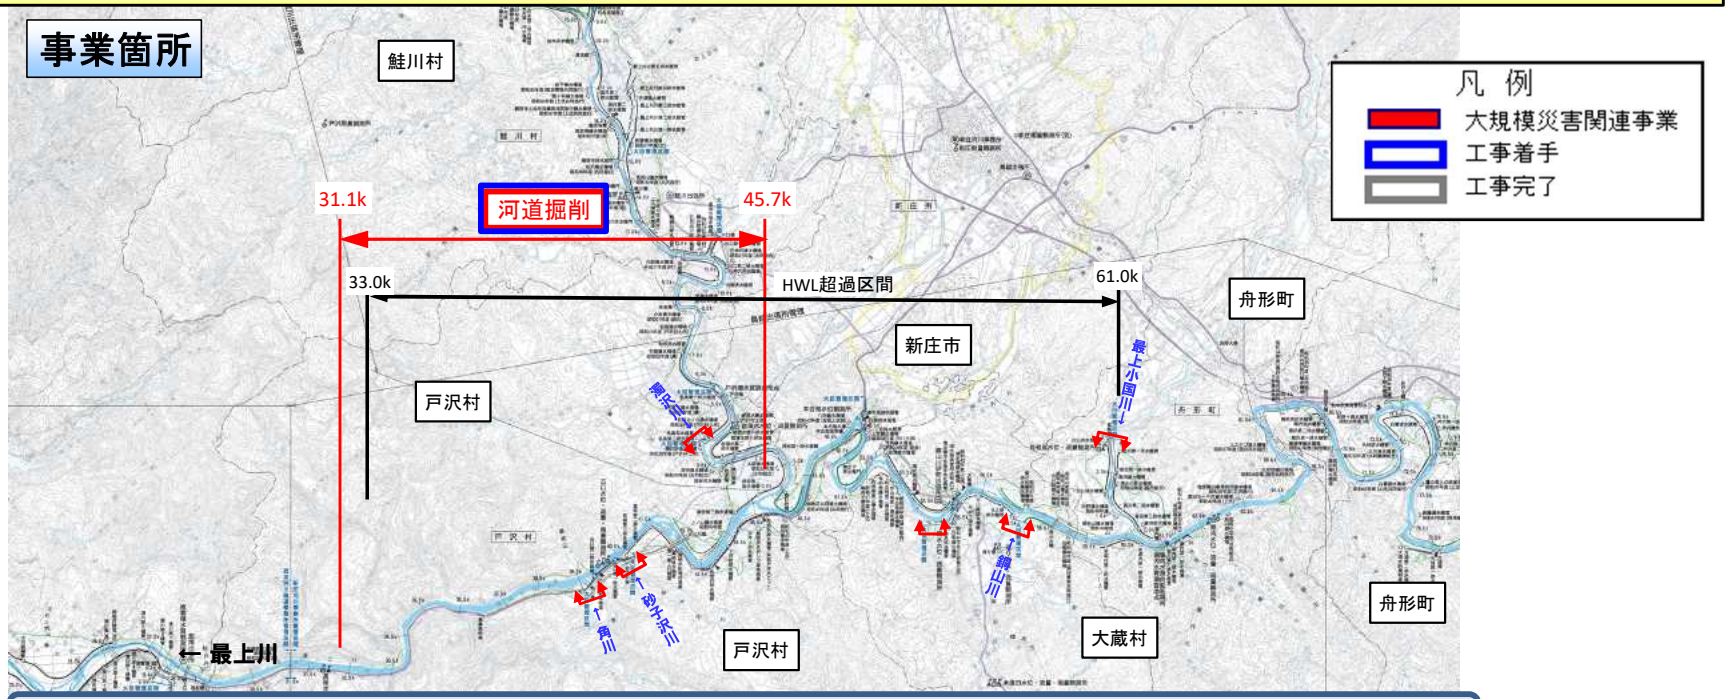

最上川中流蔵岡地区（戸沢村）

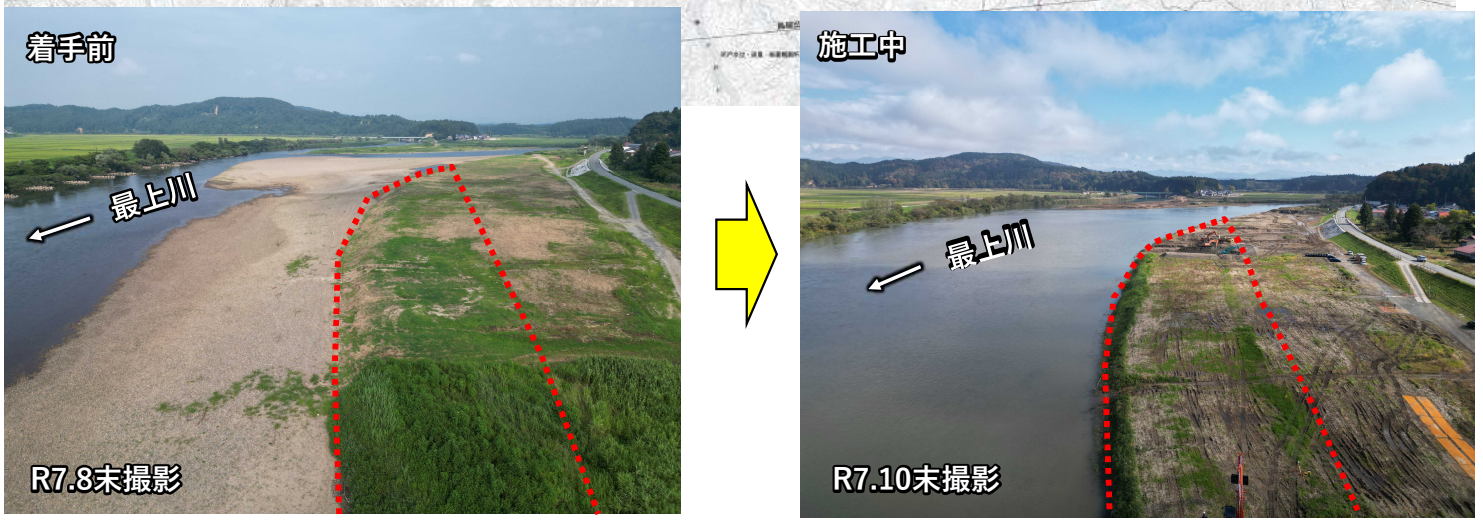


事業の進捗状況

（８）最上川下流･中流緊急治水対策プロジェクト[R6.7大雨対応]（ 国：最上川下流）の進捗状況


河道掘削の進捗状況

- 令和7年6月15日工事着手、引き続き河川水位を低減させるため「河道掘削」を実施します。

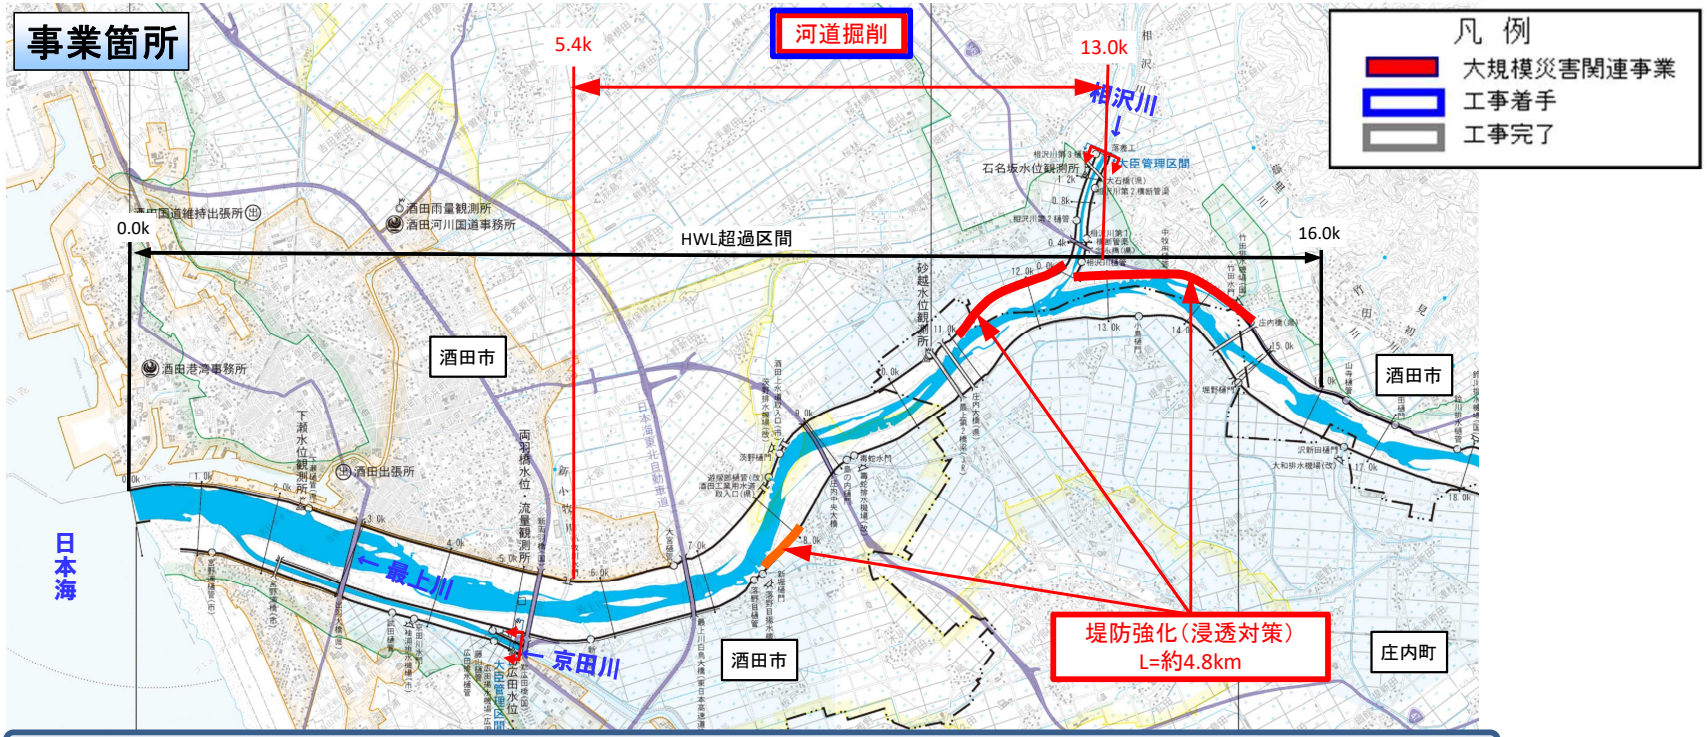

最上川下流飛鳥地区（酒田市）



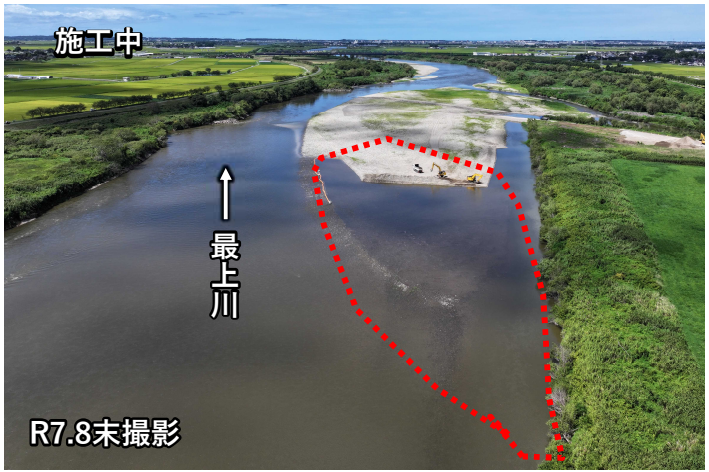

事業の進捗状況

（９）最上川下流･中流緊急治水対策プロジェクト[R6.7豪雨対応]（県）の進捗状況

災害復旧の進捗状況

- 令和６年７月豪雨により被災した河川管理施設の災害復旧工事を実施しています。
- 進捗率は約４５％です。（R7.9末時点）

■ 復旧事例（新田川：新庄市）







■ 復旧事例（絹出川：最上町）







土砂浚渫の進捗状況

- 令和６年７月豪雨により河道に堆積した土砂の浚渫を実施しています。
- 進捗率は約８５％です。（R7.9末時点）

■ 実施事例（桝沢川：金山町）







■ 実施事例（京田川：庄内町）







事業の進捗状況

（１０）ソフトの取り組み

最上川中流・上流緊急治水対策プロジェクトの進捗状況説明会

- 令和2年7月豪雨から5年を迎えたことを受け、プロジェクトの進捗状況などを紹介しました。



進捗状況説明会の様子（R7.7.23）

巡回パネル展

- 令和2年7月豪雨や令和6年7月出水の振り返りとして県内全域で巡回パネル展を開催しました。



村山市役所市民ホールでのパネル設置状況（R7.6.23）

山形地域メディア連携協議会

- 住民の避難行動につながる情報発信を行うため行政とメディアが連携しています。




山形地域メディア連携協議会（R7.8.7）

水害リスク情報空白域の解消

- 令和7年5月に山形県内の一級河川及び二級河川の５５４河川で浸水想定区域の指定が完了しました。

令和7年5月に、県管理河川すべての洪水浸水想定区域の指定が完了

- 河川を管理する国土交通省や県は、水防法に基づき、**河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を「洪水浸水想定区域」に指定**しています。
- これまで、最上川や赤川等、水防上重要な河川（※１）で指定してきましたが、令和３年に水防法が改正され、**すべての河川（※２）が指定の対象**となりました。
- **県は、令和元年度までに指定した70河川に加えて、中小河川等484河川を令和7年5月までに指定が完了**しています。
  - 村山地域 127河川は令和6年6月に指定
  - 最上,置賜,庄内地域 357河川は令和7年5月に指定
- 洪水浸水想定区域は、**市町村のハザードマップにより県民へ周知され、命を守る行動に役立てられます。**



洪水浸水想定区域 ＋ 避難に役立つ情報（避難場所、避難路など） ＝ 洪水ハザードマップ

河川管理者（国土交通省・県）が指定します　　市町村が作成・配布します

- **洪水浸水想定区域の追加指定は、これまで未指定だった中小河川等の氾濫リスクを示し、「河川の氾濫リスク情報空白域」の解消を図ることで、避難行動に役立てていただくための取組です**
- **「氾濫する範囲がこれまでよりも増える」「地域の災害リスクが増大する」ことではありません**

※１ 水防法第11条第1項の洪水予報河川、第13条第2項の水位周知河川　※２ 国土交通省及び県が管理するすべての河川

県ホームページに掲載する洪水浸水想定区域図はQRコードからアクセス可能

事業の進捗状況

（１０）ソフトの取り組み

マイ・タイムライン講習会開催

- 防災教育を通じたマイ・タイムラインの普及啓発を行っています。



気象防災アドバイザーを招いたマイ・タイムライン研修会の様子（R7.1.19）

住民参加による防災訓練

- 水害を想定した住民避難訓練を実施し、住民の防災意識の向上を図りました。



住民参加による避難訓練の様子
寒河江市（R6.7.14）



寒河江市消防団水防隊
水防工法訓練（R6.5.19）

小学生向け防災講座

- 自分達が住む地域の水害の可能性や、洪水への事前の備え、避難の重要性に関する防災授業を行いました。



防災教育（座学）の様子（R7.6.20）

実践的な演習の実施

- 関係自治体、山形県、国土交通省が連携し実践的な危機管理演習を実施しています。



危機管理演習の様子（R6.10.17）
