
最上川中流大規模災害関連事業
～令和2年7月豪雨の治水対策～

新庄河川事務所　　令和8年9月30日現在



大規模災害関連事業	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和９年度	令和１０年度	令和１１年度
河道掘削		設計	河道掘削							
白須賀地区 堤防整備		堤防整備	完了							
大石田・横山地区 堤防整備			設　計				堤防整備			
			用　地							

※現時点での予定であり、今後の事業進捗によって変更となる場合があります。

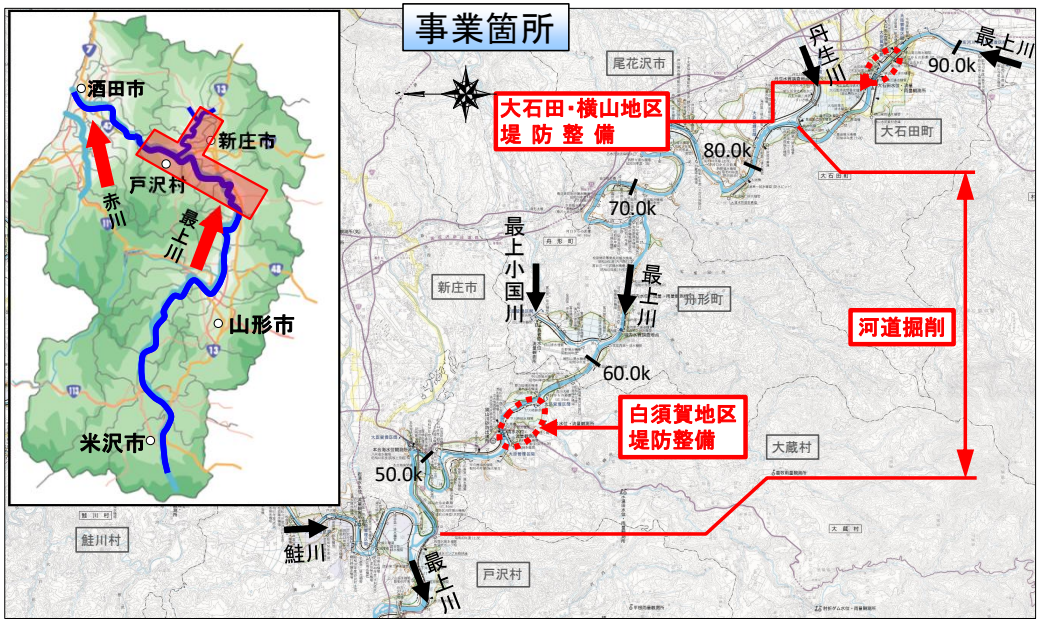


問い合わせ：国土交通省　東北地方整備局　新庄河川事務所　TEL：0233-22-0251（代表）

河　道　掘　削

設　計　100%

工　事　80%

掘削量：536千m3／654千m3

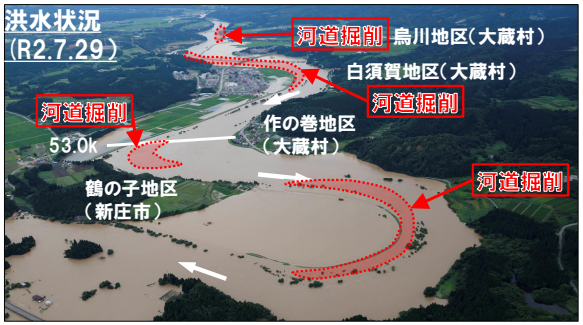

白須賀地区堤防整備（事業完了）

設　計　100%

工　事　100%

盛土量：19千m3／19千m3

完成状況



大石田・横山地区堤防整備

調査設計　80%

用地調査　90%

用地補償　75%

工　事　5%



完成イメージ(大石田・横山地区)

引提により、川の幅を拡げることで、川の流下能力を大きくする。

