1．現況及びこれまでの対応状況（取水状況等及びポンプ車の活動状況）

■ 取水状況及び河川水位の状況

※前日から上昇傾向は↑　下降傾向は↓ で表示

（１）取水の状況

◆草薙頭首工（右岸）最大許可水量12.686㎥/sに対する取水量
8/23 17:00　2.376 ㎥ /s（18.7%）
8/24 17:00　1.713 ㎥ /s［↓0.663］(13.5%［↓5.2］)

◆最上川取水口（左岸）最大許可水量13.925 ㎥ /sに対する取水量
8/23 17:00　11.326 ㎥ /s（81.3%）
8/24 17:00　11.030 ㎥ /s［↓0.296］(79.2%［↓2.1］)

（２）緊急的な振替取水及び排水ポンプ車による改善状況

◆草薙頭首工（右岸）
8/23 17:00　2.376 ㎥ /s＋1.982(推定補給量)=4.358 ㎥ /s(34.4%)
8/24 17:00　1.713 ㎥ /s＋1.582(推定補給量)=3.295 ㎥ /s［↓1.063］(26.0%［↓8.4］)

◆最上川取水口（左岸）
8/23 17:00　11.326 ㎥ /s＋1.113(推定補給量)=12.439 ㎥ /s(89.3%)
8/24 17:00　11.030 ㎥ /s＋0.910(推定補給量)=11.940 ㎥ /s［↓0.499］(85.7%)

（３）河川水位（高屋地点）

8/23 13:00　-0.97m、流量：106 ㎥ /s
8/24 13:00　-1.00m［↓0.03m］、流量：100.0 ㎥ /s［↓6.0］
8/25　8:00　-1.03m［↓0.03m］、流量： 93.9 ㎥ /s［↓6.1］

注1）「推定補給量」とは、振替取水とポンプ車によって補給されている量を推定した値
注2）「推定補給量」には草薙頭首工への排水ポンプ車よる直接補給(1.0㎥/ｓ)を含まない

■ 排水ポンプ車の活動状況

① 草薙頭首工　：２台★稼働中（排水ポンプ車　0.5 ㎥ /s）
② 成興野地区　：１台★稼働中（排水ポンプ車　0.5 ㎥ /s）
③ 大川渡地区　：３台★稼働中（可搬式ポンプ３インチ）
④ 相沢地区　　：２台★稼働中（可搬式ポンプ８インチ）
⑤ 砂越地区　　：１台★稼働中（排水ポンプ車（農政局）0.25 ㎥ /s）、
　　１台★稼働中（排水ポンプ　0.5㎥/s）

緊急取水対応（排水ポンプ車等配置、振替取水など）

▭ ・・・緊急的な振替取水による対応
▭ ・・・排水ポンプ車等による対応

日向川（二級河川）
8月18日　振替取水開始
・日向川頭首工

荒瀬川（二級河川）
8月18日　振替取水開始
・下井皿頭首工

荒瀬川（二級河川）
8月18日　振替取水開始
・荒瀬川頭首工

⑤ 砂越地区（最上川からの取水）
農政局排水ポンプ車　1台（0．25m3/s）
8月22日16時00分　取水開始

国交省排水ポンプ車　1台（0．5m3/s）
8月24日 17時00分　取水開始
施工者：（株）長浜建設

相沢川
8月18日　振替取水開始
・平田揚揚水機

田沢川
8月18日　振替取水開始
・田沢川揚水機

田沢川ダム
8月24日 利水放流（0.2㎥/s）開始

④ 相沢地区（農業排水路からの取水）
国交省可搬式ポンプ（8inc×2台）
8月22日13時40分　取水開始
施工者：（株）鈴木工務店

③ 大川渡地区（三瀬川からの取水）
国交省可搬式ポンプ（3inc×3台）
8月21日11時30分　取水開始
施工者：佐藤建設（株）

② 成興野地区（最上川からの取水）
国交省排水ポンプ車　1台（0．5m3/s）
8月22日 13時00分 取水開始
施工者：（株）長浜建設

北楯頭首工
8月18日　振替取水開始

さみだれ大堰

最上川取水口

草薙頭首工

① 草薙頭首工（最上川からの取水）
国交省排水ポンプ車　1台（0．5m3/s）
8月21日15時10分　取水開始
国交省排水ポンプ車　1台（0．5m3/s）
8月21日18時20分　取水開始
施工者：（株）鈴木工務店、佐藤建設（株）

排水ポンプ車の配置・稼働状況
【場所①】 草薙頭首工 (最上川から頭首工へ補給)

・排水ポンプ車（国交省）0.5㎥/s　1台　　8/21 15:10より補給開始
・排水ポンプ車（国交省）0.5㎥/s　1台　　8/21 18:20より補給開始







水路への補給状況(8/24(月)PM撮影)



水路への補給状況(8/24(月)PM撮影)

排水ポンプ車の配置・稼働状況
【場所②】 成興野地区 (最上川から水路へ補給)



水路への放水状況(8/23(日)AM撮影)




ホース敷設状況

・排水ポンプ車（国交省） 0.5㎥/s 1台

8月22日13:00から補給開始

可搬式ポンプの配置・稼働状況
【場所③】大川渡地区 （隣接する三瀬川から幹線水路への補給）

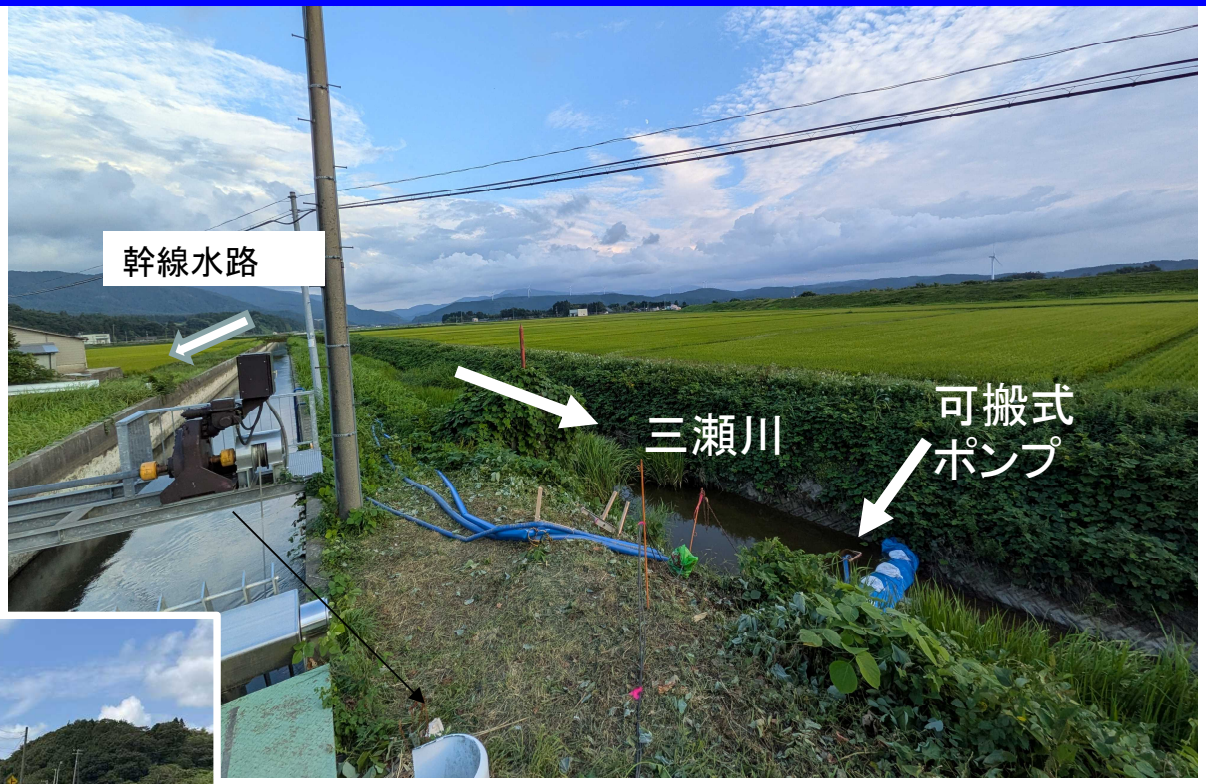



・可搬式ポンプ（国交省） ３インチ３台

8/21 11:30より補給開始

可搬式ポンプの配置・稼働状況
【場所④】 相沢地区 （隣接する水路から幹線水路への補給）



幹線水路



・可搬式ポンプ（国交省）８インチ２台

8/22 13:40より補給開始

※隣接水路の水量により運転台数を切換

排水ポンプ車の配置・稼働状況
【場所⑤】砂越地区 （最上川から茨野排水機場へ補給） ※国交省・農政局 合同





国交省・農政局 最上川取水、ホース設置状況



国交省・農政局 補給状況(撮影：8/24 18時頃)
