さみだれ大堰緊急対応状況（9月2日　17:00時点）

■ 取水状況及び河川水位の状況

（１）取水の状況

◆草薙頭首工(右岸)最大許可水量 12.686㎥/s に対する取水量
9/1 17:00　10.354 ㎥/s (81.6%)
9/2 17:00　10.296 ㎥/s [↓-0.058] (81.2% [↓-0.4])

◆最上川取水口(左岸)最大許可水量 13.925㎥/s に対する取水量
9/1 17:00　6.390 ㎥/s (45.9%)
9/2 17:00　5.800 ㎥/s [↓-0.59] (41.7%[↓-4.2])

（２）緊急的な振替取水及び排水ポンプ車による改善状況

◆草薙頭首工(右岸)
9/1 17:00　10.354 ㎥/s＋0.000 (推定補給量)=10.354 ㎥/s (81.6%)
9/2 17:00　10.296 ㎥/s＋0.000 (推定補給量)=10.296 ㎥/s [↓-0.058] (81.2% [↓-0.4])

◆最上川取水口(左岸)
9/1 17:00　6.390 ㎥/s＋0.000 (推定補給量)= 6.390 ㎥/s (45.9%)
9/2 17:00　5.800 ㎥/s＋0.000 (推定補給量)= 5.800 ㎥/s [↓-0.59](41.7% [↓-4.2])

※前日から上昇傾向は↑下降傾向は↓で表示

注1)「推定補給量」とは、振替取水とポンプ車によって補給されている量を推定した値
注2)「推定補給量」には草薙頭首工への排水ポンプ車よる直接補給(1.0㎥/s)を含まない

（３）河川水位（高屋地点）

9/1 17:00　-0.61m、流量：195.0 ㎥/s
9/2 17:00　-0.67m [↓-0.06 m]、流量：179.0 ㎥/s [↓-16.0]
9/3　8:00　-0.72m [↓-0.05 m]、流量：165.0 ㎥/s [↓-14.0]


■ 排水ポンプ車の活動状況


① 草薙頭首工　　：２台☆待機中（排水ポンプ車　0.5 ㎥ /s）
② 成興野地区　　：２台☆待機中（排水ポンプ車　0.5 ㎥ /s）、
　　２台☆待機中（可搬式ポンプ８インチ）
③ 大川渡地区　　：３台☆待機中（可搬式ポンプ３インチ）
④ 相沢地区　　：２台☆待機中（可搬式ポンプ８インチ）
⑤ 砂越地区　　：１台☆待機中（排水ポンプ車（農政局）0.25 ㎥ /s）、
　　１台☆待機中（排水ポンプ　0.5㎥/s）
⑥ 天神堂地区　　：１台☆待機中（可搬式ポンプ４インチ）
⑦ 大正第一揚水機場：１台☆待機中（可搬式ポンプ４インチ）
⑧ 大正第二ゲート　：１台☆待機中（可搬式ポンプ８インチ）

※ ★稼働中　☆待機中（流況改善のためポンプ一時停止）


さみだれ大堰緊急対応状況（9月2日　17:00時点）

■ 最大許可取水量に対する取水状況

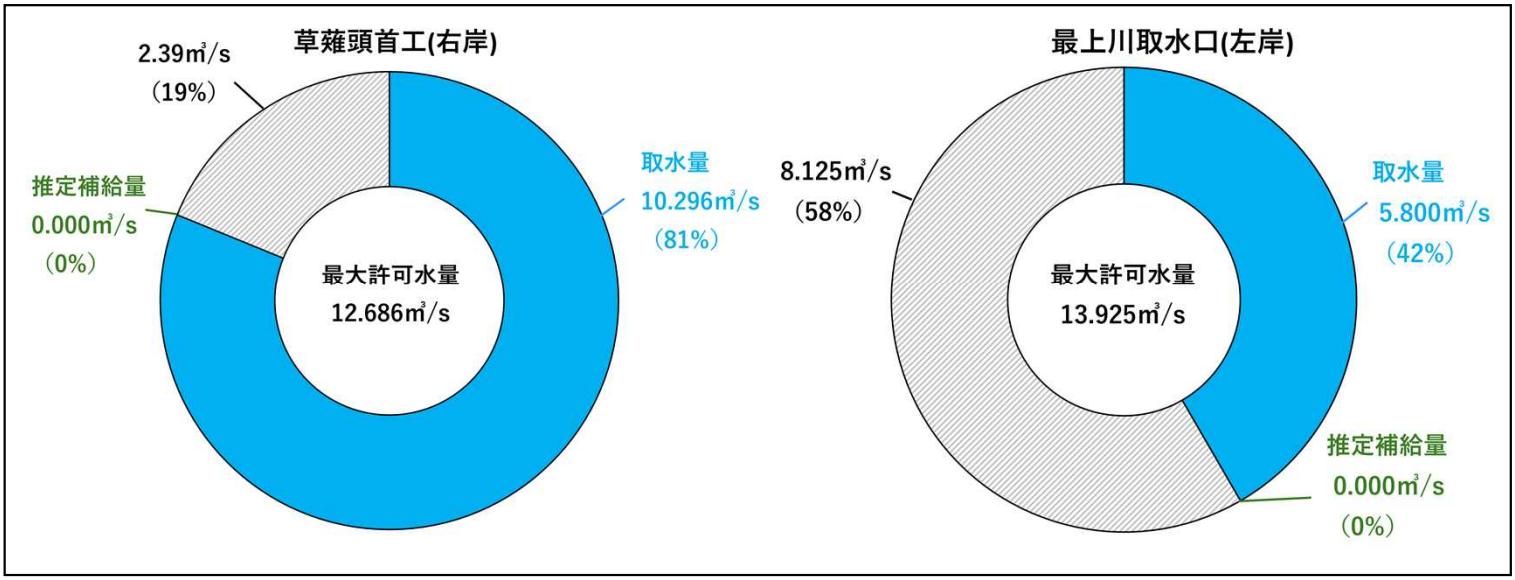

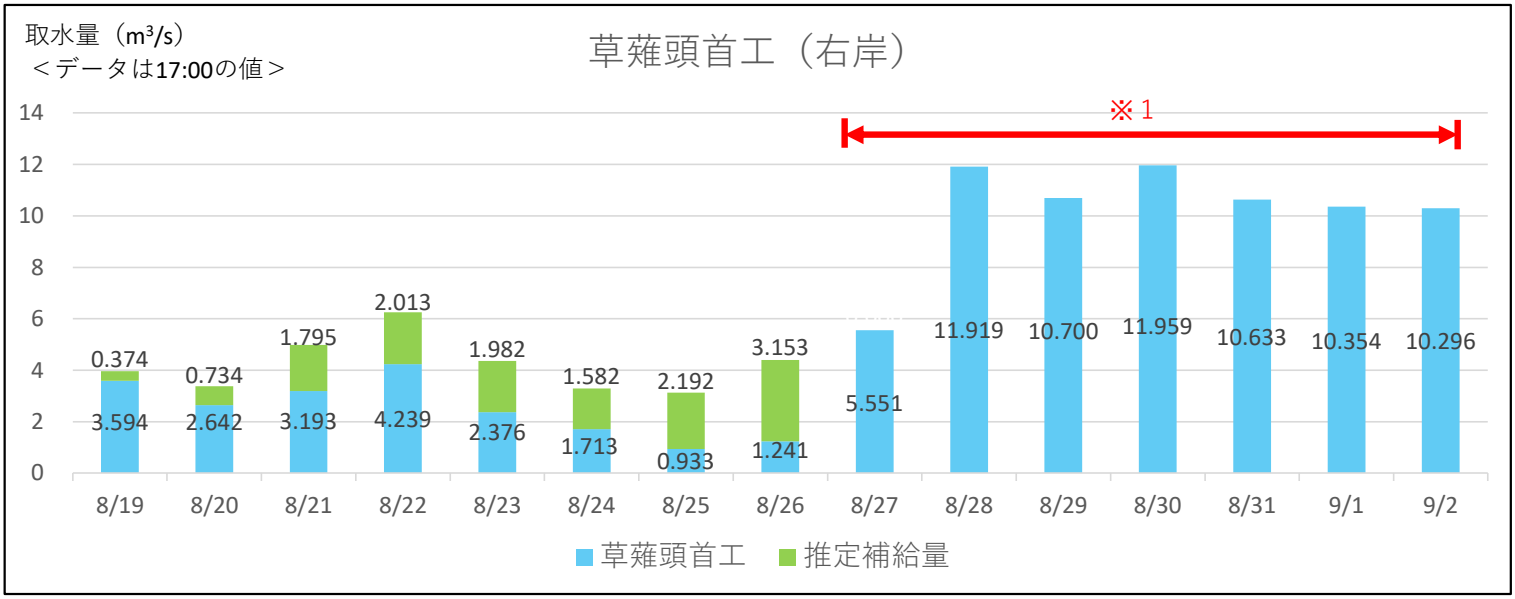

※1 降雨の影響で取水量が増加したため、補給は一旦停止。

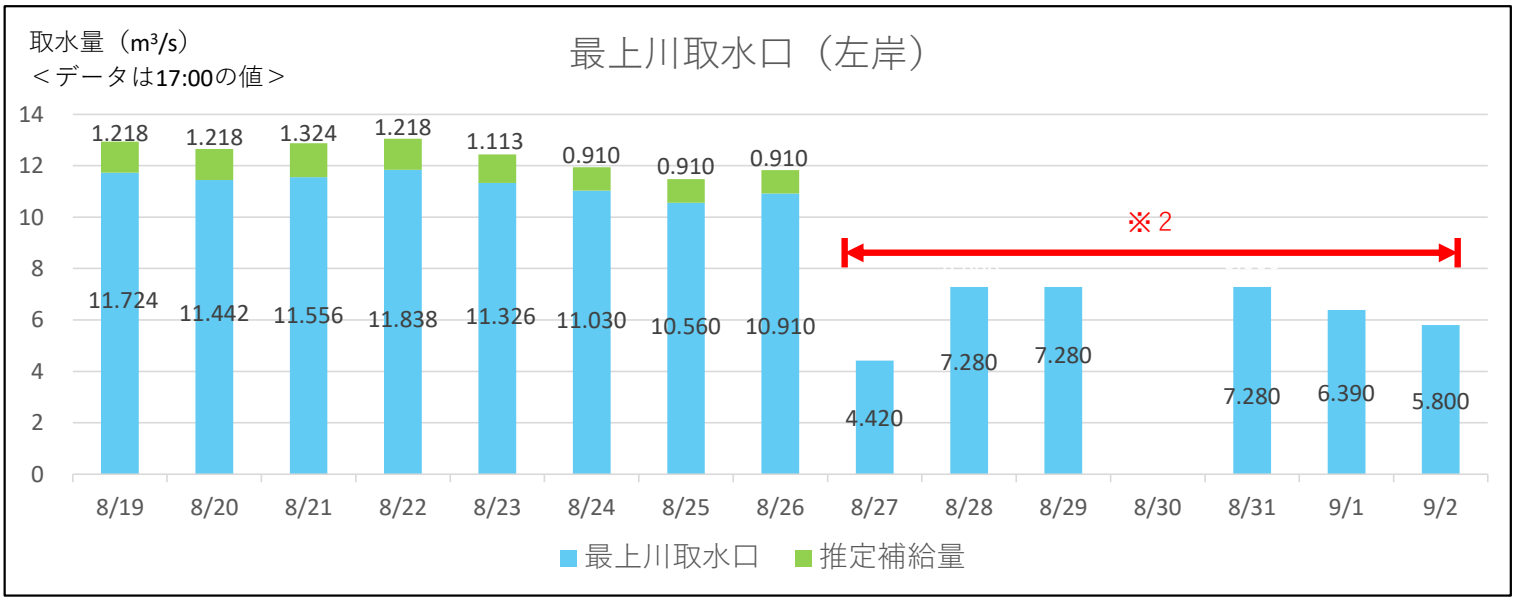


※2 降雨のため取水が不要または用水需要が減ったため、補給は一旦停止。

緊急取水対応（排水ポンプ車等配置、振替取水など）

9月2日　17：00時点

・・・緊急的な振替取水による対応
・・・排水ポンプ車等による対応

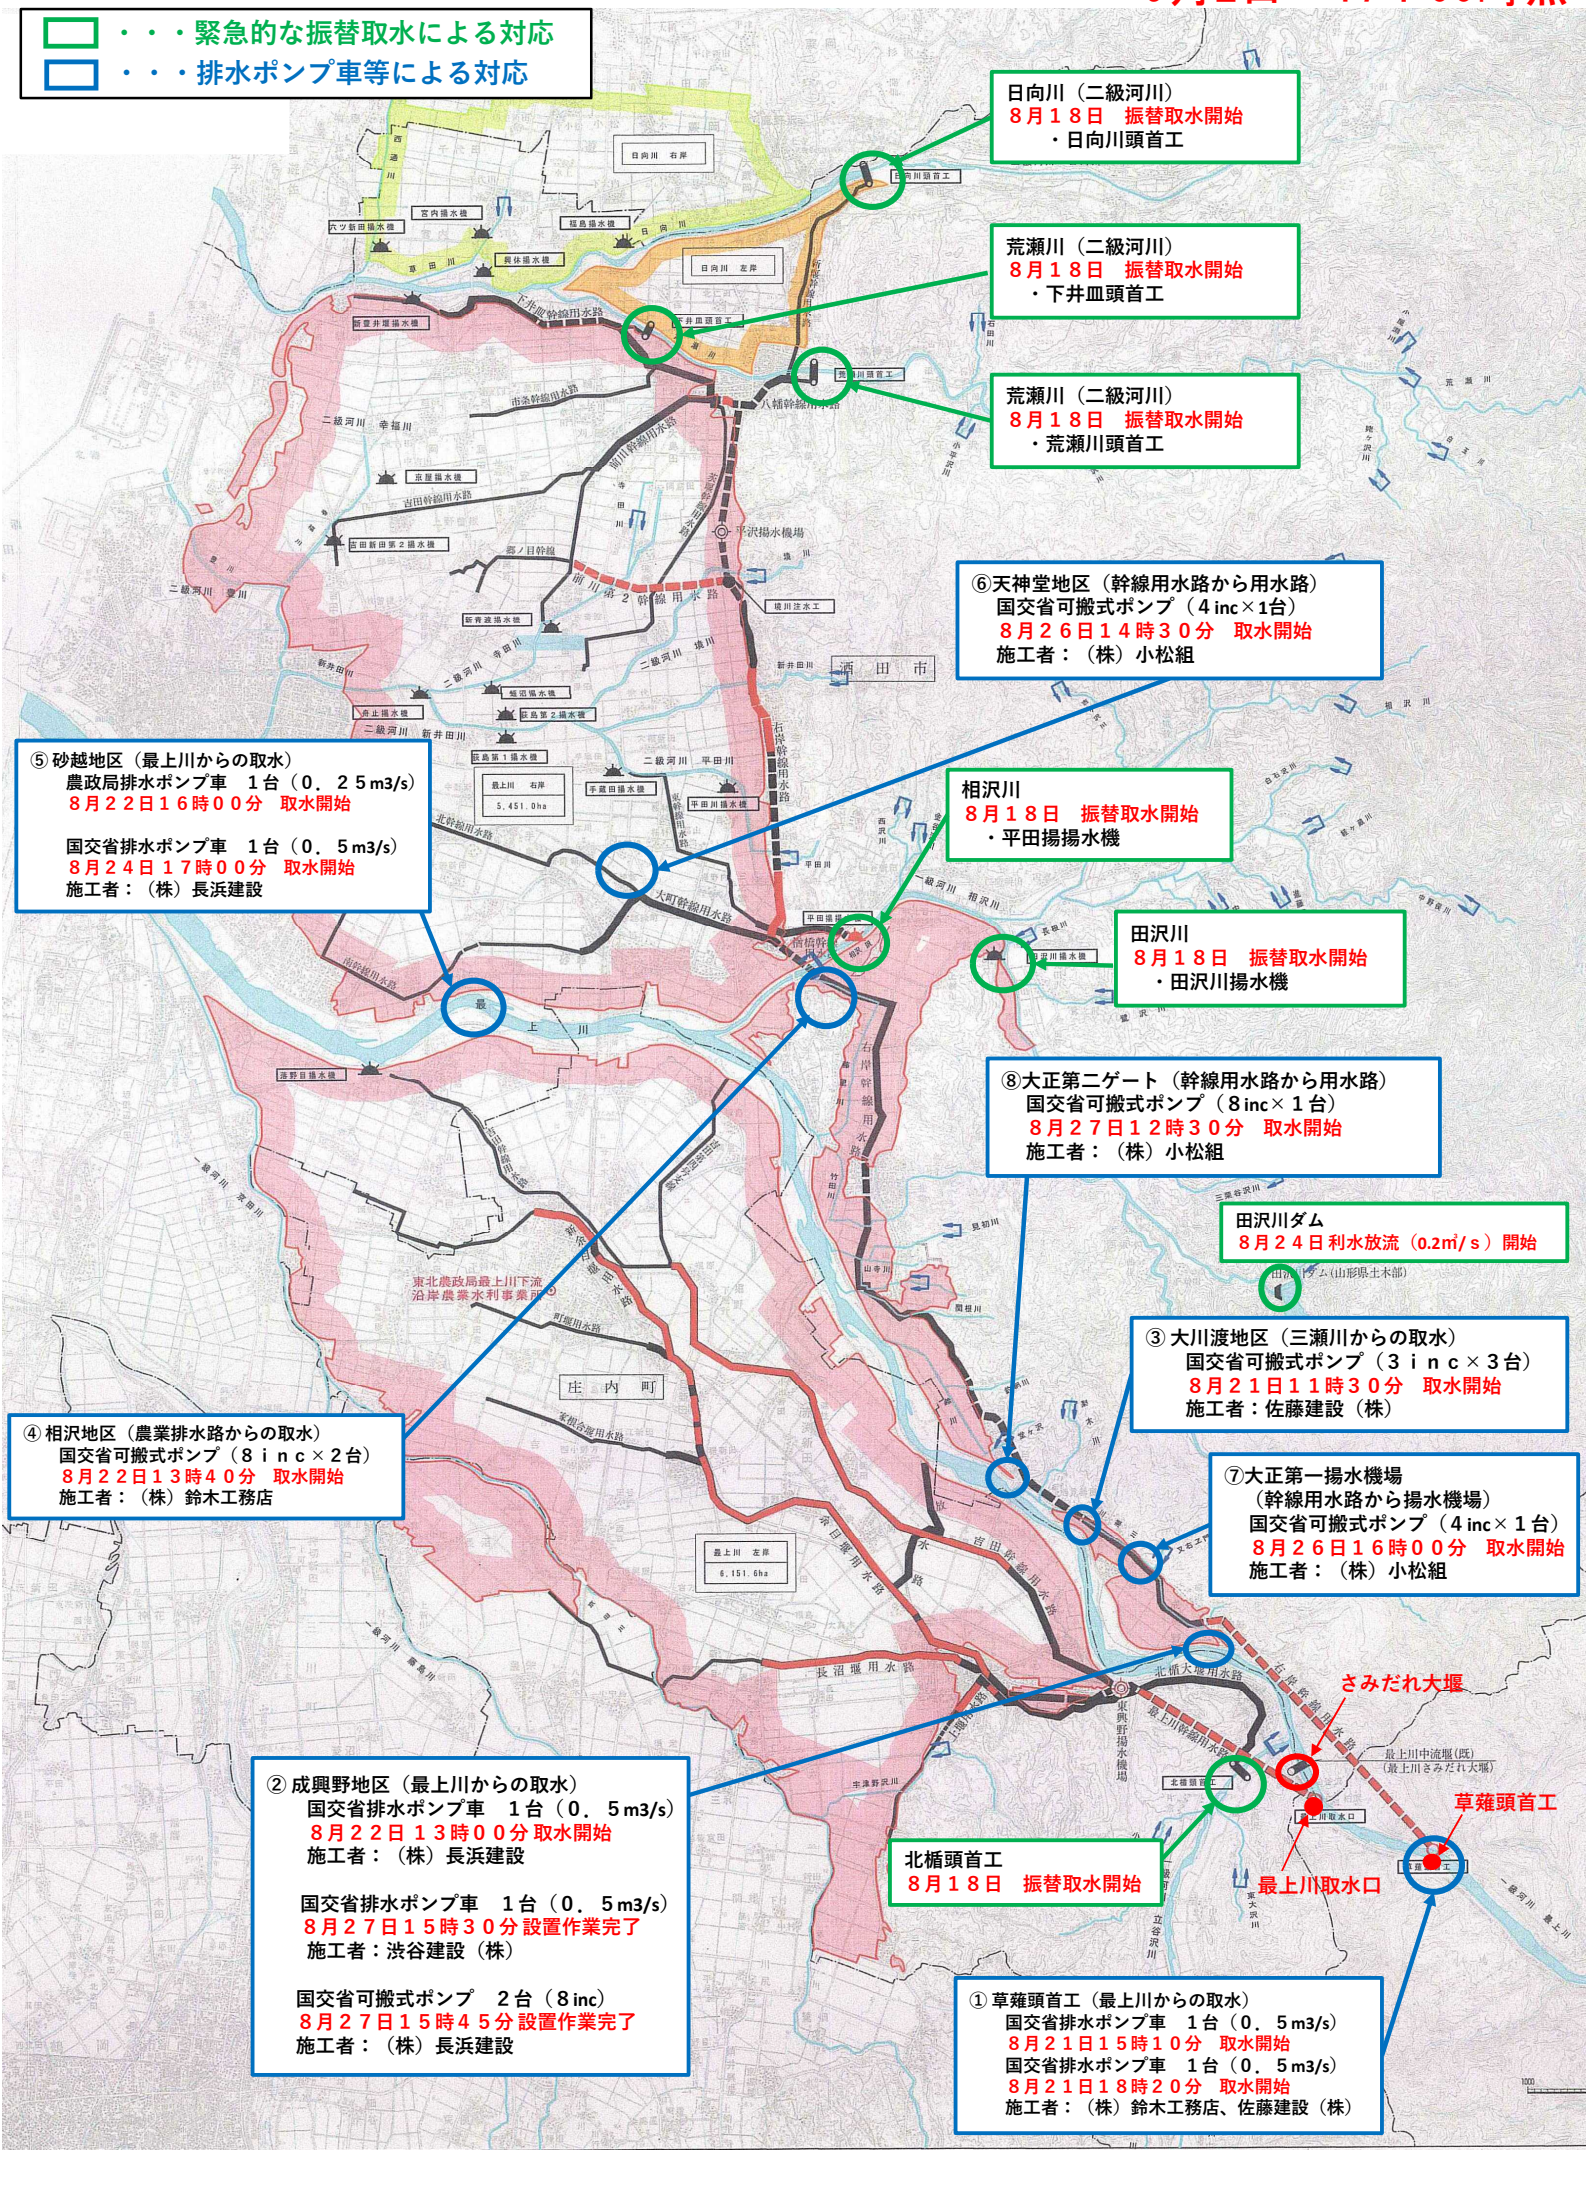


排水ポンプ車の配置・稼働状況
【場所①】 草薙頭首工 (最上川から頭首工へ取水)

・排水ポンプ車（国交省）0.5m3/s　1台　　8/21 15:10より取水開始
・排水ポンプ車（国交省）0.5m3/s　1台　　8/21 18:20より取水開始

（施工者：㈱鈴木工務店、佐藤建設㈱）





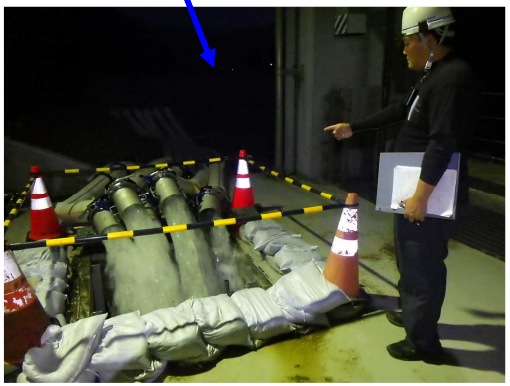



水路への放水状況(8/24(月)PM撮影)





ポンプ設置、点検状況

排水ポンプ車の配置・稼働状況
【場所②】 成興野地区 (最上川から水路へ取水)





水路への取水状況(8/23(日)AM撮影)



・排水ポンプ車(国交省) 0.5m3/s 1台
8月22日13:00から取水開始
(施工者:㈱長浜建設)





排水ポンプ車 設置・試運転状況(8/27(木)PM)




・排水ポンプ車(国交省) 0.5m3/s 1台
8月27日 15:30 設置作業完了
(施工者:渋谷建設㈱)





可搬式ポンプ 設置状況(8/27(木)PM)

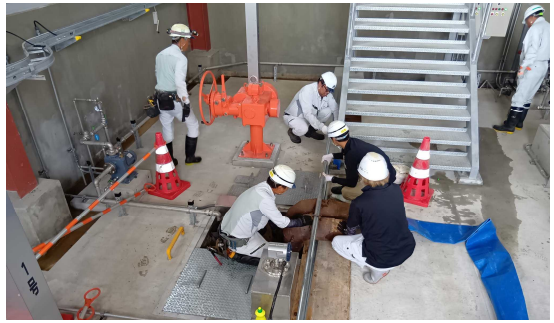

・可搬式ポンプ(国交省) 8ｲﾝﾁ 2台
8月27日 15:45 設置作業完了
(施工者:㈱長浜建設)

工事用ポンプの配置・稼働状況
【場所③】大川渡地区 （隣接する三瀬川から幹線水路への取水）





ポンプ設置作業状況



・工事用ポンプ（国交省） ３インチ３台

8/21 11:30より取水開始(施工者：佐藤建設㈱)

工事用ポンプの配置・稼働状況
【場所④】 相沢地区 （隣接する水路から幹線水路への取水）





ポンプ設置作業状況



・工事用ポンプ（国交省）８インチ１台

8/22 13:40より取水開始（施工者：㈱鈴木工務店）

※隣接水路の水量により1台/2台切換

排水ポンプ車の配置・稼働状況
【場所⑤】砂越地区 （最上川から茨野排水機場へ取水） ※国交省・農政局 合同

農政局 排水ポンプ車(0.25m3/s)
ポンプ3台(8/22 16:00より取水開始)

国交省 排水ポンプ車(0.5m3/s)
ポンプ6台(8/24 17:00より取水開始)
施工者： ㈱長浜建設









国交省・農政局
最上川取水、ホース設置状況

茨野排水機場
吐出水路



国交省・農政局 取水、水路状況(撮影：8/24 18時頃)

排水ポンプ車の配置・稼働状況
【場所⑥】天神堂地区（幹線水路から用水路へ取水）







取水後　水路状況(撮影:8/26　15時頃)



ポンプ設置作業

・工事用ポンプ（国交省）４インチ１台

8/26　14:30　取水開始（施工者：㈱小松組）

排水ポンプ車の配置・稼働状況
【場所⑦】大正第一揚水機場 （幹線水路から揚水機場へ取水）





ポンプ設置作業







取水後　水路状況(撮影:8/26　16時頃)

・工事用ポンプ（国交省）４インチ１台

8/26　16:00　取水開始（施工者：㈱小松組）

排水ポンプ車の配置・稼働状況
【場所⑧】大正第二ゲート （幹線水路から用水路へ取水）





ポンプ設置作業





取水後　水路状況(撮影:8/27　12時30分頃)

・工事用ポンプ（国交省）８インチ１台

8/27　12:30　取水開始（施工者：㈱小松組）
