
一般国道121号 湯野上バイパス 工事状況

湯野上バイパスの工事進捗状況


令和７年４月１日時点



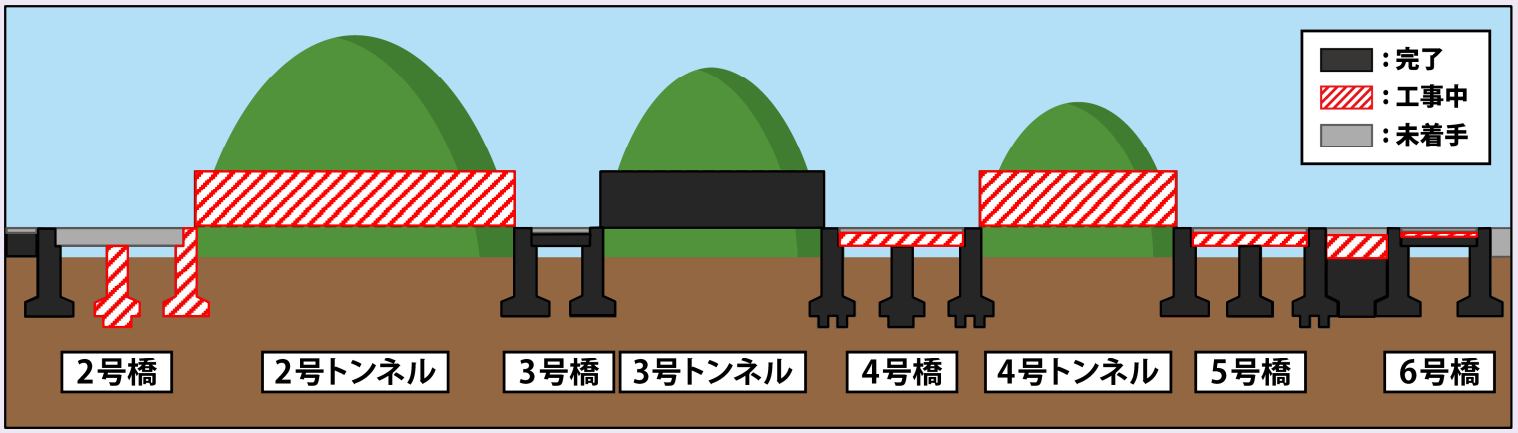

工　事　状　況

写真①（仮）２号橋付近（1）　R7. 4月



●（仮）２号橋の橋脚基礎工（大口径深礎杭）は概ね完成しました。引き続き、（仮）２号橋の橋脚や橋台の工事など（赤丸部分）を進めています。

写真②（仮）２号橋付近（2）　R6. 11月




●（仮）２号橋から小沼崎バイパス方向のＡＲ画像（３次元モデル合成画像）です。工事の施工においてもＡＲ技術の活用が広まっています。

写真③（仮）２号トンネル終点側　R6. 11月



●（仮）２号トンネル終点側の様子。掘削土排出のためのベルトコンベアを設置して工事を進めています。

写真④（仮）４号橋付近　R7. 4月

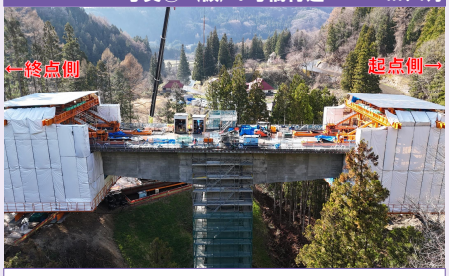

●（仮）４号橋の施工状況です。引き続き"やじろべえ方式"での上部工架設を進めています。

写真⑤ 中妻地区付近（1）　R6. 11月



●（仮）５号橋は、上部工の橋げたを工場で製作中です。夏頃には現場での架設工事が始まる見込みです。

写真⑥ 中妻地区付近（2）　R7. 4月



●（仮）５号橋から南会津側については、道路の盛土やバイパスを横断するボックスカルバートの工事などを進めています。

国土交通省 東北地方整備局 郡山国道事務所
