記者発表資料

平成２２年　９月　１日
仙台河川国道事務所

阿武隈川堤防の「キツネ穴」対策・・・その後
～引き続き地域全体で早期発見に努めます～

４月２日、５月２５日、７月６日（ともに記者発表済み）と3度にわたり、阿武隈川右岸6.0k付近（亘理町逢隈中泉字土花地先）の堤防のり面に、キツネによる穴が発見されました。

７月７日（記者発表済み）には、国土交通省仙台河川国道事務所岩沼出張所と地元亘理町の防災関係機関と対応策について打合せし、河川巡視の強化（ほぼ毎日巡視）、警告灯の設置、チラシの配布及び看板設置などの対応を行ってきたところであり、対策後の約2ヶ月間の状況を報告いたします。

なお、今後は台風期の大雨も心配されることから、引き続き河川巡視を強化し、堤防の適切な管理に努めて参ります。

国土交通省仙台河川国道事務所が管理する河川は、阿武隈川（宮城県内）、白石川、名取川、広瀬川、笊川の５河川、管理総延長は 73.5km となっております。そのうち、阿武隈川については 53.6km を管理しております。

堤防等河川管理施設の異常、変状の早期発見に努め、早急な対応を図るため、週２回の河川巡視を行っております。

台風期の大雨も心配されます。このような堤防の損傷により、洪水時に堤防の決壊などに至らないよう、継続的な河川巡視に努めて参ります。

《対策後の概要》

警告灯設置後も、キツネによる穴が合計８回（１２箇所）確認されております。ただし、河川巡視の頻度を上げていることから、いづれも早期に発見できたため、その都度埋め戻しております。

なお、警告灯を設置した箇所で、一番近接したキツネ穴との距離は、約2mでした。

専門家（八木山動物公園）に確認したところ、繁殖シーズンは過ぎているので、繁殖行動のための穴ではないとのことでありました。

また、８月３１日に吉田川においても同様の穴が確認されたとの記者発表（北上川下流河川事務所）があり、採餌のために掘った穴では？との見解でありました。今回新たに見つかっている穴も非常に類似していることから、採餌行動によるものと思われます。

今のところ抜本的な対策が無いことから、引き続き河川巡視の強化により継続監視を続けます。

《約２ヶ月間の対応と今後の方針》

①河川巡視の強化

国土交通省仙台河川国道事務所岩沼出張所の河川巡視に加え、地元の亘理町役場においても、キツネ穴が発見された約1.0km区域について引き続き巡視し、新たな穴の発見に努めています。掘りはじめの段階で発見し、穴が深くなる前に対処しています。

→地元亘理町役場及び亘理消防署の協力は、当初８月いっぱいを予定していたが、９月以降も継続します。

②警告灯の設置

工事現場で使用される夜間に点滅する警告灯をキツネ穴が発見された箇所に設置し、夜間、キツネが堤防に近づかないよう試みてきましたが、これについても引き続き継続します。

→20個設置

③チラシの配布及び看板の設置

地域の方々へのチラシ配布と付近を散歩される方々への喚起という意味から、堤防上へ簡易な看板を設置いたしました。今後も、河川巡視時等を利用し喚起を促します。

→チラシの配布：14日から町が配布（合計30枚配布）

→看板の設置 ：7月14日に2箇所設置

＜添付資料＞対応状況、キツネ穴発見位置図、巡視計画書（９月）

※発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

問い合わせ先

国土交通省　仙台河川国道事務所
仙台市太白区郡山５丁目６－６

河川管理課長　畑山（ハタヤマ）　作栄（サクエイ）　Tel（022）-248-4131

岩沼出張所長　及川（オイカワ）　輝浩（テルヒロ）　Tel（0223）-22-2801

阿武隈川キツネ穴に対する対応状況

発見状況			備　考
発見日	発見者	位置	
4月2日	岩沼出張所	①右岸5.3k(1穴) ②右岸6.0k(1穴)	●穴を開削し、確認後に埋め戻し ●7/14に警告灯3箇所／6本設置
5月25日	岩沼出張所	③右岸6.0k(1穴)	
7月6日	岩沼出張所	④右岸5.6k(1穴) ⑤右岸6.0k(7穴)	
7月7日	キツネ穴対策会議(第1回)		
7月9日	亘理消防署	⑥右岸5.5k(2穴) （堤外）	
7月13日	キツネ穴対策会議(第2回)		
7月16日	岩沼出張所	⑦右岸5.5k(1穴) ⑧右岸5.6k(2穴)	警告灯設置（2箇所／2本）
7月26日	亘理町	⑨右岸5.8k(4穴)	
8月3日	キツネ穴対策会議(第3回)		
8月9日	亘理消防署	⑩右岸5.5k(2穴) （堤外）	警告灯設置（4箇所／5本）
8月10日	岩沼出張所	⑪右岸5.9k(5穴) （堤外）	
8月16日	亘理消防署	⑫右岸5.5k(3穴)	8/25:警告灯設置(1箇所/2本)
8月20日	岩沼出張所	⑬右岸5.8k(1穴) （堤外） ⑭右岸5.6k(3穴)	8/25:警告灯設置(2箇所/2本)
8月23日	岩沼出張所	⑮右岸5.8k(1穴) ⑯右岸5.6k(1穴)	8/25:警告灯設置(2箇所/1本)
8月30日	岩沼出張所	⑰右岸5.8k(1穴) ⑱右岸6.0k(3穴) （堤外）	警告灯設置（2箇所/2本）
8月31日	キツネ穴対策会議(第4回)		

警告灯設置後

キツネ穴位置図

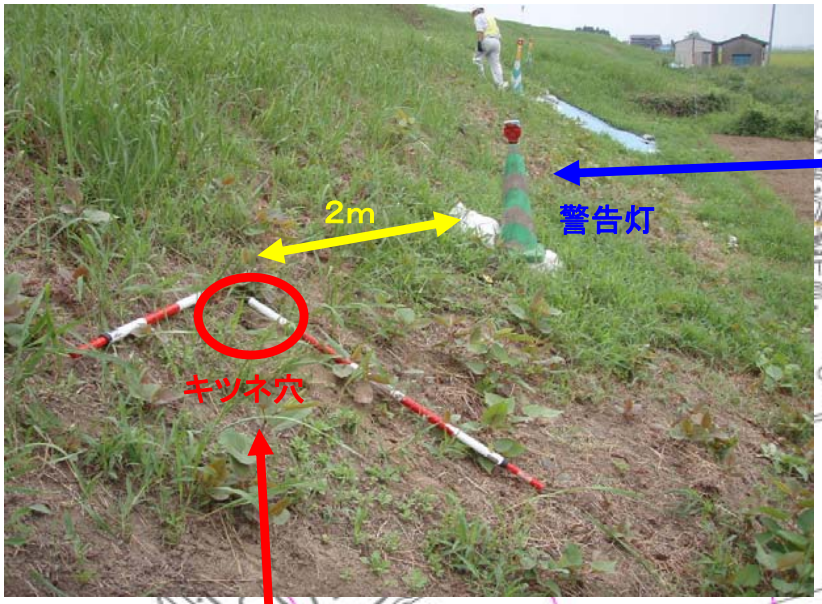





凡　例

キツネ穴発見位置 ○

警告灯設置数（青字）

阿武隈川

東部道路

8月30日
穴3

8月10日
穴5

8月20日
穴1

7月9日
穴2
8月9日
穴2

①
③
①
②
②
②
③
②
②

4月2日
穴1
5月25日
穴1
7月6日
穴7

8月23日
穴1
8月30日
穴1

7月26日
穴4

8月20日
穴3
8月23日
穴1

7月6日
穴1
7月16日
穴2

7月16日
穴1
8月16日
穴3

4月2日
穴1

別表

キ ツ ネ 穴 巡 視 計 画 書 （ ９月 ）

日	曜	巡視機関等	巡視区分	午　　前	午　　後	備　　考
1	水					
2	木	国	定常巡視	○		
3	金	亘理町			○	
4	土					
5	日					
6	月					
7	火	国	定常巡視		○	
8	水					
9	木					
10	金	国	定常巡視		○	
11	土					
12	日					
13	月	国	定常巡視	○		
14	火					
15	水					
16	木					
17	金	国	定常巡視	○		
18	土					
19	日					
20	月					
21	火	亘理町			○	
22	水	国	定常巡視		○	
23	木					
24	金	国	定常巡視		○	
25	土					
26	日					
27	月					
28	火	国	定常巡視	○		
29	水					
30	木					
