記者発表資料

平成25年9月18日
国土交通省　三春ダム管理所

三春ダム洪水調節効果（速報）について

－　台風18号　出水における三春ダム調節効果－

三春ダムでは、今回の 台風18号 による降雨に伴い、 9月15日　12時40分 から洪水警戒体制を設置して洪水調節を実施し　約 1,800 千立方メートルの水をダムに貯め込みました。

ダムに、最も多くの水が流れ込んだ最大流入量時には 毎秒　201 立方メートルのうち、毎秒　　101　　立方メートルをダムに貯め込みました。

今回の洪水調節で、ダム下流の赤沼水位観測所にて 約 90　cm の水位低減効果が図られたと考えられます。　（郡山市中田町大字高倉字倉屋敷　地内）

※数値は速報値で、後日修正する可能性があります。

別添資料・・・・・ 台風18号 における三春ダム洪水調節効果

【発表記者会　郡山記者クラブ】

【問い合わせ先】
国土交通省　東北地方整備局　三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403－4
電　話　　0247－62－3145
ＦＡＸ　　0247－62－3170
所　　長　　小山（おやま）　幸男（ゆきお）（内線201）
管理係長　　大柳（おおやなぎ）　博昭（ひろあき）（内線332）

台風18号 における三春ダム調節効果

流 域 内 降 雨 状 況

※速報値のため今後の調査により数値が変わる場合があります。



台風18号 における三春ダム洪水調節状況

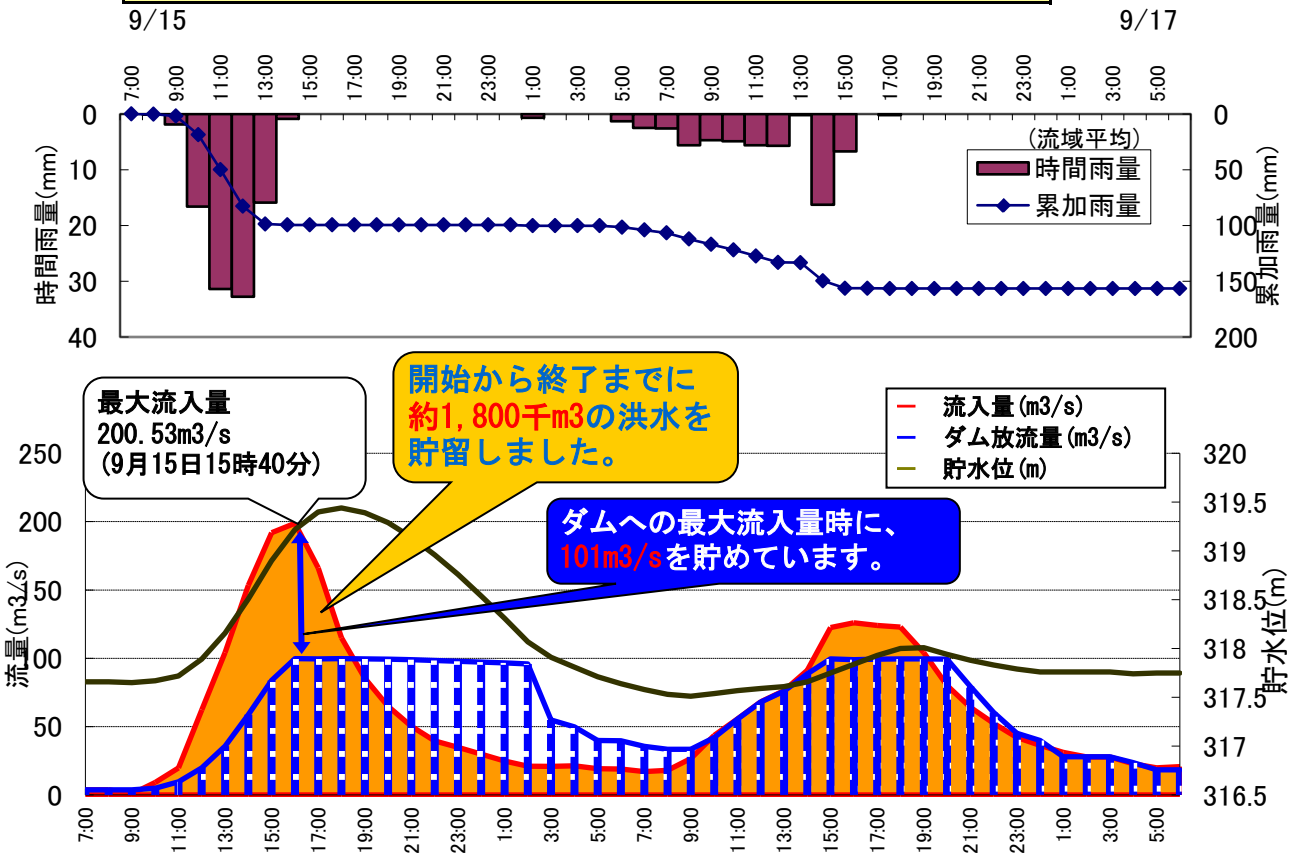

貯 水 池 貯 留 状 況

洪水調節前



調節前水位： 318.17 m
（9月15日）

洪水調節後

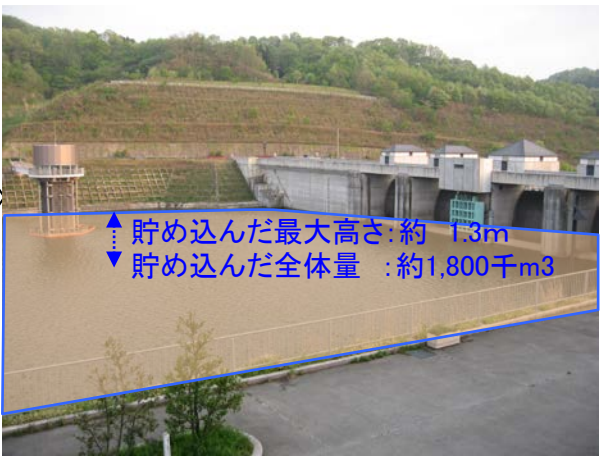

（9月15日） 調節時最高水位： 319.43 m
貯め込んだ最大高さ： 約 1.3 m
貯め込んだ全体量： 約 1,800 千m3

三春ダムの洪水調節効果（赤沼地点）

