記者発表資料

平成２７年４月２３日
国土交通省郡山国道事務所

西郷村、泉崎村における国道４号の道路除染が終了しました

～歩道部空間線量率（高さ 50cm）は、０．１５μSv/h 以下（平均値）に低減～

郡山国道事務所では、西郷村及び泉崎村内の国道４号延長約９．０ｋｍ（西郷村５．２ｋｍ、泉崎村３．８ｋｍ）について、平成２６年９月１日より両村がそれぞれ策定した「除染実施計画」に基づき除染を実施してきました。

このたび西郷村及び泉崎村の国道４号の道路除染が終了しましたので、その結果をお知らせします。

１．除染の結果

事前モニタリング調査では、国道４号の歩道高さ５０ｃｍの空間線量率の最大計測値は、【西郷村；０．６６μSv/h】【泉崎村；０．４７μSv/h】となっていました。

今回の除染により、それぞれ０．１８μSv/h、０．１６μSv/h に低減したとともに平均値で０．１５μSv/h 以下となりました。

また、線量が高かった側溝や排水桝は、平均で０．１０μSv/h 以下となりました。

【西郷村】

線量率の単位：μSv/h

歩道部の測定項目		除染前	除染後	低減率※１
①歩道部・表面線量率(1cm) 遮へい体あり	最大値 (平均値)	１．１７ （０．１６）	→　０．１９ （０．１１）	８４% （３０%）
②歩道部・空間線量率(50cm)	最大値 (平均値)	０．６６ （０．２１）	→　０．１８ （０．１５）	７３% （２９%）
③歩道部・空間線量率(1m)	最大値 (平均値)	０．４６ （０．２０）	→　０．２２ （０．１６）	５２% （２２%）

【泉崎村】

線量率の単位：μSv/h

歩道部の測定項目		除染前	除染後	低減率※１
①歩道部・表面線量率(1cm) 遮へい体あり	最大値 (平均値)	１．２０ （０．１４）	→　０．１０ （０．０９）	９２% （３１%）
②歩道部・空間線量率(50cm)	最大値 (平均値)	０．４７ （０．１８）	→　０．１６ （０．１３）	６６% （２６%）
③歩道部・空間線量率(1m)	最大値 (平均値)	０．５０ （０．１８）	→　０．１８ （０．１６）	６４% （１２%）

（放射線量測定箇所）

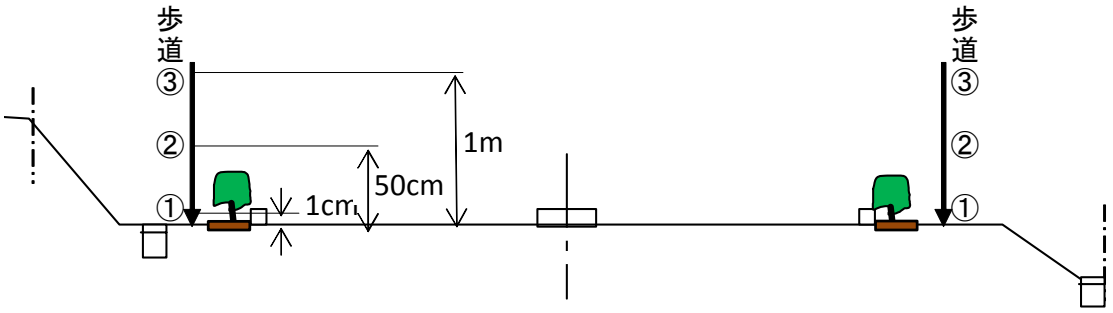

※歩道高さ５０ｃｍ（幼児・低学年児童の生活空間の場合）の空間線量率が０．２３μSv/h 以上の場合に除染を行うこととしています。
また、側溝等局所的に線量の高い場合は堆積物除去等の措置を講じました。

２．除染の実施内容

具体的に次の工事を実施しました。

・車道、歩道、側溝：堆積物除去

・植　樹　帯　　：表土入れ替え

$$※１\quad 低減率［\%］＝\left(1－\frac{除染後の放射線量}{除染前の放射線量}\right)×１００$$

《発表記者会：郡山記者クラブ、白河記者クラブ》

問い合わせ先
国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所 技術副所長　　舟山義広（ふなやまよしひろ）内線２０５ 保全対策官　　渡部健彦（わたなべたけひこ）内線４０１ 郡山市安積町荒井字丈部内２８－１ ＴＥＬ．０２４（９４６）０３３３（代表）

国道4号 西郷地区・泉崎地区道路除染実施箇所

別　紙



至　郡山市
矢吹
矢吹村役場
矢吹I.C
矢吹中央I.C
やぶき
矢吹町
あぶくま高原道路
泉崎地区
泉崎村
泉崎村役場
泉崎
東北新幹線
東北自動車道
阿武隈P.A
なかじま
中島村
泉川
阿武隈川
西郷村
西郷村役場
白河中央スマートI.C
谷津田川
東北本線
久田野
白河
新白河
白河市役所
しらかわ
白河市
福島県
白河I.C
南湖
西郷地区
栃木県
至　那須町
289
294

国道4号の除染実施区間

泉崎地区
●西白河郡泉崎村大字踏瀬地内～泉崎村大字太田川地内
L=3.8Km

西郷地区
●西白河郡西郷村大字小田倉地内
L=5.2Km

■放射線量測定結果一覧（国道4号　西郷地区）

測定No.	空間線量率（高さ1m）				空間線量率（高さ50cm）								表面線量率（表面1cm、遮へい体有り）																							
	下り		上り		下り				上り				下り												上り											
	歩道		歩道		歩道		路肩		路肩		歩道		法面		側溝		歩道		植樹帯		路肩		車道		車道		路肩		植樹帯		歩道		側溝		法面	
	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後
0							0.13	0.14	0.16	0.11																												
1							0.15	0.13	0.14	0.14																												
2							0.14	0.14	0.15	0.12																												
3							0.39	0.14	0.32	0.28			0.27	0.27							0.10	0.10	0.21		0.15		0.13	0.12							0.25	0.25
4							0.36	0.31	0.40	0.21																												
5							0.32	0.27	0.38	0.30																												
6							0.34	0.27	0.46	0.35																												
7							0.37	0.31	0.44	0.34																												
8							0.36	0.31	0.46	0.38			0.23	0.21							0.14	0.13	0.13		0.19		0.16	0.15					0.07	0.07	0.25	0.25
9							0.27	0.26	0.44	0.41																												
10							0.37	0.31	0.55	0.35																												
11							0.36	0.32	0.51	0.48																												
12							0.18	0.30	0.49	0.38																												
13							0.35	0.31	0.43	0.41			0.28	0.28							0.11	0.11	0.13		0.17		0.14	0.13							0.33	0.32
14							0.22	0.21	0.45	0.33																												
15							0.37	0.31	0.34	0.28																												
16							0.35	0.31	0.68	0.57																												
17							0.46	0.42	0.30	0.18																												
18							0.29	0.32	0.19	0.15			0.32	0.31							0.15	0.10	0.28	0.17	0.14		0.08	0.06					0.07			
19							0.25	0.32	0.24	0.20																												
20							0.44	0.37	0.22	0.19																												
21							0.39	0.25	0.28	0.24																												
22							0.45	0.38	0.29	0.21																												
23							0.23	0.21	0.34	0.21											0.16	0.15	0.15		0.14		0.13	0.12					0.16		0.16	0.16
24							0.32	0.34	0.38	0.37																												
25							0.38	0.39	0.35	0.21																												
26							0.44	0.35	0.31	0.23																												
27							0.36	0.39	0.29	0.21																												
28							0.38	0.38	0.29	0.24			0.32	0.33							0.20	0.16	0.18		0.17		0.13	0.12					0.13		0.18	0.18
29							0.31	0.23	0.25	0.19																												
30							0.37	0.18	0.25	0.18																												
31							0.38	0.17	0.25	0.13																												
32							0.30	0.15	0.26	0.17																												
33							0.24	0.23	0.27	0.18											0.18	0.15	0.15		0.15		0.16	0.15					0.19			
34							0.22	0.21	0.36	0.30																												
35							0.38	0.36	0.38	0.31																												
36							0.32	0.31	0.29	0.23																												
37							0.41	0.31	0.37	0.32																												
38							0.40	0.37	0.26	0.29			0.32	0.25							0.24	0.14	0.21		0.22		0.18	0.10							0.24	0.23
39							0.38	0.33	0.26	0.15																												
40							0.34	0.30	0.21	0.14																												
41							0.29	0.28	0.27	0.21																												
42							0.35	0.31	0.32	0.21																												
43							0.35	0.33	0.32	0.20			0.23	0.22							0.13	0.13	0.13		0.15		0.16	0.13							0.23	0.22
44							0.52	0.38	0.21	0.15																												
45							0.38	0.34	0.19	0.16																												
46							0.15	0.15	0.21	0.16																												
47							0.14	0.13	0.19	0.17																												
48	0.20	0.19	0.17	0.14	0.22	0.15					0.17	0.17					0.12	0.11			0.10	0.10	0.15		0.14		0.15	0.14			0.15	0.09				
48+10																	0.24	0.10			0.40	0.15					0.23	0.11			0.32	0.09				
49	0.21	0.15	0.29	0.15	0.22	0.15					0.29	0.17					0.10	0.10													0.17	0.12				
50	0.14	0.11	0.29	0.20	0.15	0.13					0.30	0.20					0.09	0.08													0.18	0.18				
51	0.13	0.12	0.28	0.16	0.12	0.12					0.29	0.17					0.09	0.08													0.16	0.11				
52	0.15	0.12	0.26	0.14	0.15	0.11					0.27	0.15					0.10	0.09													0.14	0.13				
53	0.13	0.11	0.17	0.10	0.14	0.14					0.17	0.11					0.10	0.09			0.11	0.10	0.09		0.09		0.11	0.11			0.12	0.11	0.12	0.07		
54	0.14	0.12	0.16	0.11	0.16	0.13					0.15	0.12					0.09	0.09													0.12	0.11				

■放射線量測定結果一覧（国道4号　西郷地区）

測定No.	空間線量率（高さ1m）				空間線量率（高さ50cm）								表面線量率（表面1cm、遮へい体有り）																					
	下り		上り		下り				上り				下り												上り									
	歩道		歩道		歩道		路肩		路肩		歩道		法面		側溝		歩道		植樹帯		路肩		車道		車道		路肩		植樹帯		歩道		側溝		法面	
	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後
55	0.16	0.16	0.17	0.13	0.17	0.15					0.18	0.14					0.10	0.10													0.13	0.11				
56	0.15	0.13	0.14	0.12	0.17	0.14					0.16	0.11					0.12	0.10													0.11	0.10				
57	0.16	0.12	0.16	0.13	0.15	0.12					0.17	0.12					0.13	0.09													0.12	0.10				
58	0.11	0.11	0.14	0.13	0.11	0.13					0.15	0.13			0.21	0.08	0.06	0.05			0.10	0.10	0.11		0.13		0.11	0.10			0.10	0.09	0.39	0.08		
58+10																	0.71	0.08			0.24	0.09														
59	0.17	0.15	0.19	0.16	0.15	0.13					0.19	0.16					0.12	0.11													0.14	0.10				
59+10																															0.32	0.11				
60	0.15	0.13	0.18	0.14	0.19	0.13					0.20	0.13					0.15	0.11													0.13	0.12				
61	0.15	0.13	0.19	0.15	0.16	0.12					0.20	0.18					0.11	0.11													0.10	0.10				
62	0.24	0.17	0.22	0.17	0.24	0.16					0.24	0.16					0.14	0.11													0.15	0.12				
63	0.20	0.16	0.24	0.15	0.24	0.16					0.24	0.16					0.13	0.10			0.11	0.10	0.14		0.13		0.13	0.12			0.14	0.13	0.25	0.08	0.28	0.25
64	0.22	0.15	0.16	0.13	0.24	0.19					0.18	0.13					0.13	0.11													0.15	0.10				
65	0.21	0.17	0.18	0.17	0.22	0.19					0.18	0.17					0.15	0.12													0.14	0.13				
66	0.23	0.19	0.19	0.18	0.24	0.18					0.21	0.19					0.17	0.11													0.16	0.12				
67	0.23	0.14	0.23	0.19	0.21	0.15					0.23	0.18					0.15	0.10													0.13	0.13				
68	0.16	0.16	0.24	0.20	0.18	0.15					0.26	0.16					0.14	0.11			0.15	0.10	0.13		0.18		0.12	0.09			0.12	0.11			0.25	0.21
69	0.15	0.15	0.26	0.16	0.19	0.18					0.26	0.16					0.18	0.11													0.13	0.11				
69+10																					2.43	0.16														
70	0.20	0.15	0.28	0.20	0.21	0.16					0.28	0.19					0.12	0.10													0.15	0.09				
70+10																	0.26	0.10																		
71	0.22	0.15	0.31	0.24	0.17	0.17					0.31	0.16					0.50	0.09													0.13	0.11				
72	0.17	0.17	0.21	0.16	0.18	0.17					0.23	0.14					0.15	0.10													0.11	0.09				
73	0.22	0.15	0.29	0.21	0.20	0.16					0.29	0.19					0.15	0.11			0.13	0.10	0.14		0.18		0.13	0.11			0.15	0.11	0.14		0.22	0.16
74	0.20	0.20	0.33	0.25	0.23	0.18					0.32	0.21					0.17	0.13													0.14	0.11				
75	0.25	0.18	0.30	0.26	0.26	0.20					0.33	0.20					0.16	0.15													0.16	0.12				
76	0.24	0.24	0.32	0.25	0.29	0.26					0.33	0.22					0.18	0.18													0.13	0.12				
77	0.24	0.21	0.29	0.26	0.24	0.21					0.30	0.21					0.18	0.16													0.12	0.10				
78	0.23	0.20	0.23	0.12	0.22	0.19					0.23	0.11	0.31	0.27	0.14	0.09	0.19	0.16			0.18	0.09	0.18		0.14		0.16	0.08			0.12	0.06			0.25	0.07
79	0.21	0.16	0.21	0.18	0.20	0.16					0.23	0.18					0.15	0.13													0.15	0.12				
80	0.19	0.18	0.23	0.21	0.20	0.16					0.23	0.19					0.13	0.12													0.13	0.12				
81	0.15	0.15	0.19	0.19	0.16	0.15					0.20	0.16					0.15	0.13													0.13	0.12				
82	0.15	0.15	0.20	0.17	0.17	0.16					0.20	0.14					0.14	0.11													0.12	0.11				
83	0.19	0.17	0.20	0.19	0.19	0.18					0.20	0.16	0.15	0.15	0.10		0.13	0.11			0.10	0.10	0.15		0.13		0.12	0.10			0.11	0.10			0.24	0.13
83+10																					0.31	0.16					0.23	0.12								
84	0.18	0.15	0.21	0.20	0.20	0.14					0.22	0.16					0.13	0.12													0.13	0.12				
85	0.18	0.17	0.20	0.19	0.21	0.16					0.21	0.15					0.13	0.12													0.12	0.11				
86	0.22	0.18	0.21	0.18	0.18	0.16					0.21	0.13					0.12	0.12													0.12	0.11				
87	0.13	0.13	0.19	0.16	0.15	0.14					0.19	0.15					0.13	0.13													0.13	0.10				
88	0.14	0.15	0.20	0.19	0.16	0.14					0.20	0.16					0.10	0.10			0.11	0.10	0.12		0.13		0.12	0.12			0.13	0.12	0.45	0.09		
88+10																											0.87	0.16			0.63	0.13				
89	0.21	0.17	0.23	0.20	0.22	0.15					0.22	0.17					0.15	0.13													0.14	0.11				
89+10																	0.33	0.19																		
90	0.18	0.16	0.19	0.17	0.20	0.16					0.20	0.17					0.60	0.13													0.13	0.11				
91	0.23	0.16	0.21	0.20	0.22	0.15					0.21	0.18					0.18	0.15													0.13	0.12				
92	0.28	0.16	0.28	0.23	0.20	0.15					0.29	0.20					0.14	0.12													0.17	0.16				
92+10																					0.42	0.10														
93	0.14	0.12	0.25	0.21	0.15	0.15					0.25	0.17					0.07	0.07			0.09	0.09	0.12		0.12		0.14	0.13			0.13	0.12	0.43	0.12	0.30	0.29
94	0.21	0.16	0.23	0.18	0.20	0.16					0.24	0.16					0.13	0.09													0.14	0.11				
95	0.25	0.15	0.20	0.19	0.21	0.16					0.22	0.17					0.17	0.09													0.14	0.10				
96	0.31	0.26	0.21	0.17	0.33	0.19					0.22	0.17					0.23	0.14													0.15	0.14				
97	0.45	0.18	0.22	0.21	0.66	0.18					0.22	0.15					0.93	0.12													0.15	0.11				
98	0.14	0.12	0.17	0.16	0.13	0.11					0.17	0.14			0.21		0.12	0.10	0.6		0.12	0.11	0.14		0.15		0.11	0.10			0.10	0.09	0.35	0.09		
98+10																	0.34	0.16			0.64	0.21					0.30	0.08			0.57	0.16				
99	0.15	0.12	0.22	0.20	0.14	0.12					0.21	0.19					0.08	0.08													0.18	0.17				
100	0.16	0.13	0.14	0.13	0.18	0.14					0.15	0.14					0.14	0.10													0.10	0.10				
101	0.25	0.18	0.17	0.15	0.23	0.13					0.17	0.17					0.14	0.12													0.14	0.12				

■放射線量測定結果一覧（国道4号　西郷地区）

測定No.	空間線量率（高さ1m）				空間線量率（高さ50cm）								表面線量率（表面1cm、遮へい体有り）																							
	下り		上り		下り				上り				下り												上り											
	歩道		歩道		歩道		路肩		路肩		歩道		法面		側溝		歩道		植樹帯		路肩		車道		車道		路肩		植樹帯		歩道		側溝		法面	
	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後
102	0.24	0.22	0.18	0.18	0.22	0.13					0.18	0.17					0.12	0.12													0.13	0.10				
103	0.23	0.19	0.21	0.20	0.26	0.18					0.20	0.17			0.20		0.15	0.11	0s		0.12	0.12	0.13		0.14		0.10	0.09			0.07	0.07	0.10	0.08		
103+10																											0.53	0.15			0.30	0.13				
104	0.21	0.19	0.20	0.19	0.23	0.19					0.21	0.16					0.14	0.12													0.12	0.09				
105	0.18	0.15	0.20	0.19	0.19	0.16					0.21	0.18					0.14	0.11													0.10	0.09				
106	0.25	0.18	0.26	0.18	0.22	0.18					0.26	0.15					0.12	0.11													0.13	0.10				
107	0.21	0.19	0.21	0.18	0.20	0.18					0.22	0.16					0.13	0.11													0.13	0.11				
108	0.22	0.19	0.23	0.21	0.21	0.19					0.24	0.18					0.12	0.11			0.11	0.10	0.12		0.13		0.12	0.11			0.13	0.12	0.15	0.08	0.27	0.14
108+10																	0.41	0.15			0.67	0.17														
109	0.15	0.14	0.30	0.24	0.16	0.14					0.29	0.20					0.13	0.10													0.16	0.14				
110	0.20	0.18	0.27	0.21	0.21	0.16					0.27	0.20					0.13	0.11													0.14	0.10				
111	0.17	0.15	0.26	0.19	0.15	0.16					0.27	0.17					0.14	0.12													0.14	0.12				
112	0.18	0.15	0.24	0.18	0.18	0.15					0.25	0.16					0.15	0.13													0.15	0.12				
113	0.32	0.22	0.24	0.18	0.36	0.19					0.24	0.14	0.26	0.23	0.75	0.09	0.32	0.22			0.12	0.10	0.13		0.14		0.18	0.15			0.18	0.14			0.24	0.23
114	0.31	0.22	0.18	0.17	0.34	0.18					0.20	0.15					0.14	0.14													0.13	0.09				
114+10																											0.50	0.14			0.71	0.15				
115	0.26	0.22	0.18	0.17	0.25	0.18					0.18	0.16					0.16	0.15													0.13	0.13				
116	0.25	0.21	0.21	0.18	0.26	0.18					0.21	0.14					0.11	0.11													0.13	0.11				
117	0.31	0.20	0.18	0.16	0.28	0.15					0.20	0.13					0.12	0.12													0.12	0.11				
118	0.17	0.16	0.19	0.17	0.17	0.16					0.18	0.15					0.11	0.05			0.08	0.07	0.09		0.09		0.09	0.09			0.09	0.08				
119			0.18	0.17			0.23	0.16			0.20	0.12																			0.11	0.10				
120			0.19	0.18			0.24	0.16			0.19	0.16																			0.10	0.10				
121			0.20	0.19			0.23	0.15			0.21	0.14																			0.15	0.11				
122	0.15	0.14	0.19	0.19	0.13	0.14					0.21	0.13					0.10	0.09													0.13	0.10				
123	0.25	0.15	0.23	0.19	0.26	0.16					0.22	0.11					0.24	0.19			0.14	0.14	0.15		0.11		0.14	0.13			0.15	0.13				
123+10																											0.24	0.11			0.90	0.10				
124	0.26	0.16	0.22	0.19	0.28	0.13					0.22	0.14					0.13	0.10													0.11	0.09				
125	0.18	0.16	0.20	0.11	0.16	0.11					0.21	0.13					0.11	0.10													0.11	0.09				
126	0.17	0.15	0.17	0.13	0.16	0.12					0.17	0.13					0.10	0.10													0.12	0.12				
127	0.15	0.13	0.21	0.14	0.14	0.12					0.22	0.12					0.10	0.10													0.11	0.11				
128	0.18	0.13	0.21	0.14	0.19	0.12					0.21	0.14					0.12	0.12			0.15	0.11	0.11		0.11		0.13	0.11			0.11	0.11				
128+10																	0.24	0.09			0.38	0.09														
129	0.21	0.18	0.17	0.10	0.22	0.10					0.17	0.12					0.15	0.14													0.13	0.10				
130	0.16	0.15	0.16	0.12	0.17	0.15					0.16	0.12					0.12	0.12													0.10	0.10				
131	0.19	0.12	0.15	0.12	0.17	0.14					0.15	0.11					0.13	0.12													0.09	0.09				
132	0.16	0.13	0.17	0.13	0.18	0.13					0.18	0.12					0.12	0.12													0.12	0.11				
133	0.17	0.13	0.19	0.12	0.21	0.15					0.21	0.13					0.15	0.13			0.15	0.13	0.12		0.13		0.14	0.11			0.11	0.11				
133+10																											0.46	0.08			0.24	0.16				
134	0.14	0.13	0.15	0.12	0.17	0.13					0.16	0.11					0.12	0.12													0.12	0.11				
135	0.12	0.12	0.16	0.13	0.14	0.09					0.16	0.12					0.13	0.07													0.10	0.10				
136	0.24	0.14	0.18	0.11	0.21	0.12					0.19	0.11					0.12	0.12													0.13	0.11				
137	0.18	0.12	0.23	0.11	0.20	0.12					0.23	0.10					0.15	0.10													0.10	0.10				
137+10																	0.27	0.08			0.63	0.08														
138	0.19	0.15	0.21	0.12	0.18	0.13					0.21	0.10					0.08	0.04			0.12	0.10	0.07		0.15		0.12	0.11			0.11	0.10				
139	0.17	0.13	0.24	0.11	0.19	0.13					0.25	0.11					0.14	0.09													0.12	0.10				
140	0.22	0.16	0.24	0.11	0.21	0.15					0.25	0.11					0.15	0.11													0.15	0.10				
141	0.19	0.16	0.19	0.13	0.17	0.16					0.20	0.12					0.13	0.11													0.14	0.11				
142	0.17	0.15	0.21	0.16	0.16	0.13					0.22	0.17					0.13	0.10													0.12	0.12				
143	0.20	0.13	0.17	0.10	0.17	0.14					0.18	0.13					0.14	0.11			0.14	0.11	0.13		0.19		0.12	0.11			0.13	0.08				
144	0.14	0.13	0.18	0.16	0.13	0.12					0.19	0.14					0.12	0.11													0.12	0.11				
144+10																											0.47	0.09			0.31	0.12				
145	0.15	0.11	0.18	0.16	0.15	0.12					0.17	0.16					0.11	0.10													0.13	0.11				
146	0.16	0.12			0.14	0.14			0.59	0.19							0.21	0.10																		
147	0.15	0.13			0.14	0.14			0.42	0.20							0.25	0.11																		
148	0.35	0.17	0.38	0.21	0.42	0.10					0.40	0.19					0.39	0.14			0.19	0.11	0.18		0.14		0.13	0.13			0.46	0.14				
149			0.46	0.22			0.35	0.20			0.45	0.19																			0.22	0.11				

■放射線量測定結果一覧（国道4号　西郷地区）

測定No.	空間線量率（高さ1m）				空間線量率（高さ50cm）								表面線量率（表面1cm、遮へい体有り）																							
	下り		上り		下り				上り				下り												上り											
	歩道		歩道		歩道		路肩		路肩		歩道		法面		側溝		歩道		植樹帯		路肩		車道		車道		路肩		植樹帯		歩道		側溝		法面	
	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後
150	0.31	0.19			0.29	0.17			0.41	0.19							0.14	0.12																		
151	0.33	0.18			0.32	0.17			0.43	0.18							0.15	0.11																		
152	0.30	0.18	0.37	0.25	0.32	0.17					0.40	0.21					0.14	0.14													0.26	0.16				
153	0.42	0.24	0.13	0.13	0.43	0.20					0.14	0.11					0.11	0.11			0.11	0.09	0.11		0.15		0.16	0.11			0.29	0.11				
154	0.20	0.20	0.21	0.14	0.21	0.19					0.19	0.15					0.16	0.16													0.09	0.09				
155	0.14	0.12	0.26	0.14	0.15	0.16					0.26	0.14					0.15	0.12													0.11	0.10				
156	0.20	0.17	0.13	0.09	0.21	0.16					0.14	0.13					0.08	0.08													0.12	0.11				
157	0.18	0.12	0.28	0.16	0.17	0.12					0.28	0.18					0.14	0.12													0.11	0.11				
158	0.16	0.15	0.13	0.12	0.17	0.13					0.14	0.11					0.06	0.06			0.12	0.12	0.10		0.11		0.14	0.12			0.10	0.09				
158+10																	0.31	0.12			0.28	0.08														
159	0.14	0.11	0.21	0.13	0.15	0.10					0.23	0.13					0.12	0.10													0.10	0.10				
160	0.15	0.11	0.26	0.20	0.14	0.13					0.26	0.19					0.14	0.10													0.10	0.10				
161	0.16	0.12	0.25	0.19	0.15	0.13					0.26	0.19					0.13	0.12													0.14	0.12				
162	0.18	0.12	0.14	0.09	0.17	0.12					0.15	0.12					0.09	0.09													0.09	0.09				
163	0.17	0.12	0.14	0.12	0.18	0.13					0.14	0.12					0.09	0.09			0.11	0.09	0.13		0.15		0.13	0.12			0.14	0.10				
164	0.13	0.10	0.13	0.15	0.14	0.13					0.13	0.15					0.11	0.09													0.12	0.09				
165	0.12	0.10	0.18	0.17	0.13	0.12					0.18	0.16					0.12	0.09													0.17	0.11				
166	0.14	0.13	0.18	0.18	0.15	0.12					0.18	0.14					0.12	0.11													0.18	0.12				
167	0.16	0.13	0.18	0.18	0.15	0.13					0.19	0.16					0.15	0.11													0.17	0.10				
168	0.20	0.15	0.20	0.19	0.19	0.13					0.20	0.15	0.26	0.26	0.14		0.13	0.12	0.25	0.10	0.12	0.08	0.13		0.15		0.12	0.10			0.14	0.13	0.24	0.08		
168+10																	0.54	0.09			0.64	0.09					0.29	0.14			0.45	0.18				
169	0.21	0.15	0.25	0.18	0.20	0.12					0.26	0.15					0.13	0.11													0.07	0.07				
170	0.23	0.17	0.23	0.22	0.22	0.15					0.25	0.16					0.13	0.12													0.13	0.12				
171	0.17	0.17	0.18	0.15	0.16	0.16					0.18	0.16					0.12	0.12													0.12	0.12				
172	0.19	0.12	0.16	0.14	0.18	0.14					0.16	0.13					0.13	0.11													0.11	0.10				
173	0.18	0.12	0.20	0.14	0.19	0.13					0.21	0.13			0.13	0.09	0.13	0.12	0.45	0.13	0.13	0.10	0.14		0.14		0.16	0.08	0.36	0.17	0.12	0.11				
174	0.17	0.11	0.18	0.16	0.16	0.13					0.18	0.14					0.13	0.09													0.14	0.12				
175	0.15	0.14	0.19	0.14	0.18	0.14					0.20	0.15					0.12	0.10													0.13	0.12				
176	0.17	0.14	0.22	0.17	0.17	0.14					0.22	0.16					0.15	0.09													0.14	0.13				
177	0.15	0.12	0.18	0.19	0.14	0.13					0.19	0.16					0.13	0.06													0.11	0.11				
178	0.17	0.11	0.20	0.13	0.17	0.13					0.20	0.15			0.40	0.09	0.10	0.08	0.31	0.09	0.08	0.07	0.08		0.11		0.12	0.08	0.35	0.10	0.12	0.10				
178+10																	0.41	0.12			0.23	0.08					0.30	0.13			0.38	0.13				
179	0.15	0.13	0.18	0.16	0.15	0.13					0.19	0.14					0.15	0.09													0.17	0.14				
180	0.24	0.14	0.22	0.19	0.24	0.13					0.24	0.16					0.15	0.10													0.16	0.13				
181	0.21	0.15	0.23	0.17	0.22	0.14					0.25	0.15					0.14	0.12													0.13	0.12				
182	0.26	0.15	0.22	0.17	0.28	0.15					0.25	0.16					0.15	0.11													0.14	0.13				
183	0.25	0.16	0.21	0.16	0.24	0.16					0.22	0.14					0.50	0.10	0.30	0.14	0.12	0.08	0.14		0.14		0.11	0.10	0.35	0.11	0.18	0.15				
184	0.25	0.15	0.24	0.12	0.26	0.13					0.24	0.14					0.14	0.11													0.14	0.11				
185	0.25	0.15	0.21	0.17	0.25	0.15					0.22	0.15					0.15	0.12													0.13	0.12				
186	0.24	0.15	0.21	0.17	0.25	0.17					0.24	0.14					0.14	0.11													0.13	0.11				
187	0.23	0.14	0.24	0.17	0.26	0.14					0.26	0.15					0.13	0.11													0.12	0.09				
188	0.28	0.15	0.21	0.14	0.29	0.15					0.21	0.14					0.13	0.10			0.11	0.08	0.12		0.15		0.12	0.10			0.13	0.12	0.21	0.09		
188+10																											0.41	0.12			0.36	0.12				
189	0.23	0.14	0.19	0.15	0.23	0.14					0.19	0.14					0.12	0.12													0.11	0.10				
190	0.25	0.15	0.24	0.14	0.26	0.15					0.22	0.13					0.17	0.12													0.14	0.11				
191	0.24	0.13	0.19	0.16	0.25	0.13					0.20	0.14					0.14	0.11													0.13	0.11				
192	0.22	0.15	0.20	0.16	0.23	0.16					0.20	0.12					0.12	0.12													0.12	0.11				
193							0.20	0.14	0.15	0.13											0.13	0.10	0.12		0.14		0.11	0.07								
194	0.20	0.14	0.20	0.14	0.18	0.14					0.22	0.14					0.14	0.12													0.11	0.10				
194+10																	0.50	0.20			0.25	0.11														
195	0.17	0.13	0.18	0.14	0.18	0.14					0.18	0.13					0.10	0.10													0.13	0.11				
196	0.17	0.14	0.18	0.13	0.18	0.13					0.19	0.13					0.12	0.10													0.10	0.10				
197	0.17	0.13	0.16	0.14	0.15	0.13					0.16	0.13					0.10	0.10													0.12	0.10				
198	0.12	0.12	0.16	0.14	0.13	0.12					0.16	0.12			0.16		0.09	0.08	0.68	0.12	0.10	0.09	0.11		0.09		0.08	0.08			0.14	0.09	1.36	0.12		
198+10																											0.47	0.14			0.24	0.11				
199	0.14	0.11	0.23	0.16	0.14	0.13					0.23	0.14					0.12	0.09													0.12	0.10				

■放射線量測定結果一覧（国道4号　西郷地区）

測定No.	空間線量率（高さ1m）				空間線量率（高さ50cm）								表面線量率（表面1cm、遮へい体有り）																							
	下り		上り		下り				上り				下り												上り											
	歩道		歩道		歩道		路肩		路肩		歩道		法面		側溝		歩道		植樹帯		路肩		車道		車道		路肩		植樹帯		歩道		側溝		法面	
	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後
200							0.18	0.13	0.27	0.13																												
201							0.22	0.14	0.23	0.10																												
202							0.13	0.14	0.14	0.10																												
203							0.13	0.10	0.29	0.13											0.14	0.08	0.11		0.13		0.12	0.10	0.32	0.21								
204			0.14	0.12			0.22	0.11			0.15	0.10																			0.12	0.10						
205	0.22	0.16	0.13	0.11	0.21	0.16					0.14	0.10					0.13	0.11													0.12	0.09						
206	0.19	0.16	0.21	0.19	0.18	0.15					0.22	0.17					0.12	0.11													0.15	0.11						
207	0.18	0.17	0.27	0.25	0.18	0.17					0.26	0.17					0.13	0.11													0.17	0.13						
208	0.17	0.16	0.21	0.19	0.17	0.17					0.21	0.17			0.13		0.26	0.16	0.37	0.17	0.46	0.11	0.18		0.26	0.11	0.29	0.20	0.36	0.16	0.11	0.10	0.15	0.07		
209	0.18	0.16	0.24	0.22	0.19	0.17					0.25	0.19					0.15	0.12													0.16	0.11						
210	0.23	0.18	0.24	0.20	0.21	0.17					0.27	0.18					0.19	0.17													0.13	0.10						
211	0.23	0.16	0.20	0.18	0.25	0.17					0.22	0.18					0.13	0.12													0.14	0.13						
212	0.18	0.16	0.19	0.18	0.15	0.15					0.20	0.17					0.15	0.12													0.15	0.12						
213	0.29	0.20	0.23	0.21	0.33	0.18					0.24	0.17			0.20	0.10	0.15	0.14	0.33	0.15	0.29	0.22	0.27	0.12	0.21		0.31	0.21	0.25	0.14	0.11	0.10	0.21	0.09		
214	0.20	0.19	0.24	0.19	0.21	0.18					0.24	0.17					0.12	0.12													0.12	0.11						
215	0.19	0.18	0.22	0.19	0.20	0.18					0.23	0.16					0.15	0.11													0.12	0.11						
216	0.20	0.18	0.19	0.17	0.21	0.18					0.20	0.15					0.10	0.10													0.10	0.10						
217	0.18	0.16	0.20	0.17	0.21	0.15					0.20	0.16					0.10	0.10													0.10	0.09						
218	0.21	0.18	0.20	0.15	0.20	0.16					0.20	0.13			0.30	0.06	0.16	0.10	0.90	0.13	0.31	0.22	0.25	0.09	0.20		0.27	0.22	0.30	0.10	0.13	0.08	0.20	0.05		
218+10																	0.29	0.15			1.19	0.10					0.25	0.12			1.17	0.19						
219	0.17	0.17	0.18	0.17	0.16	0.17					0.18	0.14					0.10	0.10													0.10	0.09						
220	0.20	0.17	0.23	0.18	0.21	0.18					0.21	0.13					0.11	0.11													0.11	0.10						
221	0.20	0.16	0.17	0.16	0.21	0.15					0.18	0.14					0.12	0.11													0.11	0.10						
222	0.18	0.16	0.21	0.17	0.19	0.15					0.22	0.16					0.11	0.11													0.11	0.10						
223	0.18	0.17	0.20	0.16	0.20	0.15					0.20	0.14			0.55	0.08	0.10	0.10	0.30	0.18	0.25	0.19	0.24	0.10	0.20		0.25	0.20	0.30	0.11	0.10	0.12	0.15	0.08		
224	0.20	0.16	0.25	0.17	0.21	0.17					0.22	0.15					0.09	0.09													0.11	0.09						
225	0.21	0.17	0.22	0.17	0.20	0.18					0.22	0.14					0.11	0.10													0.09	0.08						
226	0.28	0.17	0.18	0.17	0.33	0.15					0.19	0.13					0.11	0.10													0.15	0.11						
227	0.23	0.19	0.18	0.14	0.26	0.17					0.19	0.12					0.11	0.11													0.10	0.08						
228	0.23	0.16	0.22	0.15	0.24	0.16					0.25	0.16			0.20	0.08	0.11	0.11	0.30	0.18	0.24	0.21	0.20	0.11	0.20		0.23	0.20	0.42	0.16	0.10	0.09	0.15	0.09		
229	0.23	0.16	0.20	0.15	0.25	0.17					0.20	0.15					0.10	0.10													0.12	0.09						
230	0.19	0.15	0.22	0.16	0.19	0.16					0.23	0.13					0.10	0.10													0.11	0.09						
231	0.21	0.14	0.22	0.16	0.22	0.13					0.27	0.14					0.11	0.10													0.11	0.10						
232	0.18	0.14	0.23	0.17	0.18	0.15					0.24	0.16					0.09	0.09													0.15	0.14						
233	0.19	0.14	0.22	0.17	0.20	0.14					0.24	0.14			0.47	0.12	0.10	0.10	0.35	0.12	0.23	0.19	0.26	0.07	0.20		0.27	0.21	0.37	0.17	0.10	0.08	0.16	0.10		
233+10																	0.24	0.16			0.75	0.12														
234	0.18	0.13	0.20	0.17	0.17	0.14					0.21	0.14					0.11	0.10													0.09	0.08						
235	0.22	0.18	0.23	0.15	0.21	0.16					0.24	0.14					0.12	0.12													0.11	0.09						
236	0.17	0.15	0.18	0.14	0.18	0.14					0.19	0.13					0.12	0.11													0.10	0.09						
237	0.18	0.17	0.19	0.17	0.18	0.15					0.17	0.17					0.10	0.10													0.11	0.09						
238	0.16	0.13	0.20	0.18	0.15	0.12					0.21	0.14			0.75	0.12	0.20	0.11	0.31	0.11	0.30	0.20	0.26	0.12	0.27	0.10	0.35	0.21	2.05	0.14	0.15	0.12	0.16	0.06		
238+10																	0.55	0.13			0.46	0.09					0.60	0.14			0.69	0.16						
239	0.21	0.16	0.22	0.17	0.20	0.15					0.20	0.16					0.11	0.11													0.11	0.10						
240	0.23	0.17	0.16	0.15	0.22	0.16					0.16	0.15					0.11	0.11													0.07	0.07						
241	0.21	0.15	0.19	0.17	0.22	0.14					0.20	0.16					0.12	0.11													0.09	0.09						
242	0.20	0.19	0.14	0.13	0.22	0.17					0.14	0.13					0.12	0.12													0.07	0.07						
243	0.20	0.16	0.14	0.13	0.19	0.16					0.16	0.14			1.20	0.13	0.10	0.10	0.30	0.11	0.25	0.21	0.22		0.26	0.12	0.32	0.22	0.35	0.17	0.07	0.07	0.15	0.07		
244	0.19	0.15	0.20	0.16	0.17	0.17					0.21	0.16					0.10	0.10													0.08	0.08						
245	0.17	0.14	0.23	0.19	0.18	0.15					0.22	0.16					0.12	0.12													0.10	0.10						
246	0.19	0.15	0.18	0.16	0.18	0.18					0.19	0.15					0.10	0.10													0.07	0.07						
247	0.20	0.15	0.20	0.16	0.22	0.15					0.22	0.16					0.10	0.10													0.11	0.09						
248	0.17	0.14	0.18	0.15	0.21	0.16					0.19	0.14			0.43	0.09	0.10	0.10	0.43	0.17	0.15	0.14	0.13		0.11		0.15	0.14	0.26	0.14	0.08	0.08	0.16	0.08		
248+10																	0.35	0.19			0.36	0.13					0.31	0.10			0.31	0.13						
249			0.22	0.16			0.15	0.15			0.20	0.16																			0.09	0.09						
250			0.18	0.14			0.17	0.14			0.18	0.14																			0.08	0.08						
251	0.17	0.14			0.19	0.14					0.17	0.16					0.10	0.10																				

■放射線量測定結果一覧（国道4号　西郷地区）

測定No.	空間線量率（高さ1m）				空間線量率（高さ50cm）								表面線量率（表面1cm、遮へい体有り）																							
	下り		上り		下り				上り				下り												上り											
	歩道		歩道		歩道		路肩		路肩		歩道		法面		側溝		歩道		植樹帯		路肩		車道		車道		路肩		植樹帯		歩道		側溝		法面	
	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後
252	0.14	0.12	0.23	0.17	0.15	0.11					0.23	0.16					0.10	0.10													0.14	0.11				
253	0.18	0.12	0.23	0.18	0.13	0.15					0.24	0.16			0.27	0.10	0.10	0.10	0.35	0.12	0.16	0.14	0.12		0.11		0.10	0.10	0.32	0.13	0.13	0.12	0.21	0.07		
253+10																	0.65	0.13			0.38	0.08														
254	0.17	0.14	0.20	0.17	0.15	0.13					0.21	0.17					0.10	0.10													0.09	0.09				
255	0.22	0.14	0.24	0.18	0.21	0.13					0.26	0.13					0.10	0.10													0.13	0.13				
256	0.15	0.13	0.17	0.15	0.15	0.13					0.18	0.16					0.10	0.10													0.10	0.10				
257	0.22	0.14	0.24	0.18	0.20	0.13					0.24	0.15					0.09	0.09													0.10	0.10				
258	0.21	0.14	0.21	0.14	0.20	0.12					0.22	0.13			0.19	0.06	0.14	0.11	0.27	0.11	0.17	0.14	0.11		0.13		0.14	0.09	0.30	0.10	0.11	0.09	0.21	0.07		
258+10																	0.38	0.13			0.82	0.08					0.27	0.07			0.39	0.16				
259	0.22	0.12	0.18	0.14	0.22	0.15					0.20	0.13					0.11	0.10													0.09	0.09				
260	0.21	0.14	0.17	0.15	0.22	0.16					0.17	0.16					0.10	0.10													0.08	0.08				
261	0.22	0.15	0.23	0.15	0.21	0.13					0.21	0.10					0.10	0.10													0.10	0.10				
262	0.22	0.14	0.17	0.14	0.22	0.14					0.19	0.12					0.10	0.10													0.07	0.07				
263	0.22	0.16	0.13	0.13	0.22	0.15					0.14	0.08			0.15	0.11	0.11	0.10	0.52	0.14	0.10	0.10	0.13		0.12		0.14	0.14	0.38	0.16	0.10	0.09	0.15	0.12		
263+10																	0.32	0.12			2.18	0.14														
平均	0.20	0.15	0.21	0.16	0.20	0.15	0.30	0.25	0.32	0.23	0.21	0.15	0.27	0.25	0.33	0.09	0.16	0.11	0.40	0.13	0.30	0.12	0.15	0.11	0.15	0.11	0.21	0.12	0.44	0.14	0.15	0.11	0.24	0.08	0.25	0.21
低減率		**25%**		**24%**		**25%**		**17%**		**28%**		**29%**		**7%**		**73%**		**31%**		**68%**		**60%**		**27%**		**27%**		**43%**		**68%**		**27%**		**67%**		**16%**
最大値	0.45	0.26	0.46	0.26	0.66	0.26	0.52	0.42	0.68	0.57	0.45	0.22	0.32	0.33	1.20	0.13	0.93	0.22	0.90	0.18	2.43	0.22	0.28	0.17	0.27	0.12	0.87	0.22	2.05	0.21	1.17	0.19	1.36	0.12	0.33	0.32
最小値	0.11	0.10	0.13	0.09	0.11	0.09	0.13	0.10	0.14	0.10	0.13	0.08	0.15	0.15	0.10	0.06	0.06	0.04	0.25	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.08	0.06	0.25	0.10	0.07	0.06	0.07	0.05	0.16	0.07

上下線平均	空間線量率（高さ1m）		空間線量率（高さ50cm）				表面線量率（表面1cm、遮へい体有り）											
	歩道		歩道		路肩		法面		側溝		歩道		植樹帯		路肩		車道	
	線量（μSv/h）	低減率(%)	線量（μSv/h）	低減率(%)	線量（μSv/h）	低減率(%)	線量（μSv/h）	低減率(%)	線量（μSv/h）	低減率(%)	線量（μSv/h）	低減率(%)	線量（μSv/h）	低減率(%)	線量（μSv/h）	低減率(%)	線量（μSv/h）	低減率(%)
事前	0.20	**22**	0.21	**29**	0.31	**22**	0.26	**11**	0.28	**69**	0.16	**30**	0.42	**67**	0.26	**53**	0.15	**26**
事後	0.16		0.15		0.24		0.23		0.09		0.11		0.14		0.12		0.11	

※ 測定間隔は20m、歩道以外の測定間隔は100mで実施しています。

※ 歩道未整備区間は路肩で測定しています。

※ ／の表示は、事前の測定結果により、除染工事を実施していない箇所です。

※ ×の表示は、測定箇所に対象物が無いため測定していない箇所です。又は水等の障害物が有り測定不可能な箇所です。

■放射線量測定結果一覧（国道4号　泉崎地区）

測定No.	空間線量率（高さ1m）				空間線量率（高さ50cm）								表面線量率（表面1cm、遮へい体有り）																							
	下り		上り		下り				上り				下り												上り											
	歩道		歩道		歩道		路肩		路肩		歩道		法面		側溝		歩道		植樹帯		路肩		車道		車道		路肩		植樹帯		歩道		側溝		法面	
	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後
0							0.28	0.21	0.29	0.13																												
1							0.33	0.23	0.46	0.13			0.22	0.21									0.11	0.10	0.10		0.05		0.07	0.07	0.75	0.11						
2			0.17	0.17			0.34	0.23			0.19	0.14																			0.13	0.10				
3			0.15	0.14			0.22	0.15			0.15	0.12																			0.09	0.09				
4			0.16	0.16			0.16	0.13			0.17	0.14																			0.13	0.10				
5			0.24	0.19			0.14	0.12			0.23	0.16																			0.16	0.13				
6			0.22	0.18			0.18	0.12			0.23	0.16			0.25	0.12			0.12		0.10	0.08	0.12		0.11		0.17	0.16	0.26	0.09	0.17	0.12				
7			0.13	0.13			0.26	0.12			0.14	0.13																			0.10	0.09				
8			0.24	0.16			0.21	0.14			0.23	0.13																			0.14	0.10				
9			0.16	0.16			0.23	0.14			0.19	0.13																			0.14	0.08				
10							0.18	0.14	0.21	0.13																												
11			0.25	0.17			0.21	0.12			0.23	0.15			0.21				0.31	0.08	0.13	0.11	0.08		0.10		0.08	0.06			0.13	0.11			0.38	0.09
12			0.26	0.16			0.27	0.13			0.28	0.15																			0.14	0.12				
13			0.29	0.14			0.29	0.11			0.31	0.13																			0.15	0.12				
14			0.26	0.15			0.25	0.12			0.33	0.13																			0.19	0.12				
15			0.27	0.16			0.22	0.16			0.26	0.14																			0.13	0.12				
16			0.50	0.18			0.28	0.19			0.47	0.16	0.26	0.26	0.13						0.15	0.13	0.12		0.09		0.11	0.09	0.23	0.10	0.20	0.12	0.15			
17							0.30	0.22	0.33	0.22																												
18							0.34	0.20	0.30	0.24																												
19							0.33	0.21	0.49	0.25																												
20							0.41	0.23	0.31	0.22																												
21							0.33	0.22	0.13	0.15			0.21	0.21							0.15	0.08	0.09		0.10		0.09	0.06					0.05			
22							0.21	0.17	0.26	0.13																												
23							0.31	0.22	0.28	0.16																												
24							0.35	0.22	0.24	0.16																												
25							0.36	0.22	0.26	0.14																												
26							0.36	0.19	0.17	0.12			0.25	0.25							0.11	0.11	0.10		0.11		0.13	0.10	0.34	0.11			0.17	0.09		
27							0.30	0.14	0.26	0.16																												
28							0.26	0.15	0.25	0.20																												
29							0.17	0.15	0.24	0.18																												
30							0.26	0.13	0.26	0.20																												
31							0.15	0.12	0.18	0.15					0.06	0.05					0.08	0.07	0.10		0.15		0.09	0.09								
32							0.22	0.14	0.28	0.19																												
33							0.22	0.14	0.26	0.21																												
34							0.25	0.14	0.18	0.17																												
35							0.30	0.19	0.21	0.15																												
36							0.34	0.17	0.21	0.15			0.25	0.25	1.05	0.09					0.12	0.10	0.13		0.10		0.10	0.10					0.13			
37							0.35	0.17	0.21	0.15																												
38							0.33	0.17	0.30	0.15																												
39							0.21	0.17	0.20	0.14																												
40							0.19	0.16	0.20	0.15																												
41							0.22	0.18	0.17	0.13			0.18	0.18	0.09	0.09					0.10		0.10		0.09		0.11									
42							0.21	0.23	0.17	0.13																												
43							0.18	0.13	0.14	0.14																												
44							0.22	0.15	0.13	0.12																												
45							0.18	0.15	0.18	0.15																												
46							0.13	0.12	0.22	0.17			0.08	0.08							0.08		0.08		0.10		0.09								0.18	0.18
47							0.14	0.13	0.19	0.18																												
48							0.33	0.21	0.23	0.18																												
49							0.18	0.18	0.25	0.16																												
50							0.23	0.16	0.25	0.16																												
51							0.28	0.24	0.23	0.26			0.28	0.17							0.10	0.08	0.14		0.12		0.13	0.11							0.17	0.18
52							0.43	0.23	0.25	0.21																												
53							0.16	0.12	0.27	0.21																												
54	0.12	0.11			0.12	0.11			0.17	0.16							0.08	0.08																		
55	0.17	0.16	0.20	0.16	0.17	0.13					0.15	0.12					0.13	0.09													0.11	0.08				

■放射線量測定結果一覧（国道4号　泉崎地区）

測定No.	空間線量率（高さ1m）				空間線量率（高さ50cm）								表面線量率（表面1cm、遮へい体有り）																					
	下り		上り		下り				上り				下り										上り											
	歩道		歩道		歩道		路肩		路肩		歩道		法面		側溝		歩道		植樹帯		路肩		車道		車道		路肩		植樹帯		歩道		側溝		法面	
	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後
55+10																	0.27	0.09			0.41	0.07													
56	0.11	0.11	0.16	0.15	0.12	0.10					0.16	0.12			0.23	0.10	0.09	0.08			0.09	0.08	0.09		0.09		0.11	0.11			0.13	0.08			0.16	0.16
56+10																											0.26	0.10			0.69	0.11				
57	0.15	0.15	0.15	0.14	0.16	0.12					0.17	0.11					0.13	0.09													0.11	0.08				
58	0.19	0.17	0.15	0.14	0.19	0.13					0.13	0.13					0.13	0.09													0.13	0.08				
59	0.23	0.18	0.16	0.14	0.22	0.14					0.17	0.12					0.13	0.09													0.10	0.09				
60	0.31	0.22	0.15	0.14	0.33	0.16					0.19	0.11					0.21	0.11													0.14	0.09				
61	0.20	0.15	0.18	0.15	0.23	0.13					0.14	0.12	0.18	0.18			0.15	0.09			0.13	0.11	0.09		0.11		0.10	0.10			0.10	0.08			0.16	0.16
61+10																											0.25	0.08			0.26	0.11				
62	0.19	0.16	0.14	0.13	0.19	0.14					0.13	0.12					0.13	0.09													0.09	0.09				
63	0.16	0.14	0.14	0.14	0.16	0.11					0.12	0.14					0.10	0.08													0.11	0.11				
64							0.13	0.11	0.19	0.15																										
65	0.15	0.14	0.21	0.18	0.16	0.14					0.20	0.14					0.12	0.09													0.12	0.08				
66	0.21	0.19	0.18	0.16	0.20	0.15					0.16	0.15	0.16	0.16			0.12	0.09			0.12	0.10	0.10		0.06		0.10	0.10			0.12	0.08			0.19	0.16
66+10																	0.23	0.09			0.24	0.09					0.24	0.18			0.24	0.12				
67	0.17	0.17	0.15	0.15	0.17	0.16					0.14	0.10					0.07	0.07													0.03	0.06				
68	0.20	0.18	0.17	0.16	0.19	0.14					0.18	0.15					0.13	0.10													0.11	0.09				
69	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.12					0.15	0.13					0.10	0.08													0.11	0.07				
70	0.14	0.14	0.16	0.15	0.14	0.11					0.18	0.13					0.11	0.08													0.12	0.09				
71	0.12	0.12	0.15	0.15	0.11	0.10					0.15	0.13			0.24	0.07	0.08	0.07			0.14	0.11	0.10		0.09		0.16	0.10	0.06		0.09	0.07	0.11			
72	0.11	0.11	0.15	0.15	0.12	0.11					0.14	0.13					0.09	0.07													0.10	0.08				
73	0.14	0.13	0.17	0.16	0.14	0.12					0.19	0.16					0.10	0.08													0.11	0.09				
74	0.15	0.14	0.18	0.17	0.15	0.11					0.14	0.13					0.09	0.08													0.10	0.08				
75	0.14	0.14	0.14	0.13	0.15	0.13					0.15	0.11					0.10	0.09													0.11	0.08				
76	0.15	0.14	0.15	0.13	0.13	0.12					0.14	0.11			0.48	0.14	0.11	0.08			0.10	0.10	0.10		0.10		0.11	0.10			0.10	0.08				
76+10																	0.40	0.13			0.28	0.12					0.24	0.10			0.25	0.09				
77	0.19	0.15	0.10	0.10	0.19	0.12					0.14	0.10					0.10	0.10													0.09	0.07				
78	0.19	0.17	0.13	0.11	0.19	0.13					0.13	0.10					0.11	0.11													0.12	0.07				
79	0.19	0.19	0.12	0.12	0.19	0.15					0.10	0.11					0.12	0.12													0.09	0.08				
80	0.19	0.16	0.14	0.12	0.18	0.14					0.15	0.11					0.12	0.11													0.05	0.05				
81	0.19	0.17	0.12	0.11	0.19	0.14					0.13	0.11			0.25	0.13	0.13	0.12			0.13	0.11	0.10		0.13		0.11	0.10			0.11	0.07	0.12			
82	0.20	0.17	0.17	0.15	0.18	0.14					0.15	0.13					0.13	0.11													0.10	0.08				
83	0.22	0.20	0.18	0.15	0.22	0.15					0.16	0.12					0.14	0.11													0.11	0.09				
84	0.21	0.21	0.20	0.17	0.21	0.14					0.21	0.15					0.13	0.12													0.14	0.08				
85	0.23	0.19	0.16	0.15	0.22	0.16					0.17	0.13					0.20	0.18													0.05	0.07				
86	0.17	0.16	0.15	0.14	0.18	0.16					0.15	0.11			0.16		0.13	0.10			0.11	0.09	0.06		0.12		0.11	0.10			0.12	0.08	0.11			
86+10																											0.24	0.15			0.25	0.09				
87	0.14	0.14			0.14	0.13			0.12	0.12							0.08	0.08																		
87+10																	0.24	0.08			0.24	0.10														
88	0.18	0.15	0.16	0.15	0.19	0.13					0.18	0.15					0.11	0.11													0.11	0.08				
89	0.20	0.17	0.18	0.17	0.20	0.13					0.17	0.14					0.13	0.12													0.12	0.09				
90	0.22	0.20	0.23	0.20	0.21	0.17					0.22	0.17					0.11	0.11													0.12	0.09				
91	0.20	0.20	0.22	0.20	0.20	0.15					0.21	0.16			0.06		0.11	0.09			0.07	0.04	0.09		0.11		0.08	0.05			0.09	0.07	0.16	0.09	0.30	0.24
92	0.18	0.16	0.20	0.20	0.20	0.13					0.18	0.15					0.10	0.09													0.11	0.09				
93	0.14	0.13	0.23	0.20	0.13	0.12					0.21	0.17					0.10	0.08													0.11	0.08				
94	0.13	0.13	0.21	0.19	0.13	0.11					0.21	0.17					0.09	0.09													0.12	0.09				
95	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11					0.11	0.11					0.09	0.09													0.12	0.08				
96	0.14	0.12	0.13	0.13	0.16	0.12					0.11	0.11					0.10	0.10			0.07	0.07	0.07		0.06		0.05	0.05	0.14		0.10	0.07	0.09			
96+10																											0.25	0.09			0.30	0.11				
97	0.17	0.15	0.18	0.11	0.18	0.13					0.21	0.11					0.09	0.09													0.04	0.04				
98	0.25	0.18	0.14	0.13	0.24	0.14					0.14	0.12					0.11	0.10													0.12	0.08				
99	0.22	0.20	0.13	0.12	0.23	0.14					0.14	0.13					0.12	0.09													0.11	0.07				
100	0.19	0.15	0.14	0.14	0.18	0.14					0.14	0.14					0.09	0.09													0.12	0.10				
101	0.25	0.20	0.20	0.19	0.28	0.15					0.19	0.14					0.17	0.14			0.12	0.10	0.09		0.05		0.07	0.07	0.20		0.15	0.11	0.20			
102	0.17	0.16	0.14	0.12	0.17	0.14					0.17	0.11					0.11	0.11													0.11	0.08				
103	0.14	0.14	0.15	0.13	0.11	0.11					0.15	0.12					0.11	0.09													0.10	0.09				

■放射線量測定結果一覧（国道4号　泉崎地区）

測定No.	空間線量率（高さ1m）				空間線量率（高さ50cm）								表面線量率（表面1cm、遮へい体有り）																					
	下り		上り		下り				上り				下り												上り									
	歩道		歩道		歩道		路肩		路肩		歩道		法面		側溝		歩道		植樹帯		路肩		車道		車道		路肩		植樹帯		歩道		側溝		法面	
	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後
104	0.18	0.14	0.18	0.18	0.18	0.13					0.21	0.15					0.12	0.09											0.10	0.10				
105	0.16	0.13	0.18	0.15	0.16	0.13					0.15	0.12					0.08	0.08											0.15	0.10				
106	0.18	0.15	0.13	0.13	0.18	0.14					0.14	0.12	0.15	0.15	0.22		0.10	0.09			0.09	0.09	0.09		0.12		0.11	0.10			0.11	0.09			0.23	0.20
106+10																	1.20	0.10			0.24	0.08					0.24	0.08			0.27	0.11				
107	0.21	0.14	0.13	0.13	0.20	0.11					0.13	0.13					0.11	0.09													0.11	0.08				
108	0.14	0.14	0.23	0.20	0.15	0.13					0.22	0.16					0.11	0.08													0.15	0.08				
109	0.15	0.12	0.16	0.13	0.13	0.12					0.14	0.10					0.11	0.09													0.10	0.08				
110	0.13	0.13	0.16	0.15	0.15	0.11					0.14	0.14					0.11	0.09													0.10	0.10				
111	0.18	0.12	0.15	0.15	0.17	0.13					0.16	0.12	0.18	0.15	0.07		0.18	0.08			0.08	0.07	0.09		0.08		0.09	0.07			0.08	0.08	0.12		0.19	0.14
112	0.17	0.16	0.20	0.17	0.16	0.13					0.22	0.14					0.11	0.10													0.12	0.09				
113	0.22	0.20	0.19	0.16	0.21	0.16					0.19	0.13					0.18	0.17													0.12	0.10				
114	0.17	0.17	0.17	0.16	0.18	0.15					0.19	0.13					0.10	0.10													0.11	0.08				
115	0.18	0.18	0.14	0.14	0.18	0.15					0.15	0.14					0.10	0.08													0.12	0.08				
116	0.17	0.17	0.16	0.15	0.18	0.14					0.17	0.14			0.33	0.10	0.11	0.11	0.25	0.08	0.09	0.09	0.09		0.05		0.09	0.09			0.07	0.07	0.05		0.13	0.13
116+10																	0.29	0.10																		
117	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.12					0.18	0.13					0.11	0.09													0.12	0.09				
117+10																					0.35	0.15									0.34	0.10				
118			0.13	0.12			0.12	0.12			0.14	0.11																			0.10	0.08				
118+10																											0.25	0.08								
119	0.23	0.22			0.25	0.15			0.10	0.11							0.13	0.12																		
120	0.23	0.22	0.22	0.20	0.27	0.18					0.20	0.15					0.18	0.15													0.08	0.08				
121	0.22	0.21	0.21	0.20	0.27	0.16					0.20	0.16	0.23	0.10	0.14	0.13	0.15	0.14			0.11	0.10	0.10		0.05		0.12	0.09	0.21		0.14	0.10	0.13	0.13		
122	0.25	0.20	0.22	0.21	0.27	0.17					0.21	0.17					0.14	0.14													0.15	0.12				
123	0.24	0.21	0.23	0.20	0.27	0.17					0.21	0.15					0.14	0.11													0.09	0.09				
124	0.21	0.21	0.20	0.19	0.23	0.17					0.21	0.17					0.14	0.11													0.13	0.11				
125	0.21	0.19	0.20	0.19	0.24	0.17					0.21	0.16					0.14	0.13													0.15	0.12				
126	0.22	0.20	0.22	0.18	0.24	0.17					0.21	0.17	0.37	0.10	0.09	0.08	0.13	0.10			0.11	0.08	0.09		0.12		0.25	0.12			0.24	0.12	0.12	0.11		
127							0.25	0.17	0.21	0.16																										
128							0.26	0.17	0.22	0.15																										
129							0.26	0.17	0.18	0.15																										
130							0.22	0.18	0.18	0.16																										
131							0.21	0.16	0.21	0.15			0.15	0.14	0.09	0.07					0.10	0.06	0.10		0.09		0.10						0.07	0.06	0.15	0.13
132							0.20	0.16	0.19	0.15																										
133							0.20	0.16	0.19	0.16																										
134							0.63	0.33	0.26	0.18																										
135							0.26	0.21	0.18	0.15																										
136							0.23	0.18	0.20	0.16			0.18	0.19	0.08						0.09		0.11		0.10		0.09	0.09					0.11		0.16	0.16
137							0.11	0.11	0.23	0.16																										
138	0.16	0.15			0.14	0.13			0.17	0.14							0.08	0.08																		
139							0.20	0.15	0.20	0.16																										
140							0.22	0.17	0.20	0.17																										
141							0.17	0.13	0.17	0.14			0.20	0.20							0.13		0.09		0.11		0.10								0.18	0.18
142							0.17	0.13	0.16	0.14																										
143							0.18	0.13	0.18	0.14																										
144							0.14	0.11	0.12	0.12																										
145							0.22	0.13	0.14	0.13																										
146							0.17	0.14	0.18	0.13					0.09						0.09		0.10		0.10		0.09								0.14	0.16
147							0.15		0.19																										
148							0.16		0.14																										
149							0.15		0.12																										
150							0.13		0.14																										
151							0.13		0.12						0.07						0.07		0.09		0.07		0.10						0.11			
152							0.13		0.11																										
153							0.10		0.11																										
154							0.11		0.10																										
155							0.12		0.12																										

■放射線量測定結果一覧（国道4号　泉崎地区）

測定No.	空間線量率（高さ1m）				空間線量率（高さ50cm）								表面線量率（表面1cm、遮へい体有り）																			
	下り		上り		下り				上り				下り												上り									
	歩道		歩道		歩道		路肩		路肩		歩道		法面		側溝		歩道		植樹帯		路肩		車道		車道		路肩		植樹帯		歩道		側溝		法面	
	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後	事前	事後
156							0.12		0.12						0.08						0.07		0.06		0.09		0.08						0.12			
157							0.16		0.12																											
158							0.18		0.13																											
159							0.12		0.09																											
160							0.12		0.11																											
161							0.15	0.10	0.11	0.09			0.09	0.09							0.09		0.08		0.11		0.09						0.10			
162							0.17	0.11	0.12	0.09																										
163							0.17	0.12	0.11	0.11																										
164	0.12	0.12			0.12	0.11			0.21	0.16							0.10	0.10																
165	0.14	0.13			0.14	0.12			0.19	0.16							0.11	0.10																
166	0.13	0.13			0.14	0.11			0.17	0.15					0.18	0.15	0.09	0.09	0.14	0.11	0.11	0.10	0.08		0.10		0.11						0.09	0.09		
167	0.12	0.12			0.11	0.11			0.17	0.15							0.09	0.09																
168							0.18	0.13	0.22	0.17																										
169							0.20	0.16	0.21	0.16																										
170							0.20	0.14	0.18	0.18																										
171							0.14	0.14	0.13	0.13			0.20	0.15							0.10	0.08	0.13		0.11		0.13	0.09								
172							0.19	0.16	0.21	0.14																										
172+10																					0.23	0.19					0.27	0.09								
173							0.21	0.18	0.22	0.16																										
174							0.17	0.16	0.19	0.18																										
175							0.18	0.14	0.18	0.15																										
176							0.19	0.16	0.18	0.15			0.16	0.16							0.09	0.09	0.11		0.13		0.10	0.10							0.12	0.12
177							0.16	0.14	0.20	0.12																										
178							0.19	0.15	0.14	0.12																										
179							0.17	0.13	0.20	0.12																										
180							0.12	0.12	0.17	0.13																										
181							0.17	0.11	0.16	0.11			0.11	0.11							0.12	0.09	0.11		0.12		0.14	0.11							0.16	0.16
平均	0.18	0.16	0.18	0.15	0.18	0.13	0.22	0.16	0.20	0.16	0.18	0.13	0.19	0.17	0.20	0.10	0.14	0.10	0.21	0.09	0.13	0.10	0.10		0.10		0.13	0.10	0.30	0.10	0.13	0.09	0.12	0.10	0.18	0.16
低減率		11%		17%		28%		27%		20%		28%		11%		50%		29%		57%		23%						23%		67%		31%		17%		11%
最大値	0.31	0.22	0.50	0.21	0.33	0.18	0.63	0.33	0.49	0.26	0.47	0.17	0.37	0.26	1.05	0.15	1.20	0.18	0.31	0.11	0.41	0.19	0.14	0.00	0.15	0.00	0.27	0.18	0.75	0.11	0.69	0.13	0.20	0.13	0.38	0.24
最小値	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.05	0.07	0.07	0.12	0.08	0.07	0.04	0.06	0.00	0.05	0.00	0.05	0.05	0.14	0.09	0.03	0.04	0.05	0.06	0.09	0.09

上下線平均	空間線量率（高さ1m）		空間線量率（高さ50cm）				表面線量率（表面1cm、遮へい体有り）											
	歩道		歩道		路肩		法面		側溝		歩道		植樹帯		路肩		車道	
	線量(μSv/h)	低減率(%)	線量(μSv/h)	低減率(%)	線量(μSv/h)	低減率(%)	線量(μSv/h)	低減率(%)	線量(μSv/h)	低減率(%)	線量(μSv/h)	低減率(%)	線量(μSv/h)	低減率(%)	線量(μSv/h)	低減率(%)	線量(μSv/h)	低減率(%)
事前	0.18	12	0.18	26	0.21	24	0.19	15	0.16	39	0.14	31	0.27	64	0.13	29	0.10	
事後	0.16		0.13		0.16		0.16		0.10		0.09		0.10		0.10			

※ 測定間隔は20m、歩道以外の測定間隔は100mで実施しています。

※ 歩道未整備区間は路肩で測定しています。

※ ／の表示は、事前の測定結果により、除染工事を実施していない箇所です。

※ ×の表示は、測定箇所に対象物が無いため測定していない箇所です。又は水等の障害物が有り測定不可能な箇所です。
