緊急情報／防災情報

がんばろう！東北

平成 29 年 7 月 24 日 14:00
東 北 地 方 整 備 局

雄物川流域で観測史上最大の水位（椿川）を記録し、雄物川をはじめ、各所で被害が発生
～平成２９年７月２２日（梅雨前線）の概要～

活発な梅雨前線の影響で、秋田県で非常に激しい雨が降り、累加雨量は多いところで300ミリを超える大雨となり、多くの観測所で24時間雨量観測史上最大を記録しました。

23日11時　椿川水位観測所では、昭和11年の観測開始から最大の水位を記録しました。

また、雄物川の神宮寺水位観測所では、観測史上最大（平成23年6月）に次ぐ、第二位の水位となるなど、記録的な洪水となっています。

＜発表記者会＞　宮城県政記者会、秋田県政記者会、東北電力記者会
東北専門記者会

＜問い合わせ先＞
国土交通省　東北地方整備局
仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎 B 棟 12 階　電話　022-225-2171㈹

河川部　河川調査官　　平野（ひらの）　明徳（あきなり）　（内 線　3513）

河川計画課長　　奥中（おくなか）　智行（ともゆき）　（内 線　3611）

平成29年7月22日（梅雨前線）の概要
《第1報　7月24日　9時　時点》



東北地方整備局　河川部

※数値は速報値ですので今後の精査等により変更する場合があります。

平成29年7月22日（梅雨前線）の概要

活発な梅雨前線の影響で、秋田県で非常に激しい雨が降り、累加雨量は多いところで300ミリを超える大雨となり、多くの観測所で24時間雨量観測史上最大を記録した。


23日11時 椿川水位観測所では、昭和11年の観測開始から最大の水位を記録した。

また、雄物川の神宮寺水位観測所では、観測史上最大（平成23年6月）に次ぐ、第二位の水位となるなど、記録的な洪水となっている。


累加雨量300mmを超えた観測所

- 比立内川国交省（米代川） 379.0mm
- 雄和気象庁（雄物川） 348.0mm
- 横手気象庁（雄物川） 312.0mm
- 大清水国交省（子吉川） 332.0mm


累加雨量レーダ

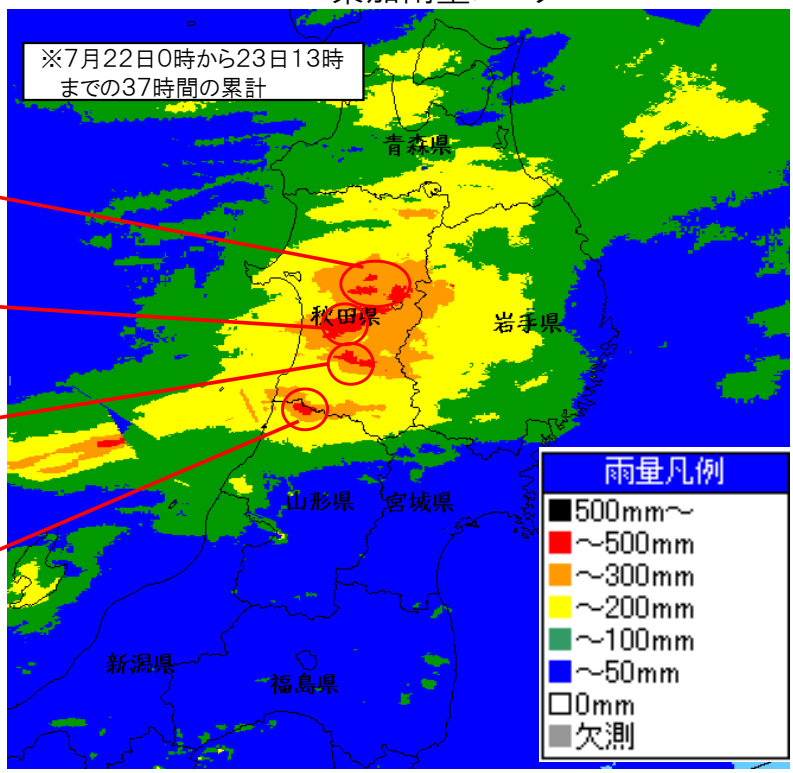

天気図（7月22日21時頃）

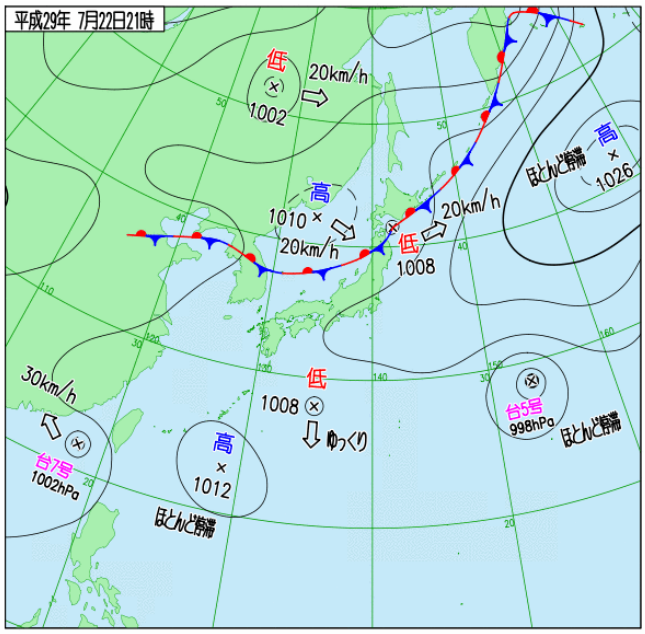

衛星画像（7月22日21時頃）

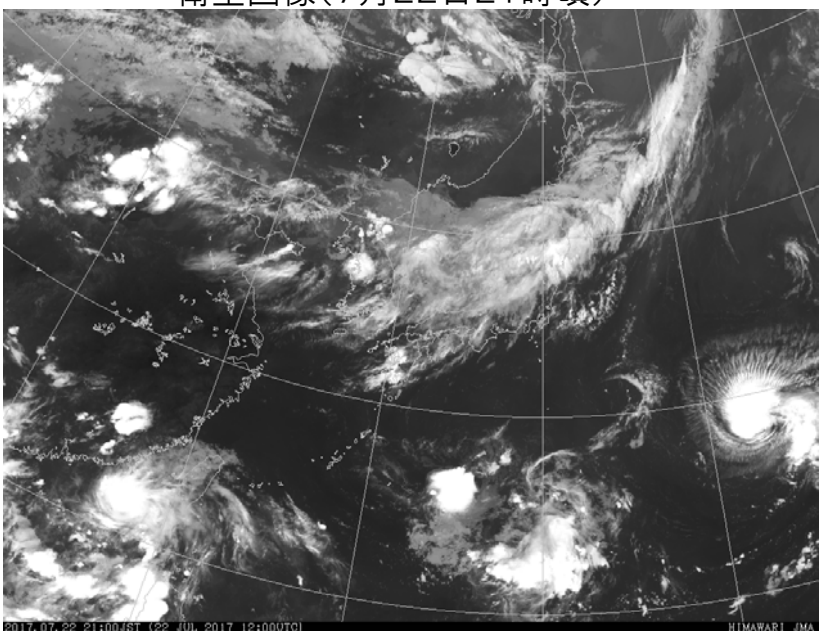

※気象庁資料より

平成29年7月22日（梅雨前線）における東北地方整備局管内の直轄管理河川の状況

【平成29年7月23日　18時 現在】

1. 河川出水状況（直轄河川）

○レベル5（溢水）＜1河川＞
・雄物川

○レベル3（避難判断水位 超過）＜1河川＞
・子吉川、

○レベル2（氾濫注意水位 超過）＜1河川＞
・米代川、北上川

2. 直轄ダム洪水調節状況

○直轄5ダム で防災操作を実施
（湯田ダム、玉川ダム、森吉山ダム、御所ダム、四十四田ダム ）

3. 排水ポンプ車の出動状況


○大仙市
排水ポンプ車　30m3/min　×２台
排水ポンプ車　60m3/min　×１台
照明車1台
○由利本荘市
排水ポンプ車　30m3/min　×１台
○秋田市
排水ポンプ車　30m3/min　×１台
照明車1台

4. 一般被害状況（国管理区間）

○雄物川　外水氾濫
間倉地区
中村・芦沢地区
寺館大巻地区

5. 避難指示及び避難勧告(発令毎の総計)

○秋田県3市町で避難指示
秋田（大仙市、由利本荘市、美郷町）
○青森県2市町、秋田県4市町で避難勧告
青森（五所川原市、三戸町）
秋田県（秋田市、横手市、大館市、五城目町）

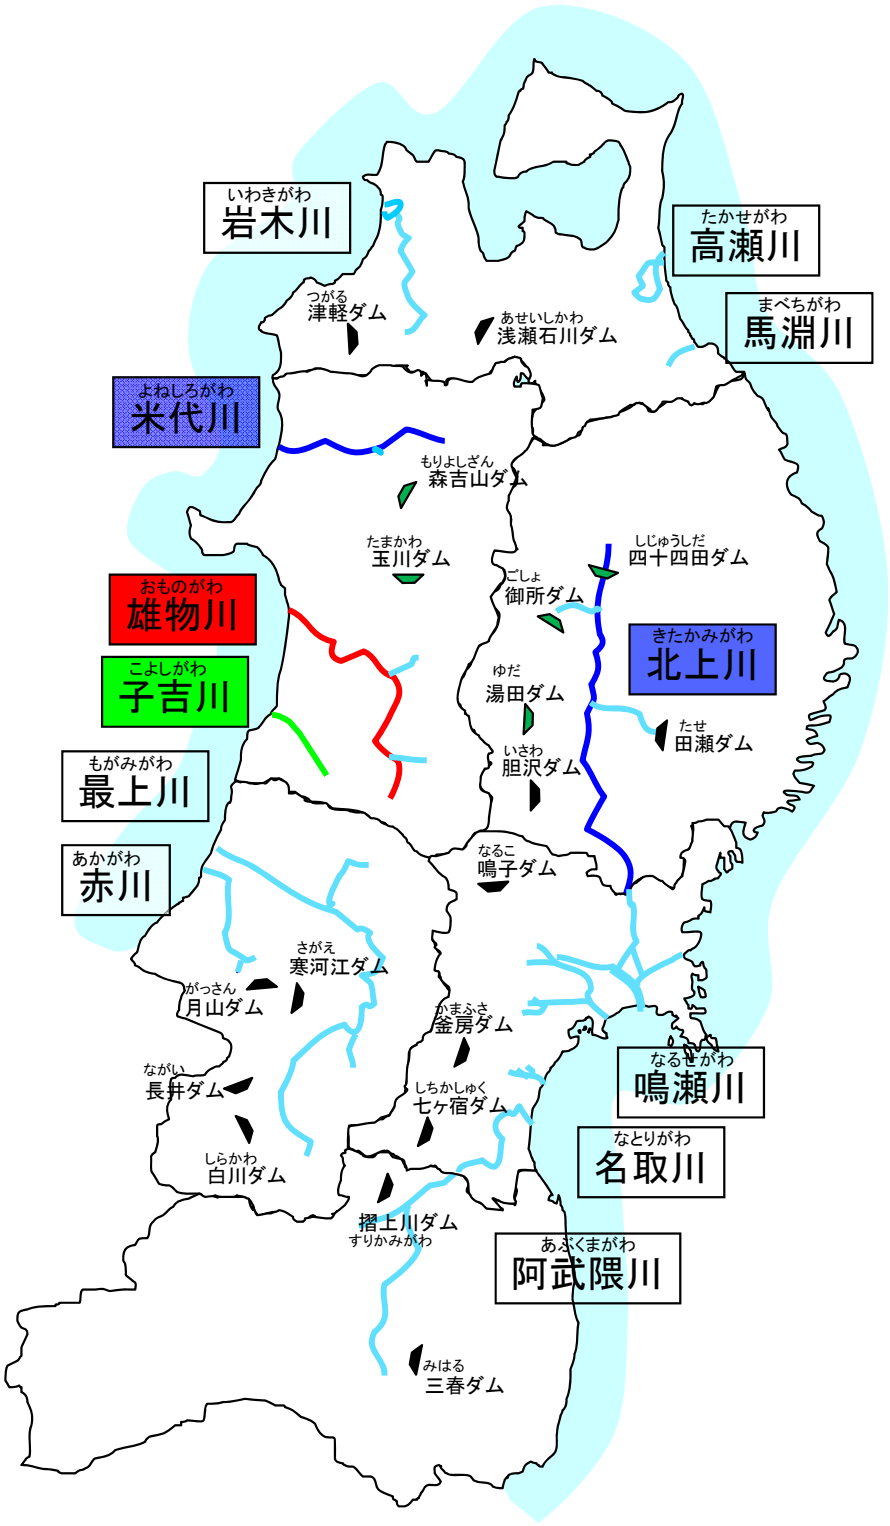


凡　例
- レベル5（越水）
- レベル4（計画高水位超過）
- レベル4（氾濫危険水位超過）
- レベル3（避難判断水位超過）
- レベル2（氾濫注意水位超過）
- 防災操作実施ダム


平成29年7月22日出水における雄物川（おものがわ）流域の状況










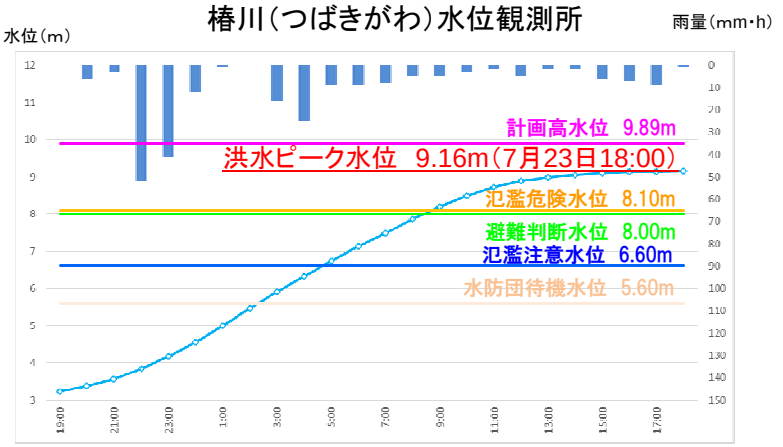

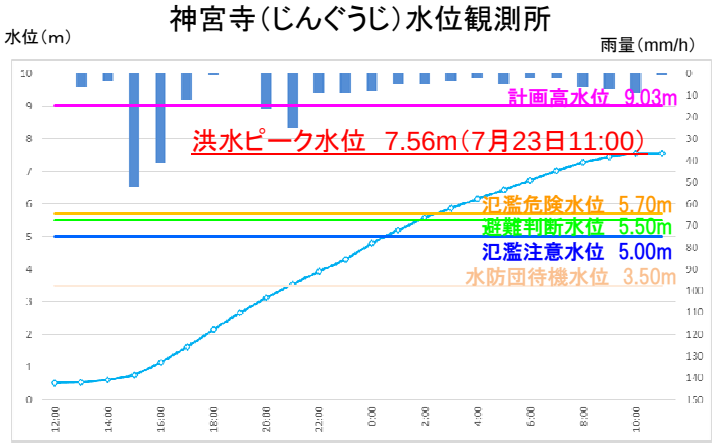

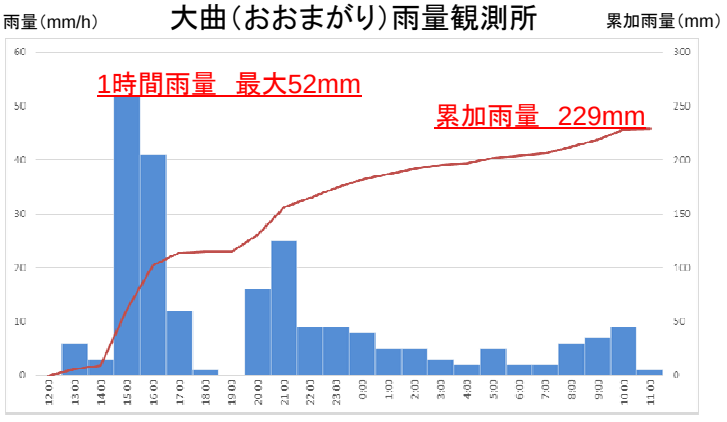

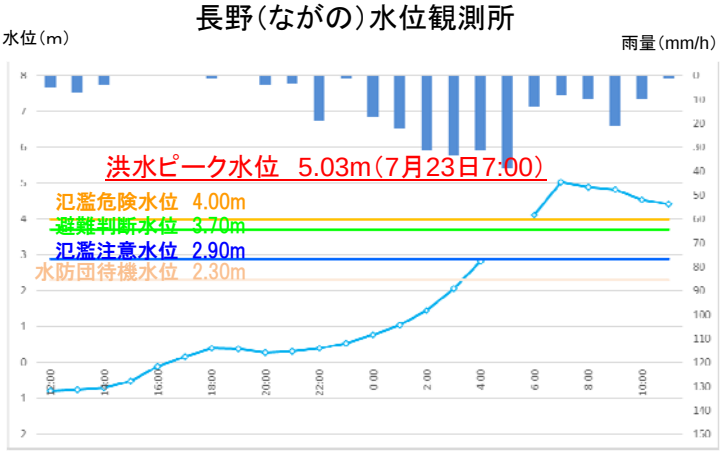

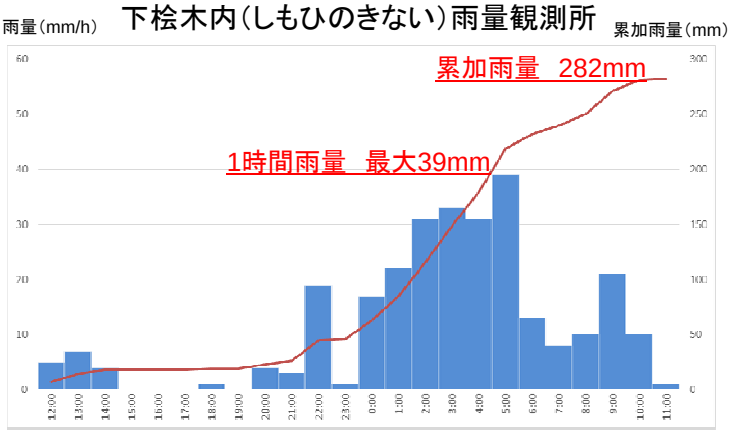


平成29年7月22日出水における子吉川流域の状況









明法（みょうほう）水位観測所

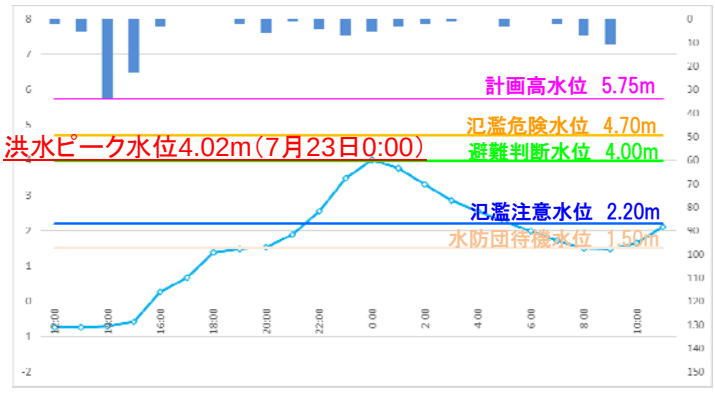


矢島（やしま）雨量観測所

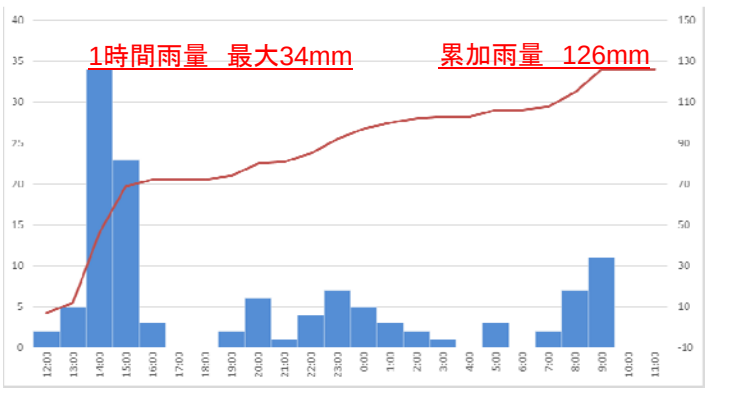

鮎瀬（あゆせ）水位観測所

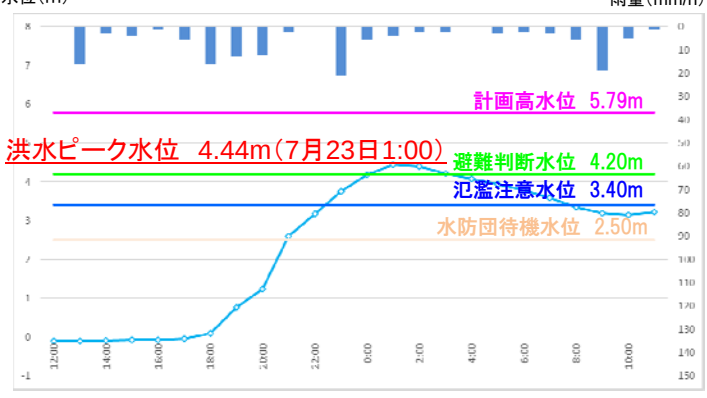

東由利（ひがしゆり）雨量観測所

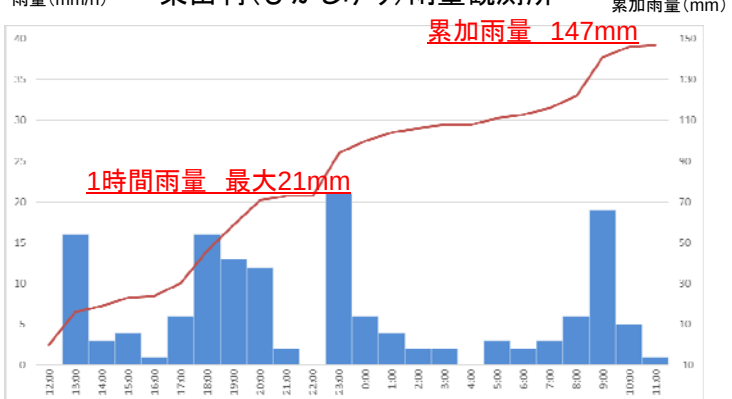

洪水に備えた事前対応（1）　雄物川

○堤防の無い間倉（まぐら）地区（右岸60.2k）において、7月22日21時に大型土嚢の設置を完了。

設置状況





全区間設置完了



平成29年7月22日（梅雨前線）における対応状況（1）雄物川

・7月22日16時頃の強い雨より、雄物川（おものがわ） 河口から65.2kの左岸堤防に法崩れが発生。
　河川の水位が上昇していたこともあり、直ちに復旧作業に着手し、7月23日　6時50分に完了した。


被災位置



被災状況




被災状況　横断図

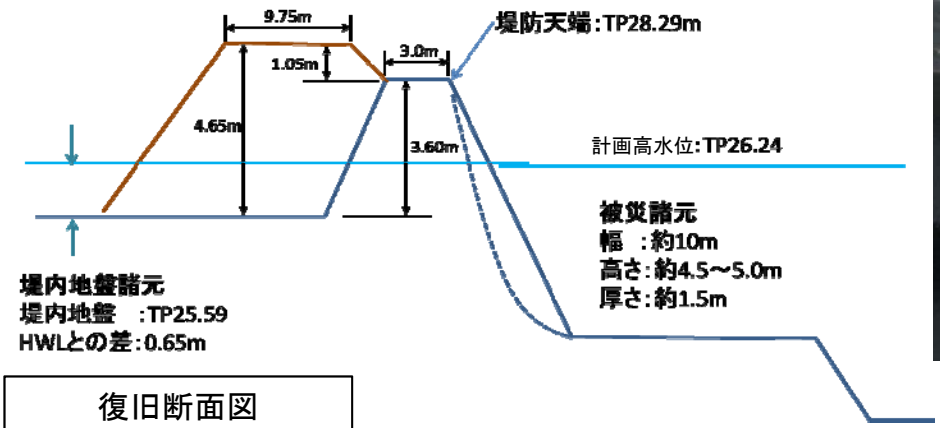

施工状況



復旧断面図

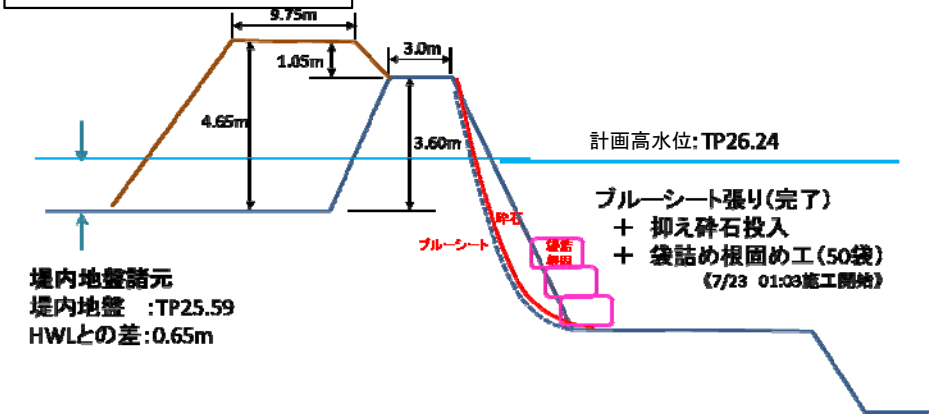

23日6:50　復旧完了



平成29年7月22日（梅雨前線）における対応状況（2）

自治体からの要請に応じ、排水ポンプ車を派遣し、内水排除を実施中。

災害対策機械（排水ポンプ車等）の支援

雄物川流域図



【大仙市大曲浜町地区】







○大仙市
　排水ポンプ車　30m3/min　×３台
　照明車１台
○由利本荘市
　排水ポンプ車　30m3/min　×１台
○秋田市
　排水ポンプ車　30m3/min　×１台
　照明車１台

平成29年7月22日（梅雨前線）における対応状況（3）

リエゾン（災害対策現地情報連絡員）の派遣

東北地方整備局では、自治体への支援・情報収集のため、1県3市へ8名のリエゾンを派遣。

【派遣状況（延べ人数）】（平成29年7月23日　16時　時点）

- 秋田県庁　2名
- 横手市　2名
- 大仙市　2名
- 由利本荘市　2名





整備局の体制（平成29年7月23日16時時点）

【本局】

本支部名	現状	状態	注意体制	警戒体制	非常体制
本部・河川	非常体制	開始	22日16:30	22日17:30	23日2:20
		解除			

【河川・ダム】

本支部名	現状	状態	注意体制	警戒体制	非常体制
青森河川国道支部・河川	注意体制	開始	23日14:30		
		解除			
高瀬川河川支部		開始			
		解除			
岩手河川国道支部・河川	警戒体制	開始	23日5:10	23日8:10	
		解除			
仙台河川国道支部・河川		開始			
		解除			
北上川下流河川支部		開始			
		解除			
秋田河川国道支部・河川	非常体制	開始	22日18:20	22日21:05	23日09:00
		解除			
湯沢河川国道支部・河川	非常体制	開始	22日16:30	22日17:30	23日02:20
		解除			
能代河川国道支部・河川	警戒体制	開始	22日12:30	22日13:00	
		解除			
山形河川国道支部・河川		開始			
		解除			
新庄河川支部	注意体制	開始	23日11:50		
		解除			
酒田河川国道支部・河川		開始			
		解除			
福島河川国道支部・河川		開始			
		解除			
		開始			
		解除			
成瀬ダム工事支部	警戒体制	開始	23日7:00	23日10:00	
		解除			
鳥海ダム工事支部	警戒体制	開始		23日7:00	
		解除			
鳴瀬川総合開発調査支部		開始			
		解除			
岩木川ダム統合管理支部	注意体制	開始	22日9:50	22日10:20	
		解除		23日15:00	
北上川ダム統合管理支部	警戒体制	開始	22日15:00	22日19:50	
		解除			
鳴子ダム管理支部		開始			
		解除			
釜房ダム管理支部		開始			
		解除			
七ヶ宿ダム管理支部		開始			
		解除			
玉川ダム管理支部	警戒体制	開始	22日17:00	23日1:50	
		解除			
最上川ダム統合管理支部		開始			
		解除			
月山ダム管理支部		開始			
		解除			
三春ダム管理支部		開始			
		解除			
摺上川ダム管理支部		開始			
		解除			
東北技術支部		開始			
		解除			

東北地方整備局における
23日の対応状況

▼ 災害対策室　本部会議（23日17:00）



▼ 対応状況



